Proposta Comercial para prestação
de serviços de Consultoria em

Melhoria Contínua dos Serviços de TI à



São Paulo, 04 de junho de 2015.

À

Natura Cosméticos S/A.

R. Werner Von Siemens, 111 – 8º andar
São Paulo – SP
05069-010

Srs. **Henrique Gherardi;**
Marcus Marques e;
Eduardo Tanese Mascára.

A CHACON | Consultoria Ilimitada tem o prazer de apresentar à **Natura** proposta para prestação de serviços de consultoria para **Melhoria Contínua dos Serviços de TI**.

Especializada em melhoria contínua de processos de negócios e de tecnologia da informação, a **CHACON | Consultoria Ilimitada** aplica sua robusta experiência em Gerenciamento de Serviços e Governança de TI em benefício do negócio de seus clientes, garantindo resultados rápidos, evidentes e sustentáveis.

Utilizando técnicas de *mentoring* e *coaching*, executando projetos e operações, realizando avaliações precisas ou oferecendo a melhor capacitação para seus profissionais, estamos aptos e disponíveis a contribuir para estabelecer ou melhorar suas práticas de gestão da qualidade de infraestrutura, sistemas e serviços de TI, garantindo a conformidade com os processos que suportam os negócios de sua organização e de seus clientes.

Certos de que poderemos oferecer serviços diferenciados, a custos justificáveis, agradecemos a oportunidade de contribuir com as soluções inovadoras da **Natura.**

1. Cenário

Recentemente reestruturada, a área de Tecnologia Digital da Natura busca desenvolver e manter novas práticas de atuação baseadas em processos, que proporcionem uma evolução permanente dos resultados de Governança e Gestão de Serviços de TI e sucessivas melhorias de eficiência e eficácia de seus profissionais, de modo a aumentar de forma gradual e sustentável a contribuição da Tecnologia Digital para a consecução dos objetivos da estratégia de negócios da Natura.

A abordagem da TD busca, portanto, uma transformação. Mas, ciente dos desafios a que se propõe e da necessidade de preservar os investimentos realizados, o conhecimento proprietário e os ativos de TI da organização, não pretende uma ruptura, mas antes uma evolução de suas boas práticas, com ganhos substanciais de sinergia entre suas áreas de competência e as de seus parceiros. Evolução – e não revolução – é a tônica da transformação pretendida.

2. Demanda

A Natura solicita que a CHACON | Consultoria Ilimitada forneça o suporte consultivo apropriado para esta transformação, orientando, executando e consolidando atividades para:

- Avaliar a qualidade e a conformidade dos processos de gerenciamento de serviços de TI da TD, abrangendo toda a dinâmica do **framework *Metrô***, tanto para o Brasil quanto para as Operações Internacionais;
- Identificar os GAP de conformidade, eventuais limitações dos processos e de suas ferramentas de automação, priorizando todas as oportunidades de melhorias;
- Elaborar e executar Planos de Ação para suprimir os GAP e consolidar as melhorias, estabelecendo ciclos de melhoria orientados aos processos;
- Identificar, analisar, compreender e eliminar atitudes e comportamentos não condizentes com os objetivos de gerenciamento da TD;
- Implantar e executar práticas e controles para engajamento e responsabilização dos profissionais, estimulando a adesão às práticas de gerenciamento, a conformidade inegociável para com os processos definidos e o comprometimento com a qualidade dos serviços da TD;
- Monitorar, medir e divulgar resultados.

A demanda é orientada aos processos de gestão e seus resultados, não devendo ser limitada a um ou mais serviços de TI, mas sim à melhoria efetiva dos controles sobre a qualidade e a conformidade, para a produção de indicadores que favoreçam uma rápida, precisa e eficaz tomada de decisão.

3. Abordagem

A CHACON | Consultoria Ilimitada entende que a TD não espera receber índices de maturidade e/ou análises comparativas, mas sim ações que efetivamente "coloquem o PDCA dos processos para girar". A demanda é, portanto, pela execução de práticas pragmáticas de gestão que – baseadas em análise e diagnóstico da efetividade dos processos do framework Metrô – contribuam decisivamente para a consolidação e evolução do framework de gerenciamento.

Assim, devemos atuar como um agente isento e crítico, que identifique, evidencie e atue com autoridade sobre processos, comportamentos e atitudes – inclusive dos fornecedores e parceiros – proporcionando a transformação da mentalidade e atitude dos agentes envolvidos com as práticas de gestão.

Comprometemo-nos ainda – durante todo o projeto – a realizar a adequada transferência de conhecimento, que garanta não apenas os resultados objetivo deste trabalho, mas especialmente a viabilização da execução de futuros ciclos de melhoria independente de suporte consultivo.

As recomendações das melhores práticas do COBIT 5 e do ITIL V3 2011 devem ser utilizadas apenas como referência para a análise dos processos e, quando pertinente, para a fundamentação de nossas recomendações.

Nossa abordagem visa, portanto, **auxiliar a TD da Natura a consolidar seu framework de gerenciamento orientado à melhoria contínua, de modo que as práticas sejam incorporadas pelos profissionais e que a melhoria contínua se torne uma prática habitual, com evidente melhoria da qualidade dos serviços e soluções fornecidos ao Negócio.**

4. Solução

A CHACON | Consultoria Ilimitada propõe à Natura a alocação de profissionais experientes e certificados para a execução das seguintes atividades:

<u>1ª Fase – Análise e Planejamento da Melhoria</u>:

4.1. Definir o planejamento detalhado do trabalho em conjunto com representantes da Natura e estabelecer a hierarquia do projeto na estrutura organizacional de Tecnologia Digital, atribuindo-lhe a autoridade compatível com sua responsabilidade.

4.2. Realizar entrevistas, observações das dinâmicas e análise de evidências dos resultados dos processos, das características das ferramentas de automação dos processos e de capacidades e limitações operacionais ou comportamentais das equipes de TD.

4.3. Analisar as estruturas organizacionais da TD, sob a perspectiva de adequação aos processos, recomendando ajustes na organização dos papéis

e responsabilidades. Quando inviável a readequação da estrutura, ajustar os processos, para adequação às capacidades operacionais.

4.4. Especificamente para o fluxo de processos do framework Metrô, a CHACON | Consultoria Ilimitada aplicará técnicas de análise baseadas em LEAN IT, identificando e classificando as etapas que geram valor aos negócios, aquelas que mesmo não gerando valor são consideradas mandatórias para satisfação de requisitos legais ou regulatórios e, especialmente aquelas que podem ser eliminadas por não proporcionarem qualquer benefício.

4.5. Identificar os riscos – vulnerabilidades e possíveis ameaças – relacionados à execução dos processos pelas equipes de TD, classificando-os em uma SWOT Analysis, que possa ser utilizada como instrumento de referência para a melhoria.

4.6. Definir um Plano de Ação para supressão dos GAP e vulnerabilidades identificados, estabelecendo prioridades e prazos de acordo com o impacto para a qualidade dos serviços de TI. São exemplos de prioridades:

- Imediata (*must*): em até 03 meses;
- Alta (*should*): de 03 a 06 meses;
- Média (*could*): de 06 a 12 meses;
- Baixa (*would*): *TBD*.

4.7. Constituir um Calendário de Eventos, organizando as ações planejadas no tempo, determinando os agentes responsáveis por sua execução e estabelecendo indicadores para controles do status e das responsabilidades relacionadas à execução das atividades.

4.8. Avaliar os processos de Projetos e Mudanças, definindo e orientando ajustes que viabilizem identificar e controlar quaisquer eventos que possam causar impactos na realização do Plano de Ação e/ou constituir novos GAP aos processos.

4.9. Realizar workshops com profissionais designados pela TD, orientando a definição de um processo permanente de Gestão da Melhoria Contínua e manutenção do Calendário de Eventos, com foco na conformidade com os processos de gerenciamento do *framework Metrô*.

4.10. Orientar a execução do Plano de Ação, capacitando os agentes da Natura para a execução de todas as atividades documentadas e aceitas pelo *sponsor* do projeto.

4.11. Identificar e implantar ações de melhoria imediatas durante a avaliação.

<u>2ª Fase – Execução dos Ciclos de Melhoria Contínua</u>:

4.12. Documentar o processo definido e coordenar a execução dos ciclos mensais de melhoria contínua, com indicadores de evolução.

4.13. Consolidar o processo de Gestão da Melhoria Continua.

Importante: Comunicação é parte integrante deste projeto e deverá ser realizada durante toda a sua execução, com apoio da equipe de Comunicação Corporativa.

5. Relação de Entregáveis

Este trabalho produzirá os seguintes entregáveis:

1ª Fase – Análise e Planejamento da Melhoria:

5.1. Plano detalhado do Projeto, contendo cronograma, *milestones* e pontos de controle;
5.2. Apresentação dos resultados das entrevistas, da observação das dinâmicas e da análise de evidências, com conclusões e definição de objetivos;
5.3. Recomendação justificada para ajustes necessários nas estruturas organizacionais;
5.4. Matriz de classificação LEAN IT, identificando oportunidades para simplificação dos processos e ganhos de eficiência;
5.5. Análise SWOT, consolidando a avaliação de riscos e vulnerabilidades dos processos;
5.6. Plano de Ação priorizado para supressão de GAP, ajustes em papéis e responsabilidades e alterações nos processos e ferramentas de suporte;
5.7. Calendário de Eventos para controle da execução do Plano de Ação;
5.8. Apresentação da análise e das recomendações para ajustes nos processos de Projetos e Mudanças, para garantia da manutenção da conformidade e da evolução da qualidade;
5.9. Workshops do processo de Melhoria Contínua;
5.10. Ações permanentes de comunicação, engajamento e motivação;
5.11. **Melhorias imediatas**, durante a fase de Análise e Planejamento da Melhoria.

2ª Fase – Execução dos Ciclos de Melhoria Contínua:

5.12. Ciclos de Melhoria Contínua, consolidados por indicadores.

***Importante*:** o escopo e os entregáveis propostos para a 1ª Fase compreendem melhorias imediatas na dinâmica e resultados dos processos. Entretanto, as atividades e entregáveis especificados poderão ser alterados, desde que em comum acordo entre a Natura e a CHACON | Consultoria Ilimitada e respeitados os limites de prazos e esforços contratados.

Assim, compreendendo que este projeto visa especialmente melhorar e resolver questões latentes da gestão de serviços da TD da Natura, seremos suficientemente flexíveis para atender com a melhor prontidão e qualidade às prioridades determinadas pela Natura, sem prejuízo de nosso método e dinâmica e de nossa inegociável responsabilidade para com o objetivo maior desta proposta de solução, descrito ao final de nossa Abordagem (item 3).

6. Premissas

A Natura trabalha com a expectativa da obtenção de resultados rápidos. Considerando este requerimento, apresentamos algumas premissas para a realização do serviço:

6.1. A Natura deve designar um Gerente de Projetos dedicado ao projeto.
6.2. A agenda de entrevistas e reuniões deverá ser cumprida com o adequado rigor. Não havendo quórum, prevalecerá nossa recomendação.
6.3. Os consultores devem possuir acesso ilimitado às informações, resguardando-se todos os requisitos de confidencialidade e NDA.
6.4. Os profissionais designados pelo cliente deverão participar ativamente do projeto, assumindo responsabilidades pela execução de atividades específicas, sempre sob coordenação e orientação de nossos consultores.
6.5. Eventuais ajustes nas ferramentas de automação de processos (CA Service Desk Manager) serão efetuados pelas equipes da Natura ou de seus fornecedores, sempre sob orientação de nossos consultores.


7. Prazos Estimados

Um cronograma detalhado será elaborado oportunamente. As atividades podem ser agrupadas em fases e dinâmicas distintas, com os respectivos esforços estimados em semanas:

Atividades	Semanas
1ª Fase – Análise e Planejamento da Melhoria	
Planejamento detalhado do projeto	01
Elaboração das agendas de entrevistas e observações	
Entrevistas, observação das dinâmicas e análise de evidências	05
Análise LEAN IT	
Avaliação dos Processos e Análise SWOT	
Plano de Ação e Calendário de Eventos	03
Análise dos Processos de Mudanças e Projetos	
Workshop e Fluxograma do Processo de Melhoria Contínua	01
Melhoria imediatas, viáveis durante esta fase.	-
Prazo Total Estimado	10 (2,5 meses)
2ª Fase – Execução dos Ciclos de Melhoria	
Ciclos de Melhoria Contínua	TBD

8. Equipe

Para a realização do Projeto no prazo estimado, a equipe será composta pelos seguintes profissionais, com as respectivas qualificações e responsabilidades:

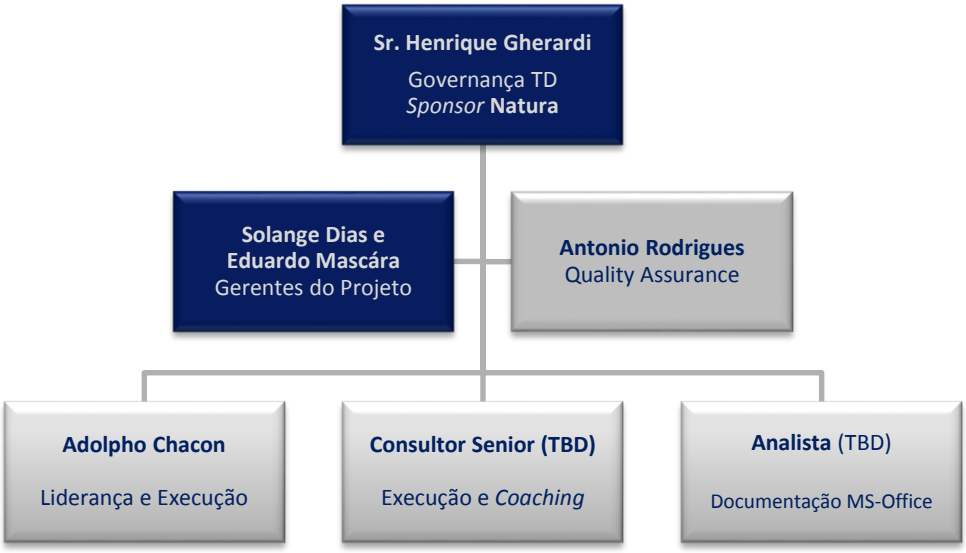

9. Logística

Os serviços serão realizados em quaisquer dependências da Natura na região metropolitana de São Paulo, nos horários habituais de trabalho dos profissionais da Natura.

Despesas eventualmente necessárias serão reembolsadas pela Natura mediante apresentação de Nota de Débito acompanhada dos respectivos comprovantes.

10. Benefícios

Alguns benefícios da solução para a Natura:

- Experiência consolidada da CHACON | Consultoria Ilimitada na avaliação, diagnóstico, definição e implantação bem-sucedida de melhorias em processos de governança e gestão de TI.
- Simplicidade nas soluções, com garantia de resultados sustentáveis.
- Qualidade sempre evidenciada por indicadores.
- Conhecimento sobre as dinâmicas das principais ferramentas de gestão de TI do mercado – Remedy ITSM; CA Service Desk; SeviceNow; Microsoft System Center; HP Service Manager; Automatos e outras – facilitando a avaliação da automação das dinâmicas dos processos.
- Coaching e transferência do conhecimento aos profissionais da Natura.
- Flexibilidade de escopo, para atender com exatidão às prioridades da Natura.

11. Condições Comerciais

Nossa oferta para a prestação dos serviços objeto desta proposta visa estabelecer um relacionamento de longo prazo com a Natura. Destarte, apresentamos condições comerciais diferenciadas, no intuito de atender rápida e completamente às expectativas que motivaram o trabalho, proporcionando à Natura uma experiência diferenciada em relacionamento consultivo e a nós a oportunidade de contribuir no futuro com a realização dos Ciclos de Melhoria Contínua resultantes da transformação que nos comprometemos a iniciar.

Apresentamos nossa proposta de investimento ajustada, para a 1ª Fase.

Serviço Consultivo	Investimento Total
1ª Fase – Análise e Planejamento da Melhoria	R$ 137.312,00

Condições para Faturamento:

1ª Fase – Parcelamento e Vencimentos	%	Valor
Setup – Simultâneo à Formalização do Contrato	15%	R$ 20.596,80
Intermediária – 30 dias corridos	35%	R$ 48.059,20
Intermediária – 60 dias corridos	35%	R$ 48.059,20
Final – Após a formalização do Aceite dos serviços	15%	R$ 20.596,80

Cientes de que a melhor compreensão do valor de um serviço requer uma análise de sua composição, apresentamos o quadro analítico detalhado:

Elemento	Totais
Investimento	R$ 137.312,00
Quantidade de profissionais alocados	04
Prazo de duração do projeto, em meses	2,5
Total em horas de consultoria	1.240 *
Taxa média por hora de consultoria	R$ 95,74

Os valores ajustados resultam em um desconto total equivalente a 19% sobre o investimento originalmente proposto. Este desconto foi assim composto:

- Concessão de 10% de desconto sobre o investimento total da proposta original;
- Assunção pela CHACON | Consultoria Ilimitada dos custos do Analista de Apoio, que correrão integralmente por nossa conta, à título de investimento em capacitação de nossa equipe consultiva.
- * Redução da jornada do Analista de Apoio para 4 dias por semana, ocasionando uma redução total de 88 horas em sua alocação.

Tributação, Taxas e Despesas:

- A CHACON | Consultoria Ilimitada é optante pelo Simples Nacional.
- Todos os impostos, taxas e despesas operacionais para realização do trabalho nas dependências da Natura estão inclusos no valor total desta proposta.

12. Clientes Satisfeitos

Nosso principal indicador de qualidade é a "recompra", isto á, a fidelidade de clientes satisfeitos com nosso compromisso com resultados efetivos e sustentáveis. A seguir apresentamos alguns clientes atendidos pelo nosso principal consultor, Adolpho Chacon:

- Accenture
- Hospital Cruz Azul
- Polícia Militar – SP
- Dataprev
- BNB
- BANESE
- Tribunal de Justiça – SE
- Embrapa
- Editora Abril
- Nestlé
- Sefaz – SP
- IG
- OAS Construtora
- Globo.com
- Vivo
- TIVIT
- Banco Itaú
- Rede
- TecBan
- Sicredi
- Sonae (Portugal)
- Sanofi-Aventis
- Caterpillar
- Walmart.com
- Viavarejo (GPA)
- Multivarejo (GPA)
- EMC² Consulting
- Hospital Albert Einstein
- Colégio Porto Seguro
- Rio Quente Resorts
- Gafisa
- Interaxa

- Cielo
- NET


13. Considerações Finais

A CHACON | Consultoria Ilimitada reitera seu agradecimento pela oportunidade e se coloca à inteira disposição para deliberar sobre quaisquer aspectos desta proposta, sempre no intuito de oferecer à **Natura** serviços de consultoria que proporcionem efetivo valor para seus objetivos de negócio.

Com a certeza de oferecer à Natura condições inigualáveis de investimento, a garantia da melhor qualidade dos serviços e a flexibilidade de escopo requerida pelo momento, aguardamos suas considerações e a determinação da data para início dos trabalhos.

Certos de sua habitual atenção.

Cordialmente,



Adolpho Chacon

CHACON | Consultoria Ilimitada
