#atendimentoTD

natura
bem estar bem

Gestão de Mudanças

Treinamento no processo de
Gestão de Mudanças Natura

Agenda

- Missão da GMUD
- Objetivos da GMUD
- Benefícios
- Papéis e Responsabilidades
- Auditorias GMUD
- Reunião de Mudanças
- Tipos de Mudanças
- Origens de Mudanças
- Parada Programada
- Sistema de Solicitação de Mudanças
- Dúvidas e Suporte

Missão da GMUD

"Assegurar que métodos e procedimentos padronizados sejam usados para um tratamento rápido e eficiente de todas as mudanças, de modo a minimizar o impacto de quaisquer incidentes relacionados a serviços"



Office of Government Commerce

Objetivos da GMUD

Implementar/modificar componentes de TI de forma lógica e ordenada

Garantir a documentação das mudanças feitas em produção

Assegurar cumprimento dos prazos e escopos

Minimizar interrupções

Contribuir para redução dos custos de TI

Prover notificação e visibilidade das mudanças

Evitar mudanças não autorizadas

Benefícios

- Acompanhamento e monitoramento mais eficaz
- Melhoria na qualidade e custo dos serviços
- Redução de custo com manutenções corretivas
- Redução de impacto ao negócio
- Menor impacto nos SLAs

Papéis e responsabilidades

Solicitante



Responsabilidades

- Preencher corretamente o formulário de mudanças.
- Negociar Indisponibilidade
- Fazer o Plano de Execução
- Garantir que a mudança seja aprovada
- Acompanhar a execução da mudança
- Garantir que a mudança no sistema seja atualizada
- Comparecer às reuniões GMUD quando necessário

Papéis e responsabilidades

Aprovador



Responsabilidades

- Validar se toda informação referente à mudança está clara e objetiva
- Assegurar que o solicitante esteja seguindo os procedimentos adequados
- Avaliar os impactos e riscos
- Aprovar/ reprovar as solicitações dentro do prazo definido pelo processo

Papéis e responsabilidades

Executor



Responsabilidades

- Implementar a mudança de acordo com o plano
- Registrar no sistema o início da execução
- Comunicar o gestor de mudanças em caso de problemas críticos na execução
- Em caso de mais de uma equipe no plano de execução, informar a próxima equipe quando concluir sua parte
- Finalizar a mudança no sistema logo após a execução

Papéis e responsabilidades

Comitê GMUD



Responsabilidades

- Avaliar impacto das mudanças e priorizá-las quando necessário
- Auxiliar na programação das mudanças
- Assessorar a equipe de mudanças
- Sugerir e avaliar melhorias no processo

Auditorias - GMUD

Auditoria SOX

- CTTI 04 – Especificação de Sistemas
- CTTI 05 – Plano de Testes
- CTTI 06 – Change Management
- CTTI 07 - Fallback
- CTTI 09 – Avaliação Impacto das Mudanças
- CTTI 10 – Categorização das Solicitações de Mudança
- CTTI 11 – Revisão Pós Implementação

- Segue Calendário da Natura de Auditorias Internas e Externas , realizado pelas Consultorias contratadas

Auditorias - GMUD

Auditoria GMUD – Recomendação SOx

- Avaliação de amostragem (20% das SMs dos sistemas significativos para a SOx e 30% das SMs de transporte de Request) referentes aos principais pontos de controle da SOx

- Realizada mensalmente pela equipe GMUD e documentada, atendendo a recomendação indicada no processo de certificação SOx

Auditorias - GMUD

Auditoria de Processos da Natura

- Para manutenção do Certificado de Gestão por Processos, realizada conforme calendário definido pela companhia.

- Avalia a aderência do processo a sua governança e procedimentos documentados e a sua relação com os demais processos da organização.

Auditorias - GMUD

Pré-validação das SMs – Aprovador QA GMUD

- Avalia processualmente (aderência ao processo) o preenchimento do formulário da mudança, para verificar se os campos foram preenchidos com o tipo de dado necessário e se os artefatos obrigatórios (Ou justificativa da ausência) estão contidos na SM.

- Avaliação feita por demanda. Todas as SMs que são submetidas para aprovação devem conter o aprovador QA GMUD.

- **Atenção:** A aprovação do grupo QA GMUD não isenta os demais aprovadores de avaliar todos os itens da SM. Itens como conteúdo dos artefatos/validade da justificativa, avaliação de plano de execução/executores, análise de impacto ao negócio, horário de execução, etc. não são de escopo do QA GMUD, e sim dos demais aprovadores.

Reunião de Mudanças

Objetivo

Avaliar as mudanças a serem executadas, rever o histórico de mudanças, comunicar, promover e avaliar melhorias no processo de Gestão de Mudanças.

Quem participa?

Gestor de mudanças, Gestores de Relacionamento (GRPs), representantes das áreas de TI (GTO), parceiros e fornecedores.


Quando ocorre?

Toda quinta-feira às 13h30, sendo que a pauta e a minuta da reunião são publicadas na página inicial do sistema de mudanças (gmud.natura.net) na área de “Documentos”.

A participação é por conferência (4446-4200 senha: 2344572#)

Reunião de Mudanças

Pauta da Reunião:



Minuta da Reunião:

- Publicada na área de documentos do sistema de mudanças após a reunião. No documento ficam registradas todas as mudanças aprovadas e as ações tomadas pelo comitê.

Tipo de mudanças


Padrão

Mudança pré-definida e pré-autorizada que segue um processo simplificado e com prazo reduzido.


É executada exclusivamente pela equipe de 1º nível (Produção) devido à baixa complexidade.

Prazo

Semana 1							Semana 2						
Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom

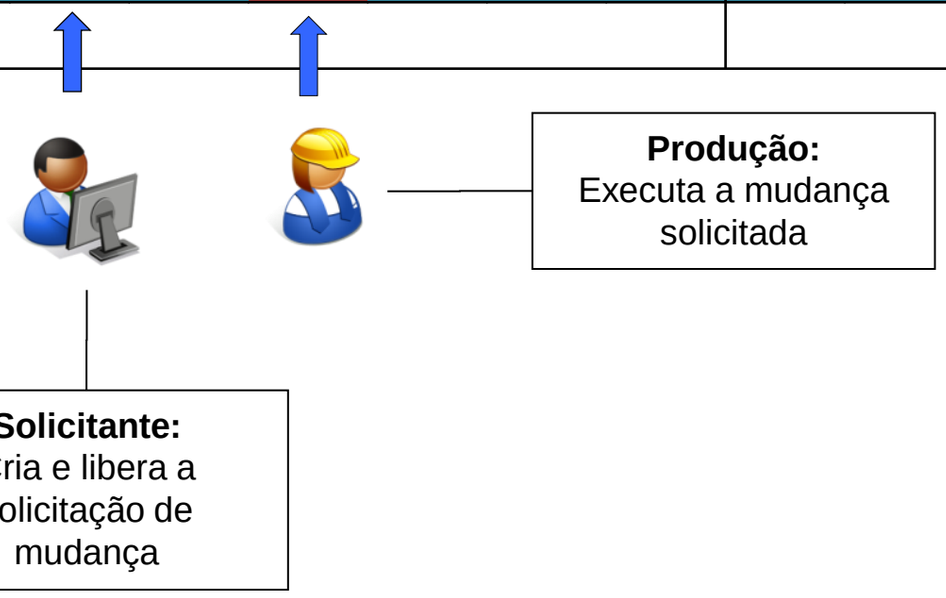

Fluxo de Aprovação




Tipo de mudanças

Normal


Qualquer mudança feita em um ou mais itens de configuração (IC) em ambiente de Produção.

Mudanças planejadas atendem correções de incidentes, manutenções preventivas ou periódicas, implementação de projetos, etc.

Prazo

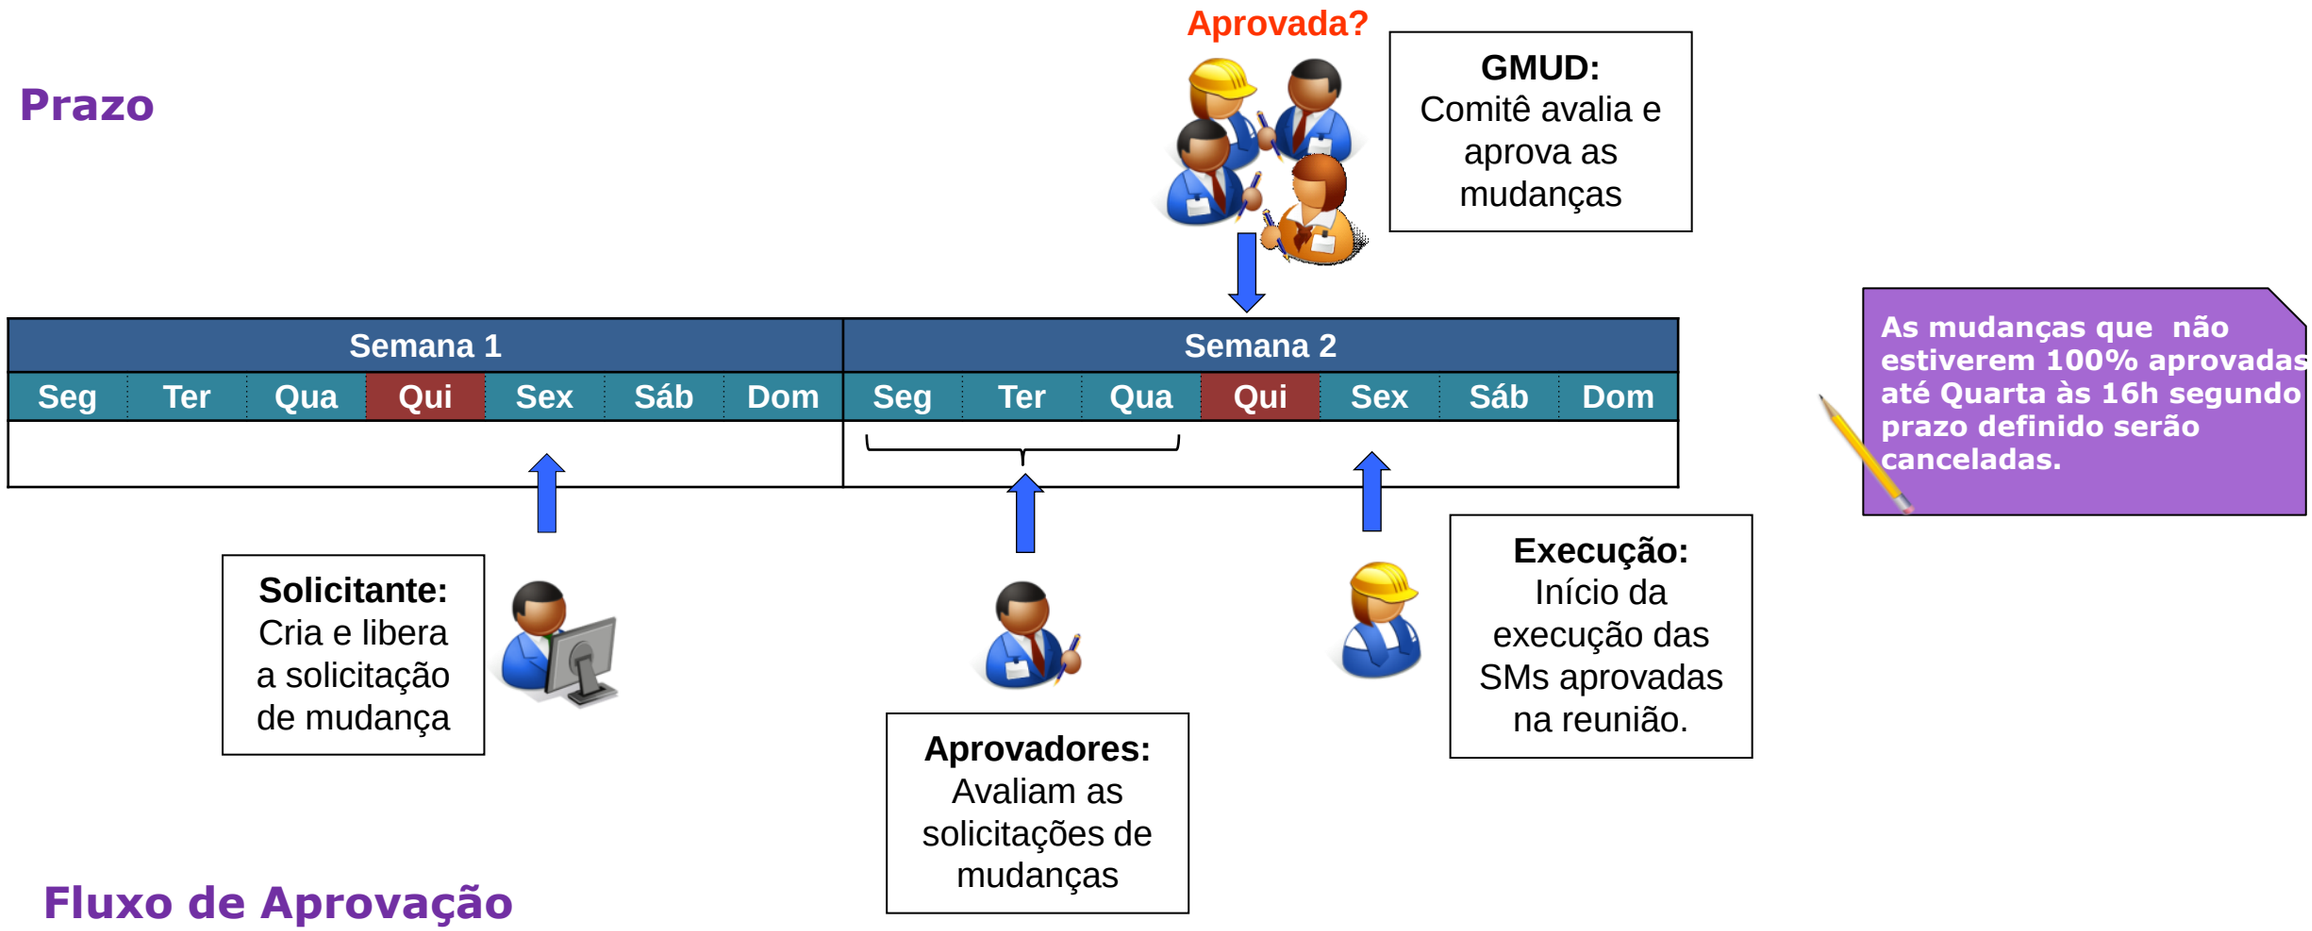

Fluxo de Aprovação



Tipo de mudanças

Janeiro 2015

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

natura
bem estar bem

Tipo de mudanças

Janeiro 2015						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Tipo de mudanças

Não Planejada

Mudanças que tenham como origem da solicitação projetos, solicitações de evolução, correção de problemas (Itens identificados pelo processo de gestão de problemas), chamados abertos na CATI que tenham sido categorizados como "Requisição de Serviços", entre outras demandas e que devido a uma eventualidade ou solicitação do negócio, não puderam ter seu planejamento previamente feito seguindo as premissas de uma SM Planejada.

Prazo




Solicitante: Cria e libera a solicitação de mudança

Aprovada



Comitê Diretoria TD: Comitê avalia e aprova as mudanças






Aprovadores: Avaliam as solicitações de mudanças



Execução: Início da execução das SMs aprovadas na reunião.

Para este tipo de mudança, o solicitante deve deixar bem claro o motivo da urgência no campo "Justificativa" do formulário da SM. Esta mudança deve estar 100% aprovada até às 15 horas do mesmo dia, do contrário serão reprovadas e adiadas para o dia seguinte.

Fluxo de Aprovação



Tipo de mudanças

Emergencial


Mudança para correção de um incidente ou um evento que indisponibilizou, ou está em iminência de indisponibilizar um sistema ou infraestrutura do ambiente produtivo (situação pró-ativa).

Não existe prazo para este tipo, a mudança depende somente de aprovação dos responsáveis para ser executada.



Para este tipo de mudança, o solicitante deve deixar bem claro o motivo da urgência no campo "Justificativa" do formulário da SM, onde deve também ser informado o número do incidente aberto

Fluxo de Aprovação



Tipo de mudanças

Informativa

A SM deve ser aberta como Informativa quando foi necessário acionar o comitê emergencial (Incidente Crítico em que não houve tempo hábil para abertura da SM), e foi aprovada a abertura da Informativa, ou em casos de mudanças que já foram executadas, mas não foram documentadas, abrindo uma informativa para registrar a mudança realizada.

•No título deve estar escrito “SM Informativa [Breve Descritivo da Mudança]”;

•No campo “Justificativa”, explicar o motivo do incidente, colocar quais pessoas aprovaram a abertura da SM como Informativa (Solicitante da demanda e aprovador);

•Colocar o número do chamado aberto para o incidente no campo Ticket externo.

•Preencher o plano de execução com as ações tomadas deixando o próprio solicitante da demanda como executor e o início e fim devem ser baseados na duração de cada atividade e informar o grupo correto de executor que fez a demanda;

•As pessoas que aprovaram a SM ser realizada como informativa devem constar também como aprovadores da SM. Todos os aprovadores devem realizar a aprovação na ferramenta.

•A SM deve ser colocada em execução e finalizada.

Origens da mudanças

A origem da solicitação indica o propósito pelo qual surgiu a necessidade de uma mudança.

Existem dez opções de origem:

- **Ajuste Diário Estoque**
- **Atualização de Conteúdo Hotsite**
- **Correção de inconsistências de Pedidos Capta x SAP**
- **Evolutiva**
- **Incidente**
- **Informativa**
- **Manutenção de Infraestrutura**
- **Problema**
- **Projetos**
- **Requisição de Serviços**

Origens da mudanças

	Planejada	Não Planejada	Emergencial	Rotineira
Ajuste Diário de Estoque				X
Atualização de Conteúdo Hotsite				X
Correção de inconsistências de Pedidos Capta x SAP				X
Incidente	X		X	
Informativa			X	
Manutenção de Infraestrutura	X			
Problema	X	X		
Projeto	X	X		
Requisição de Serviços	X	X		
Evolutiva	X	X		

Parada Programada


Duração

Um turno de fábrica iniciando Sábado às 22:40h e encerrando Domingo às 6:40h. Durante este período todos os sistemas de TI ficarão indisponíveis.

Escopo

A Parada Programada abrange os ambientes de TI processados no Brasil. Estão fora do escopo ambientes de TI processados fora do Brasil e sites (Internet) para o consumidor final.

Prazo

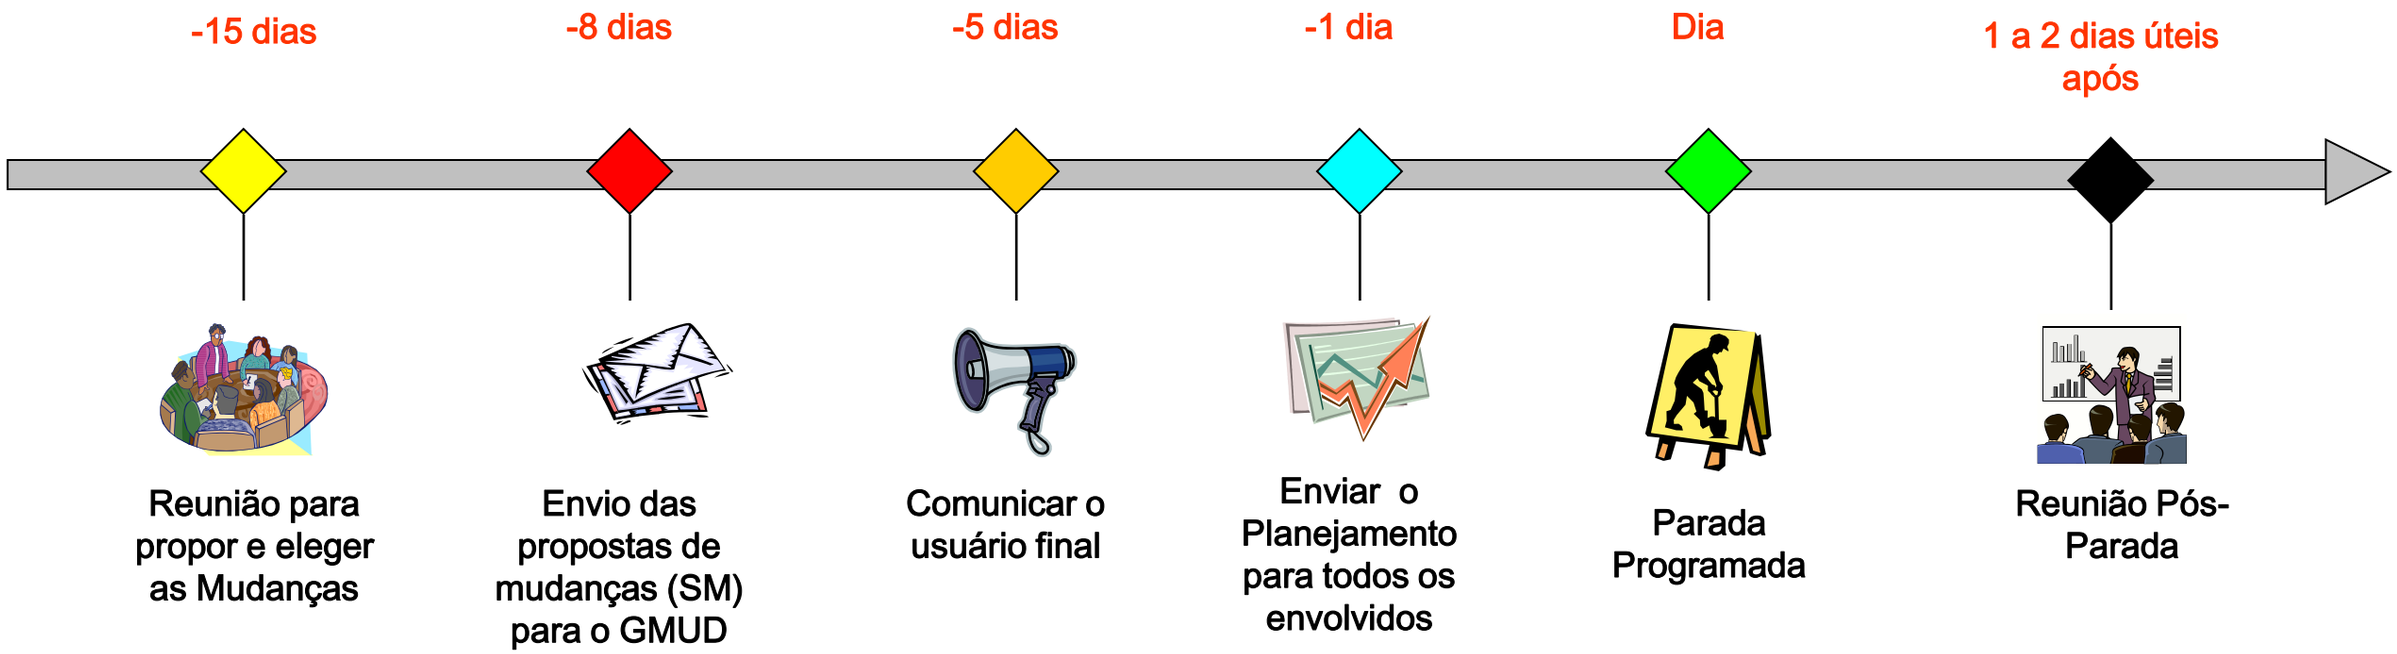

Calendário

Janeiro

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Fechamento 4º Trimestre e Anual

Fevereiro

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Março

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Abril

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Fechamento 1º Trimestre

Maio

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Junho

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Julho

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Fechamento 2º Trimestre

Agosto

D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Setembro

D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Outubro

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Fechamento 3º Trimestre

Novembro

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Dezembro

D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Período de Estratégia

Parada Programada

Fechamento Financeiro

Teste Backup Site

Feriado

Release de aplicações

FERIADOS

01/01 - Confraternização Universal
04/03 - Carnaval
18/04 - Paixão de Cristo
20/04 - Páscoa
21/04 - Tiradentes
01/05 - Dia do trabalho
12/06 - Jogo do Brasil
17/06 - Jogo do Brasil
19/06 - Corpus Christi
23/06 - Jogo do Brasil
07/09 - Independência do Brasil
12/10 - Nossa Senhora da Aparecid
02/11 - Finados
15/11 - Proclamação da República
25/12 - Natal

Notas importantes:

1. A Parada Programada inicia-se as 22:40h do Sábado, terminando as 06:40h do Domingo (Um turno de Fábrica)


2. As Paradas Programadas dos dias 15/02/2014 e 18/10/2014 são obrigatórias, tratam-se dos ajustes para o horário de verão e começam as 22:00h do Sábado e terminam as 06:00h do Domingo.


#atendimentoTD

natura
bem estar bem

MÓDULO
GESTÃO DE MUDANÇAS

#atendimentoTD

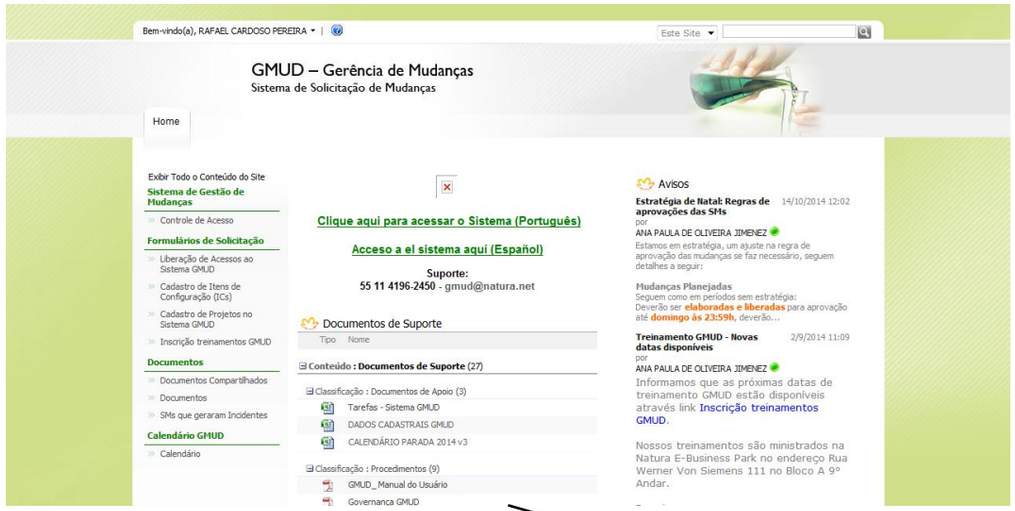

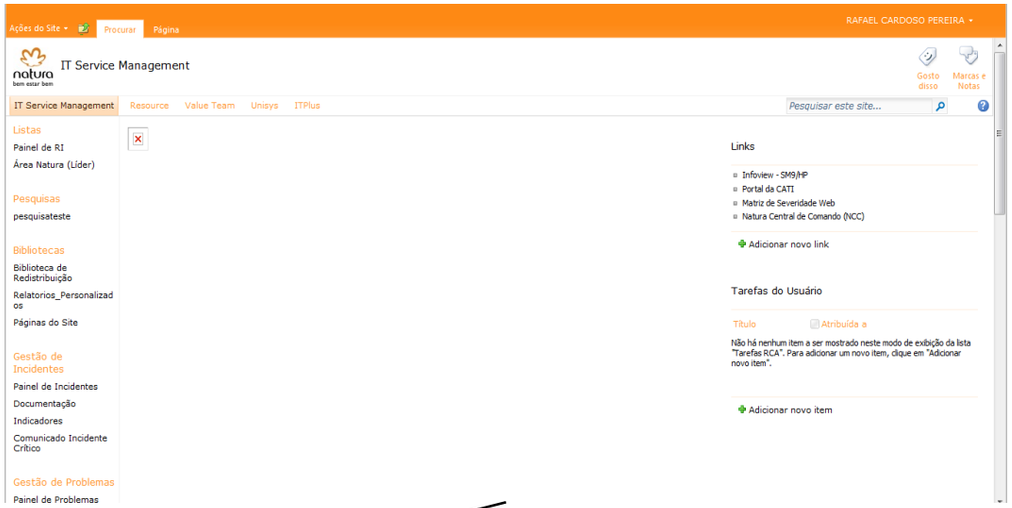




Abertura de mudanças




2. Clique em **"Arquivo"** escolha **"Nova mudança".**

1. Ao realizar o acesso, altere a sua função na aba localizada no canto superior direito ao lado de **"Efetuar Logoff"**, escolha a função de "**Analista Nível 2** e clique em **"Definir Função"**.

Preenchimento do formulário

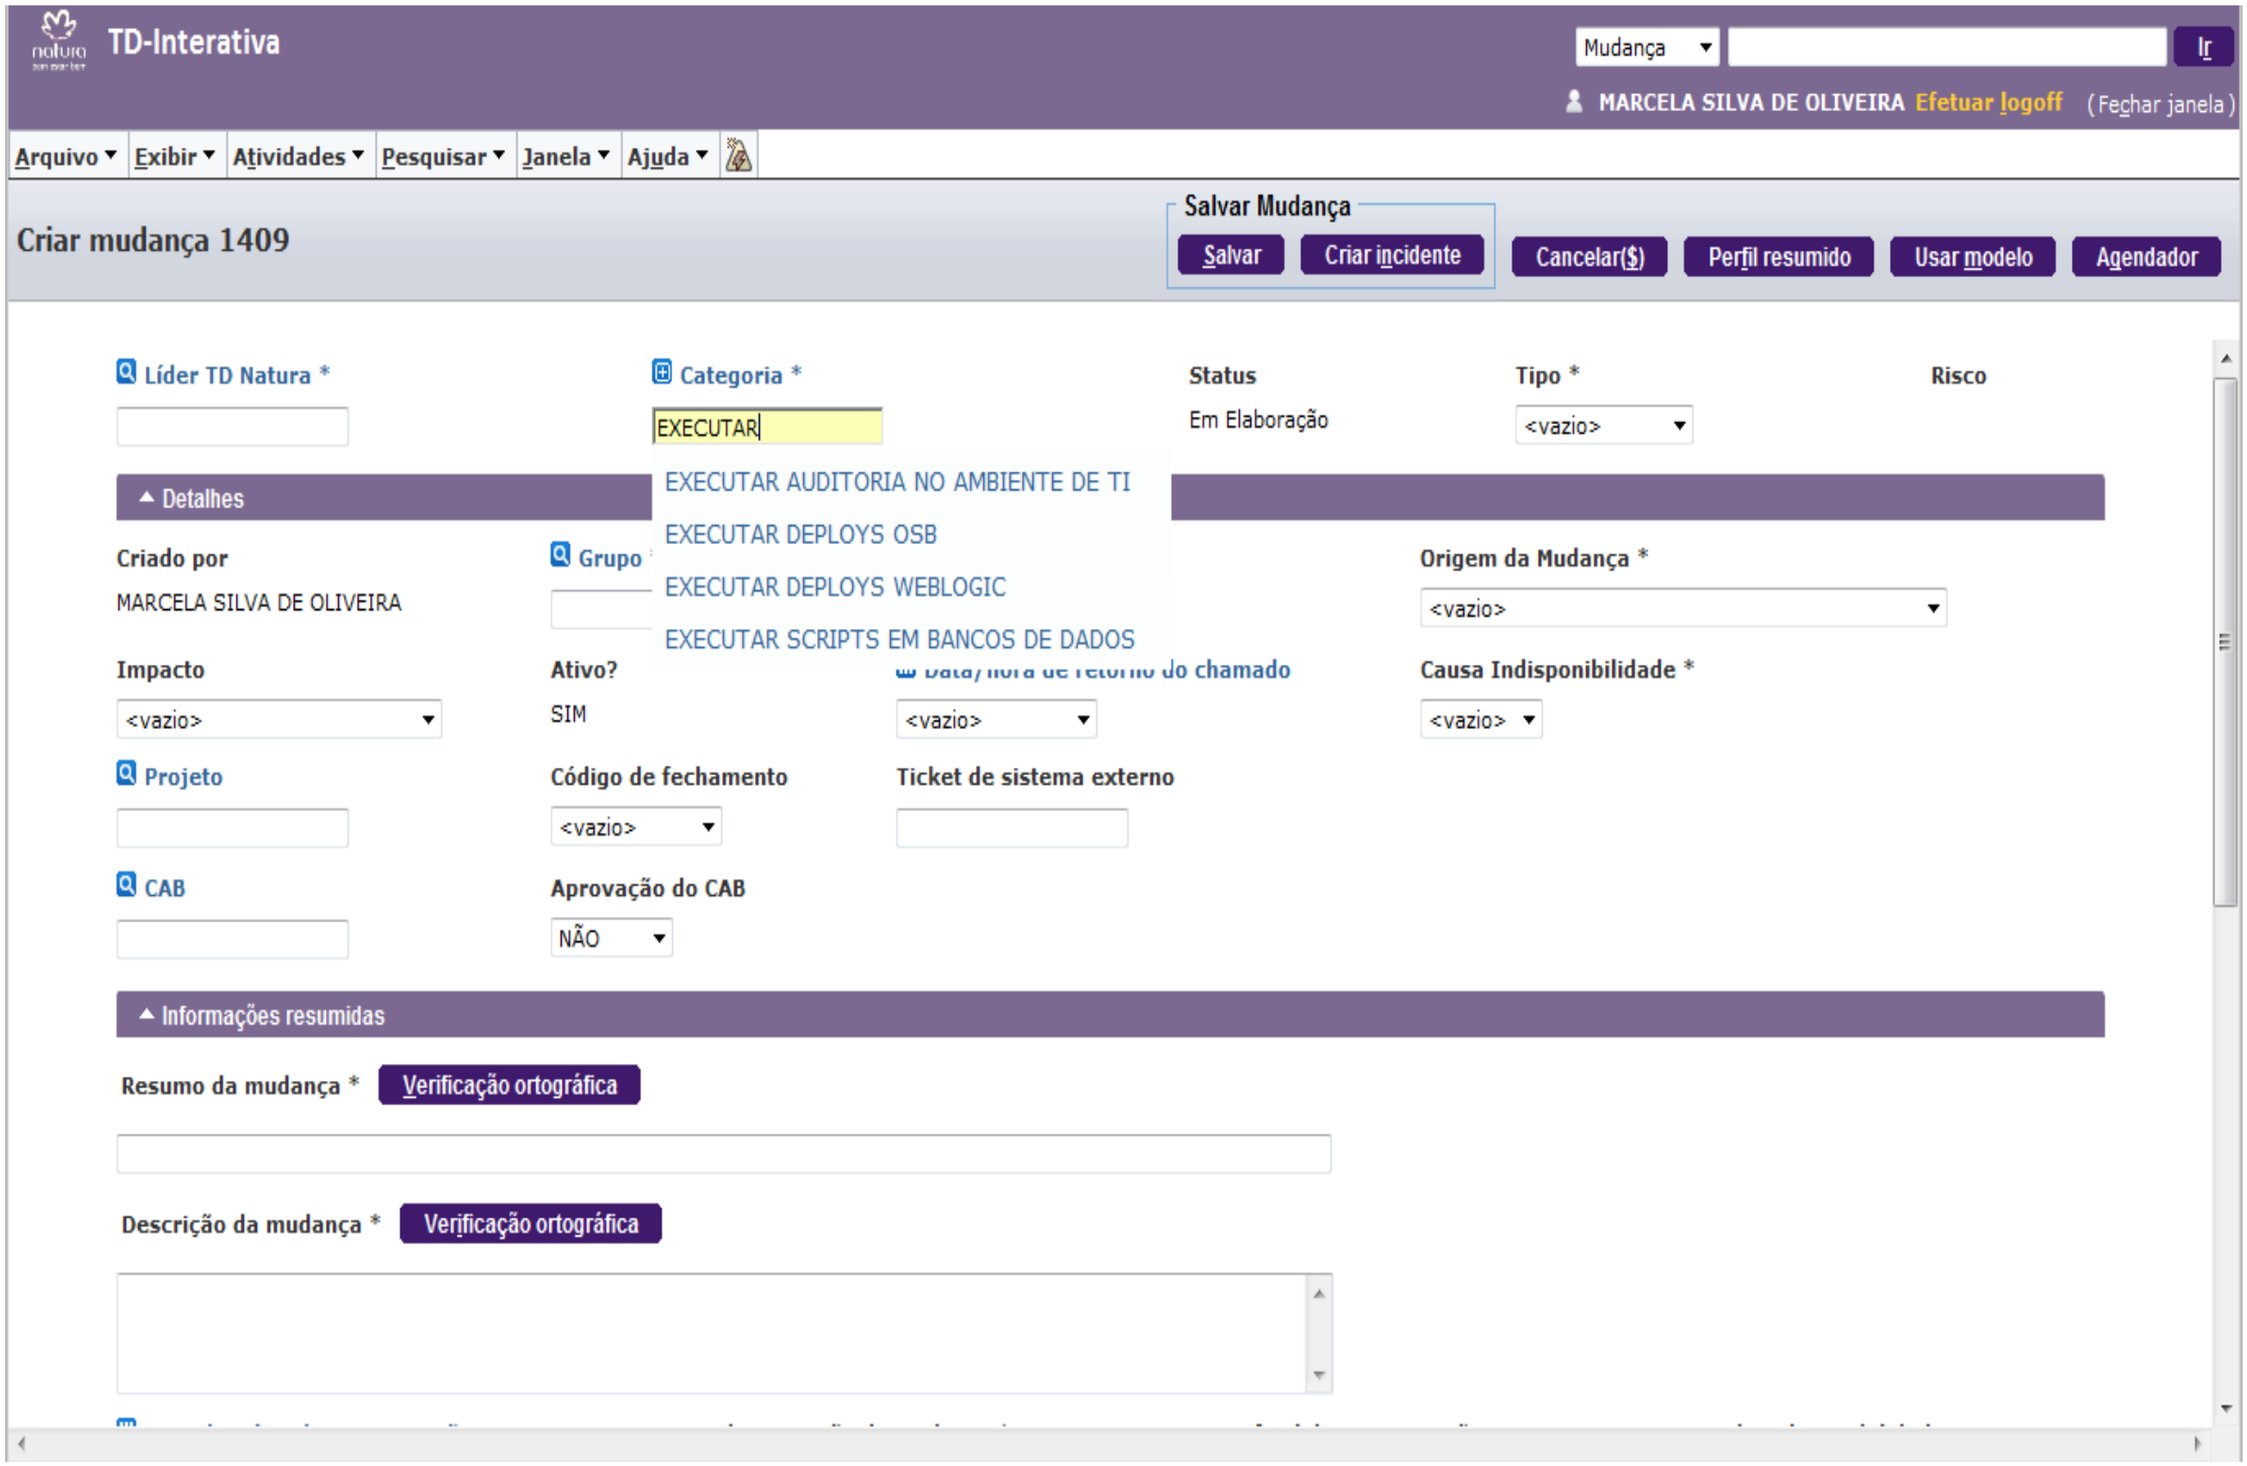


Conhecendo os campos

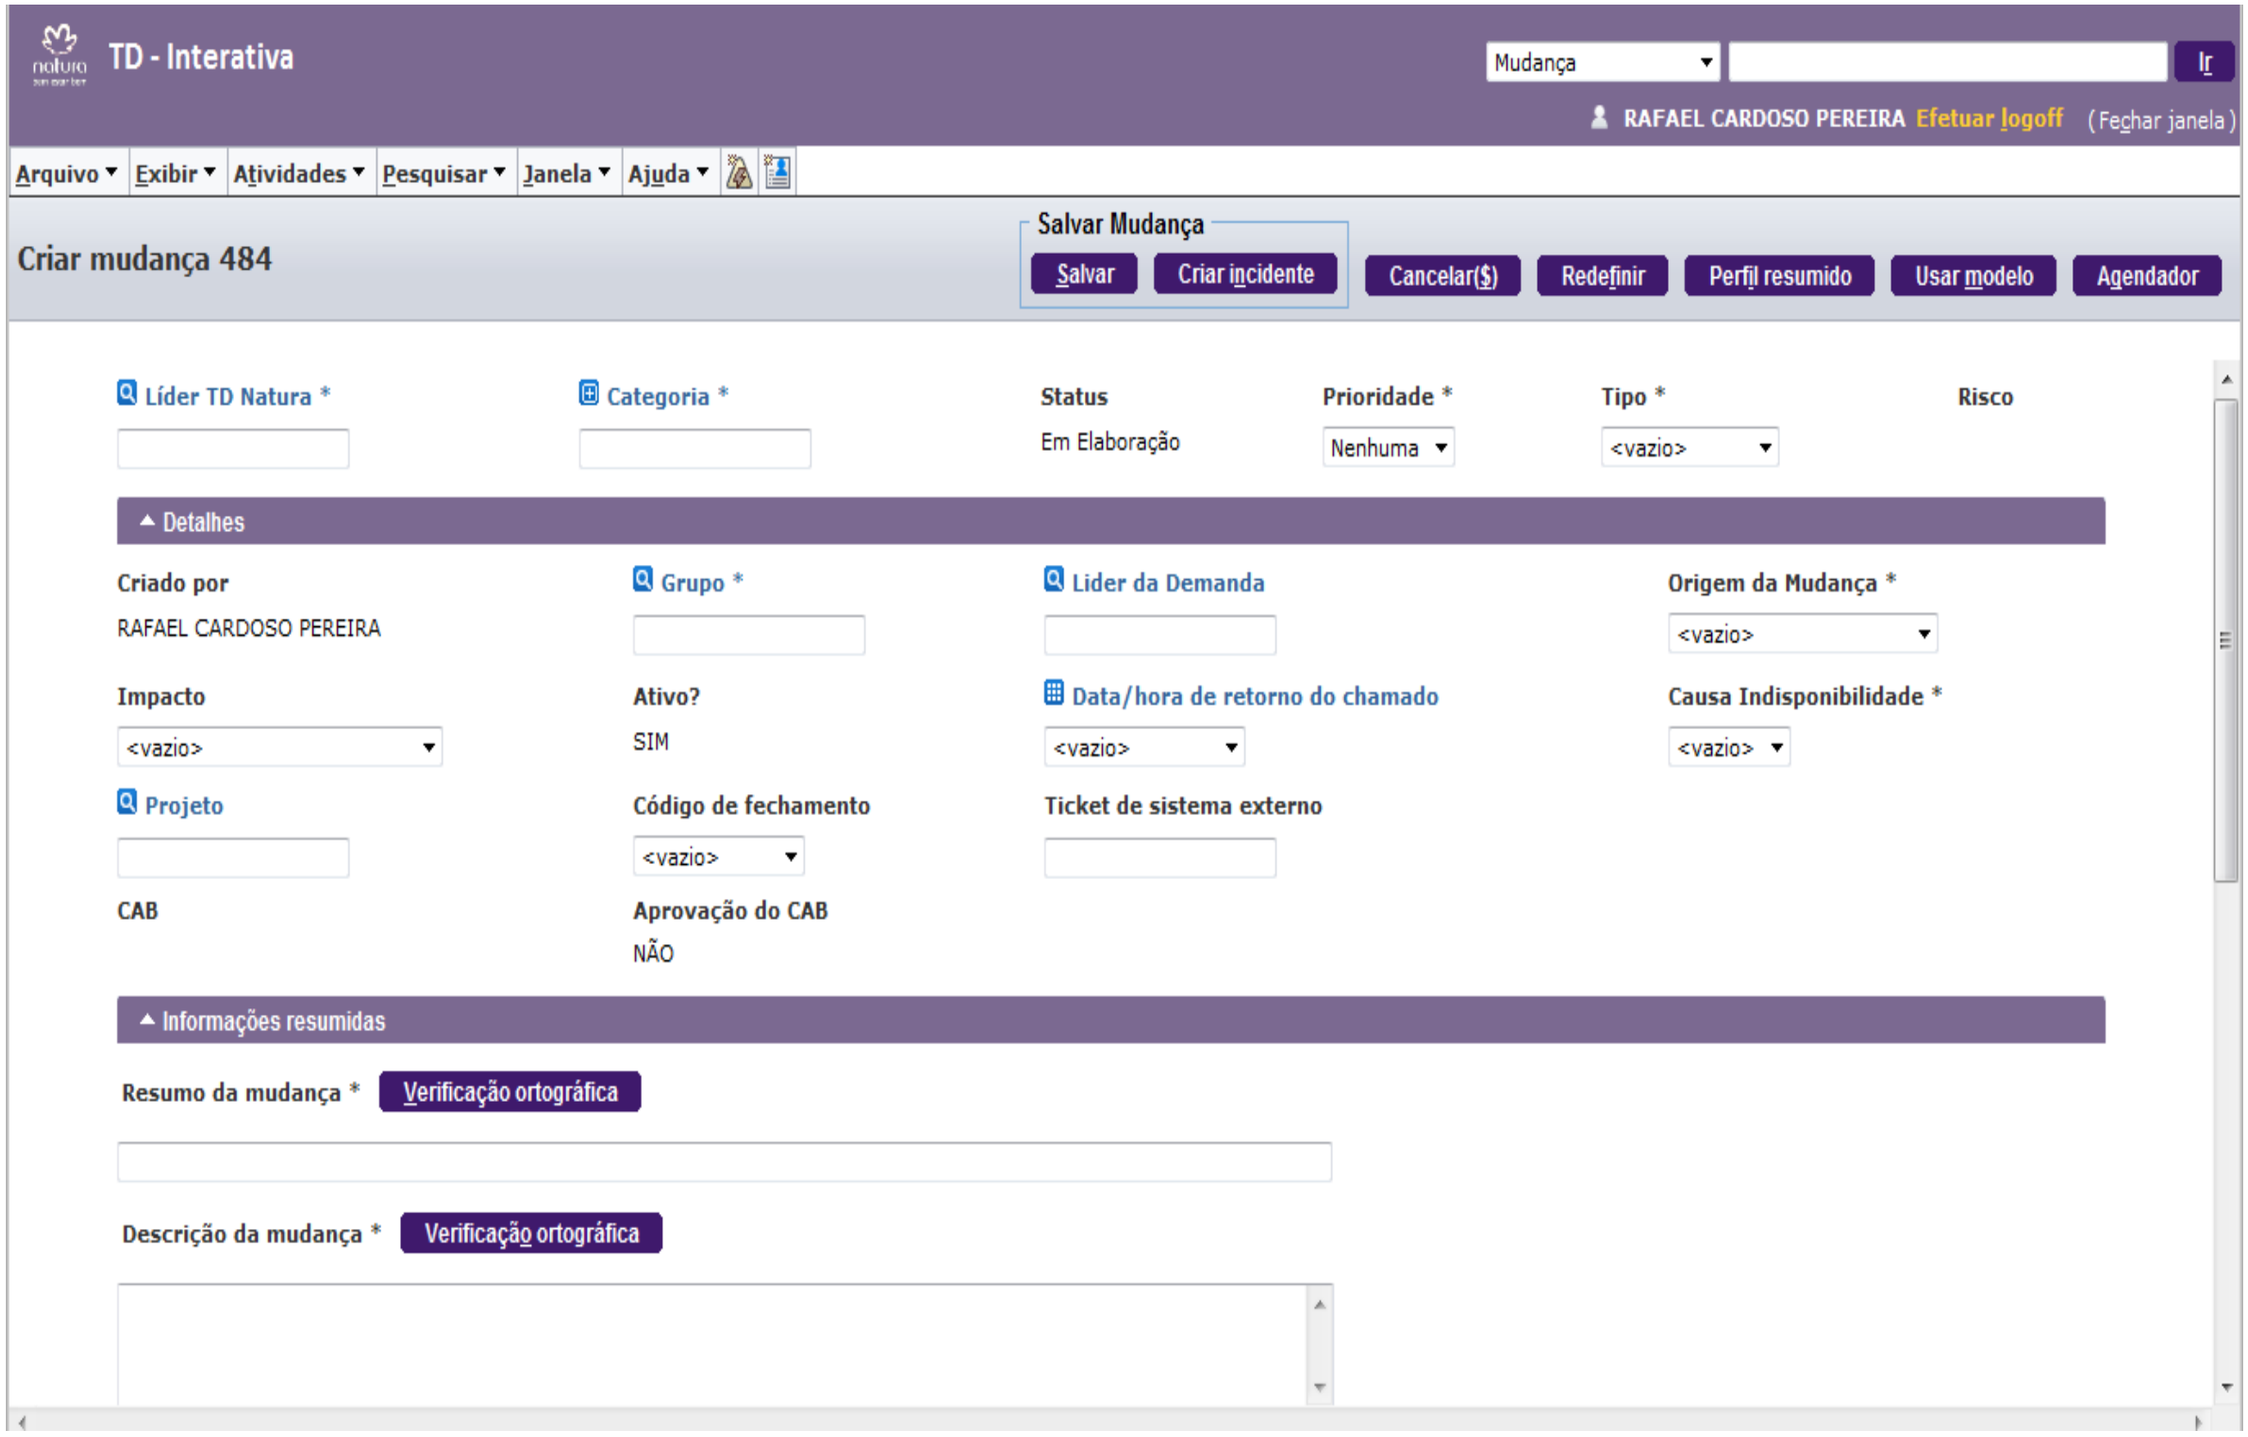

Conhecendo os campos


Abertura de Categoria

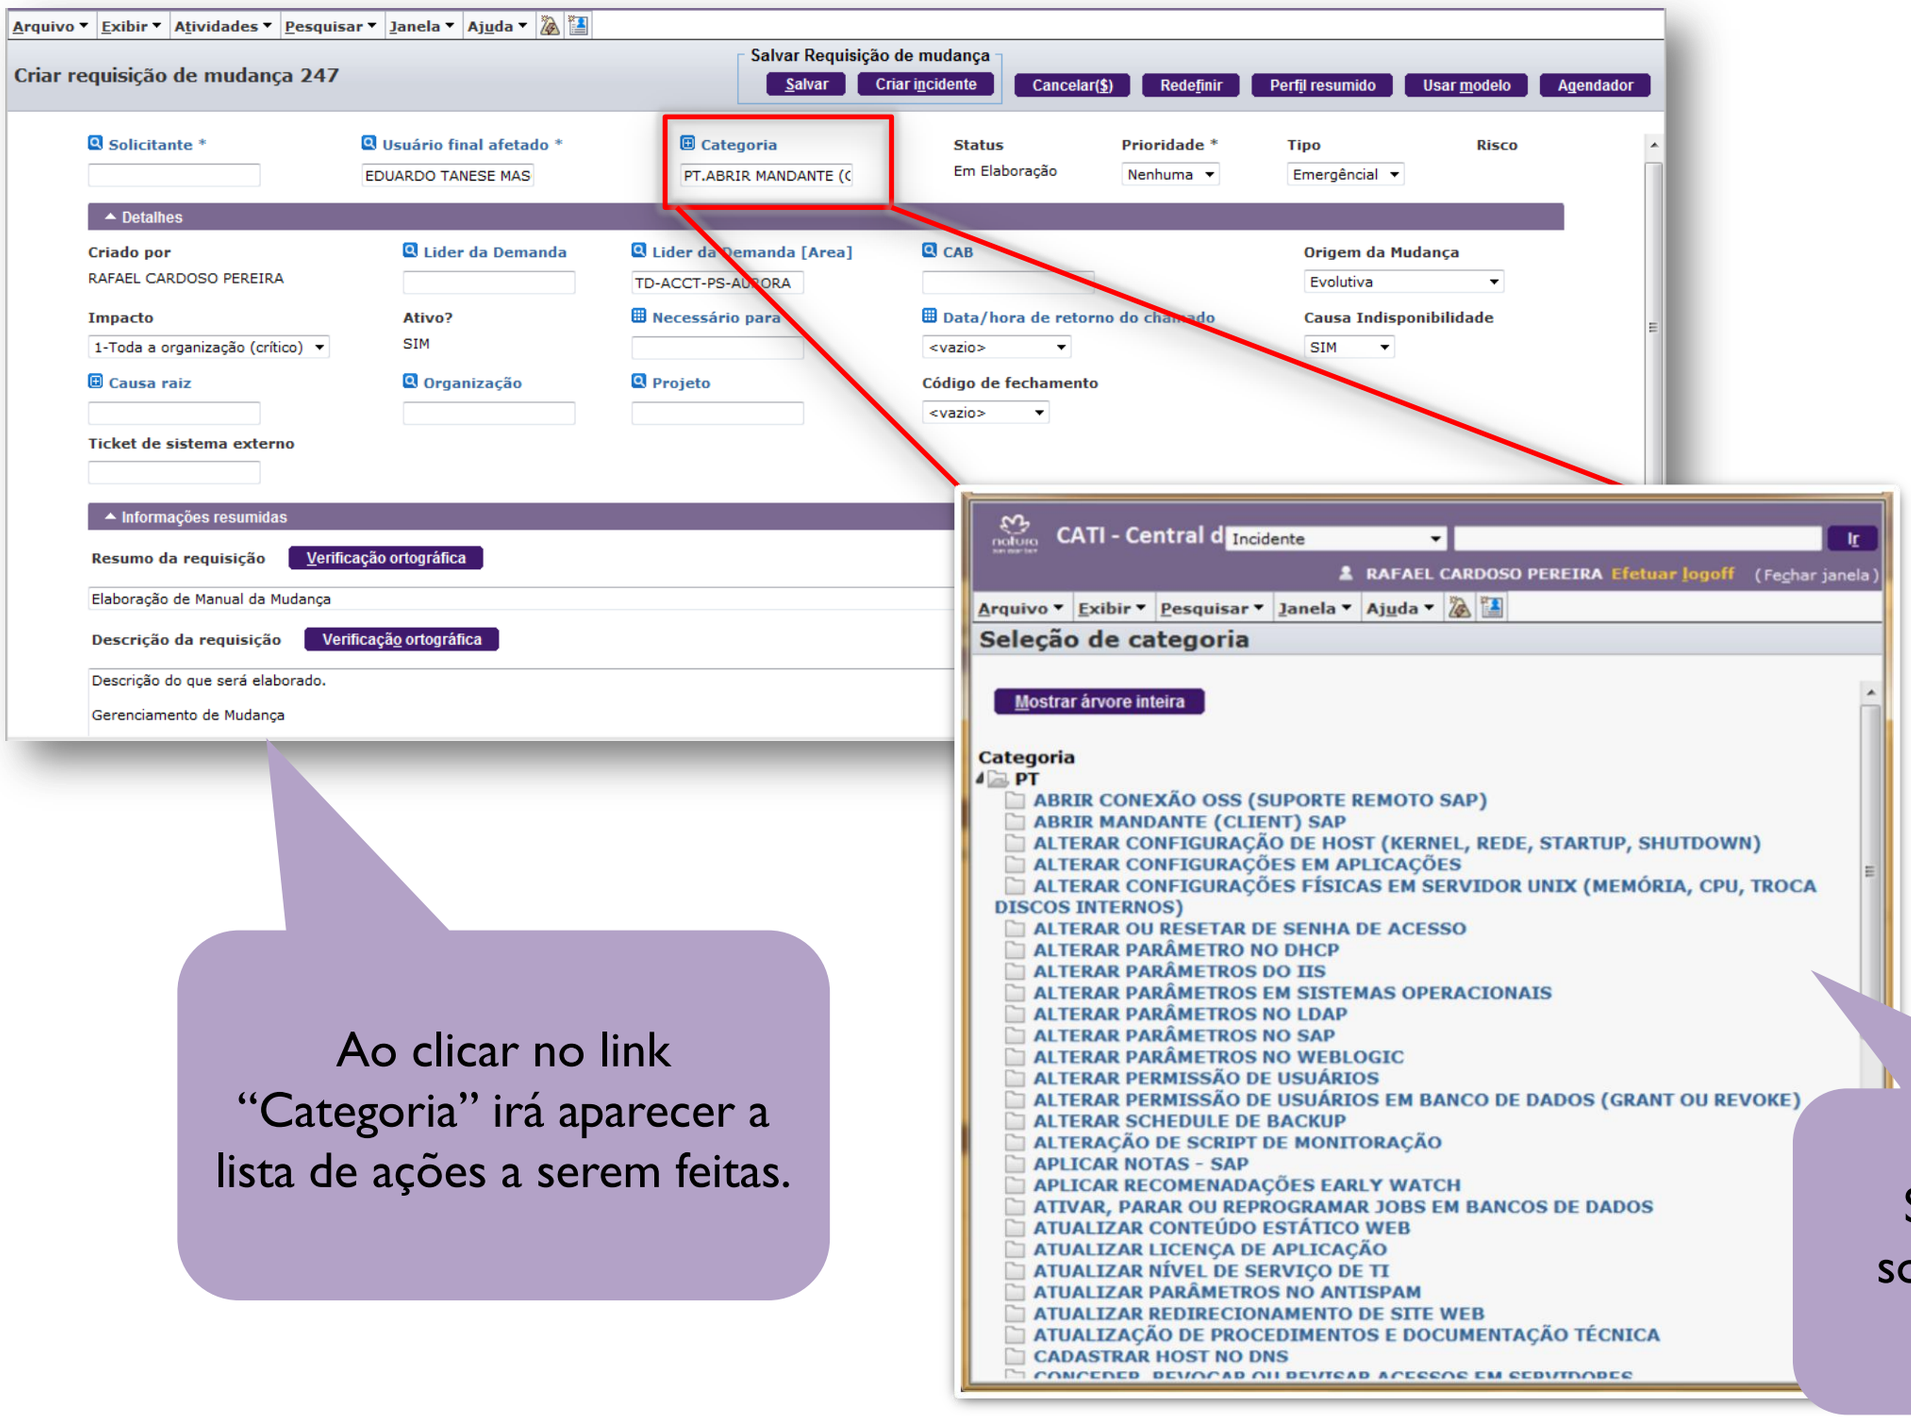

Ao clicar no link "Categoria" irá aparecer a lista de ações a serem feitas.

Serviços não listados, solicitar por e-mail para equipe de GMUD.

Pesquisa de risco

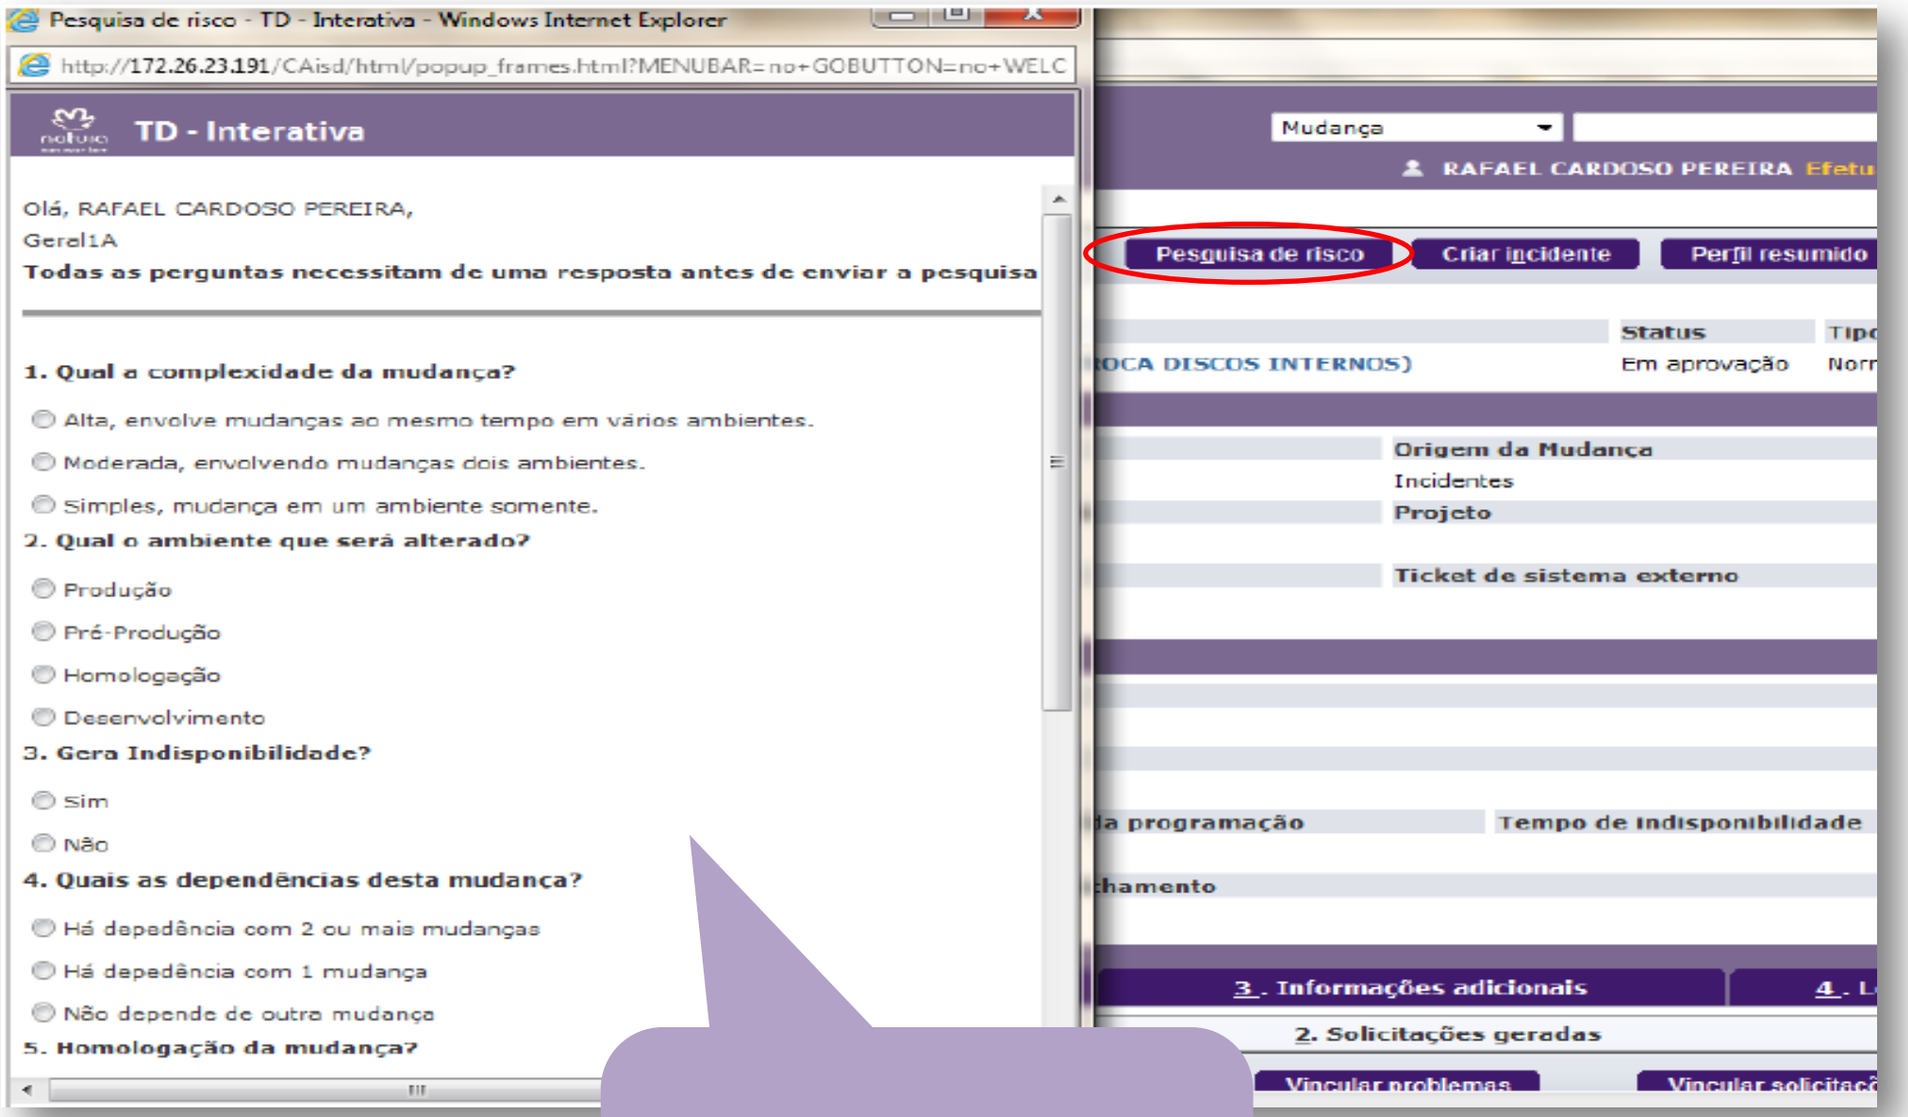

Pesquisa de Risco não respondida, mudança cancelada!

Fluxo de Tarefas

TD-Interativa

Mudança | Ir

MARCELA SILVA DE OLIVEIRA Efetuar logoff (Fechar janela)

Arquivo | Exibir | Atividades | Ações | Pesquisar | Relatórios | Janela | Ajuda

1402 - Detalhes da mudança

Editar | Exibir pesquisa de risco | Criar incidente | Perfil resumido | Exibir o agendador

1. Tickets relacionados | 2. Gerenciamento de configurações | 3. Informações adicionais | 4. Logs

1. Propriedades | 2. Tarefas do fluxo de trabalho | 3. Tipo de serviço | 4. Anexos | 5. Conflitos | 6. Custos/planos

Tarefas do fluxo de trabalho clássico

Atualizar tarefas do fluxo de trabalho | Inserir tarefas($)

Data de início do fluxo de trabalho	Data de conclusão estimada	Data de conclusão real
19/11/2014 10:42:21		

Lista de fluxos de trabalho de mudança

Pesquisar | Mostrar filtro | Limpar filtro($) | Console do CAB($) | Editar na lista($) | Exportar($)


1-9 de 9

Seq.	Tarefa	Responsável	Grupo	Status	Descrição	Data de início	Data de conclusão
1	Elaborar Mudança	GIOVANI FERREIRA DE PASSOS		Pendente		19/11/2014 10:42:21	
2	QA - Análise		QA GMUD	Aguardando			
3	Tarefa de início de grupo			Aguardando			
4	Aprovar			Aguardando			
999	Tarefa de término de grupo			Aguardando			
1000	Aprovar - CAB		QA GMUD	Aguardando			
2000	Testar			Aguardando			
3000	Retorno			Aguardando			
4000	Revisão Pos Implementação		QA GMUD	Aguardando			

Fluxo de Tarefas

O fluxo de tarefas aparecerá após a mudança ser salva, ele se encontra na Aba "3. Informações adicionais", sub aba "2. Tarefas de fluxo de trabalho".

Já vem um fluxo de trabalho por default, porém, é flexível ao usuário incluir novas tarefas para "Aprovação" e "Execução".

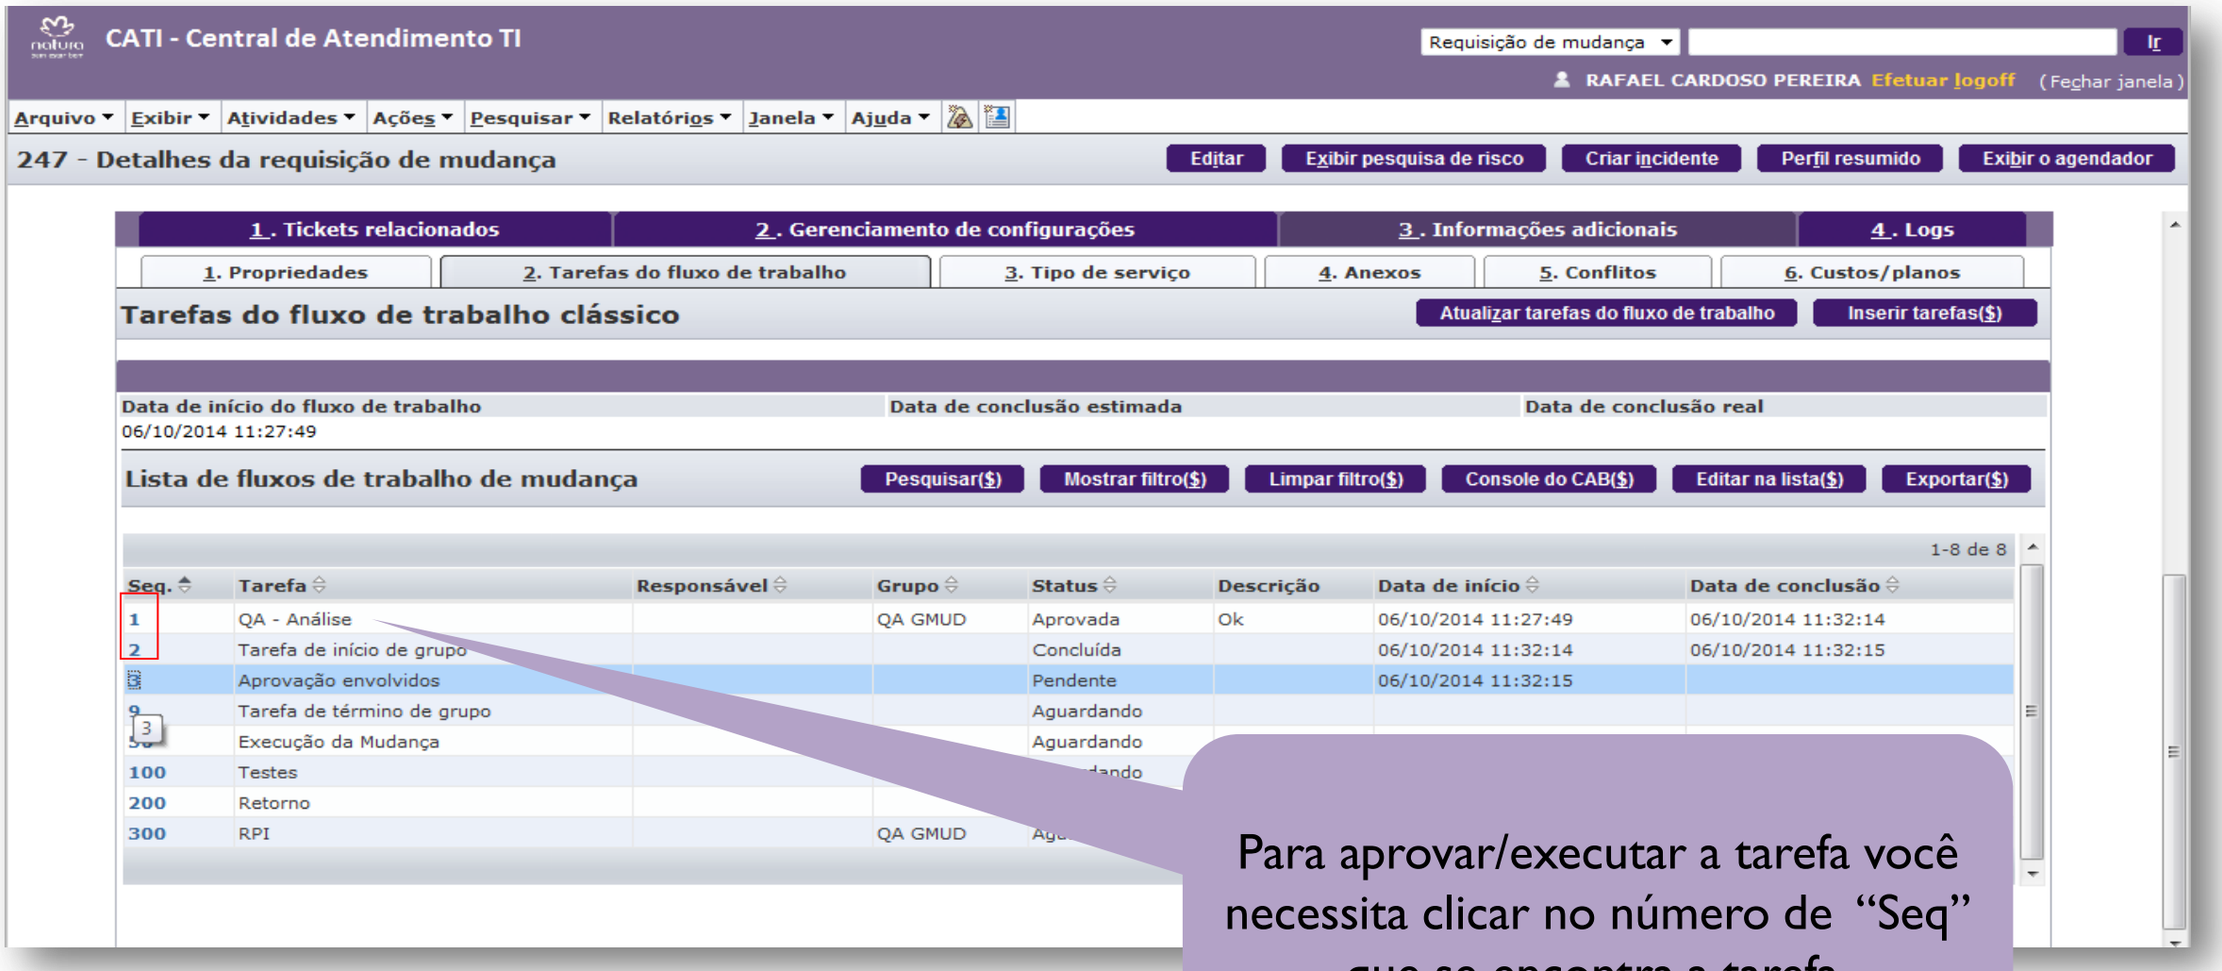


Para aprovar/executar a tarefa você necessita clicar no número de "Seq" que se encontra a tarefa.


Fluxo de Tarefas



Clicar no número de sequência irá abrir um pop-up com os detalhes da tarefa pela qual você irá aprovar/executar.

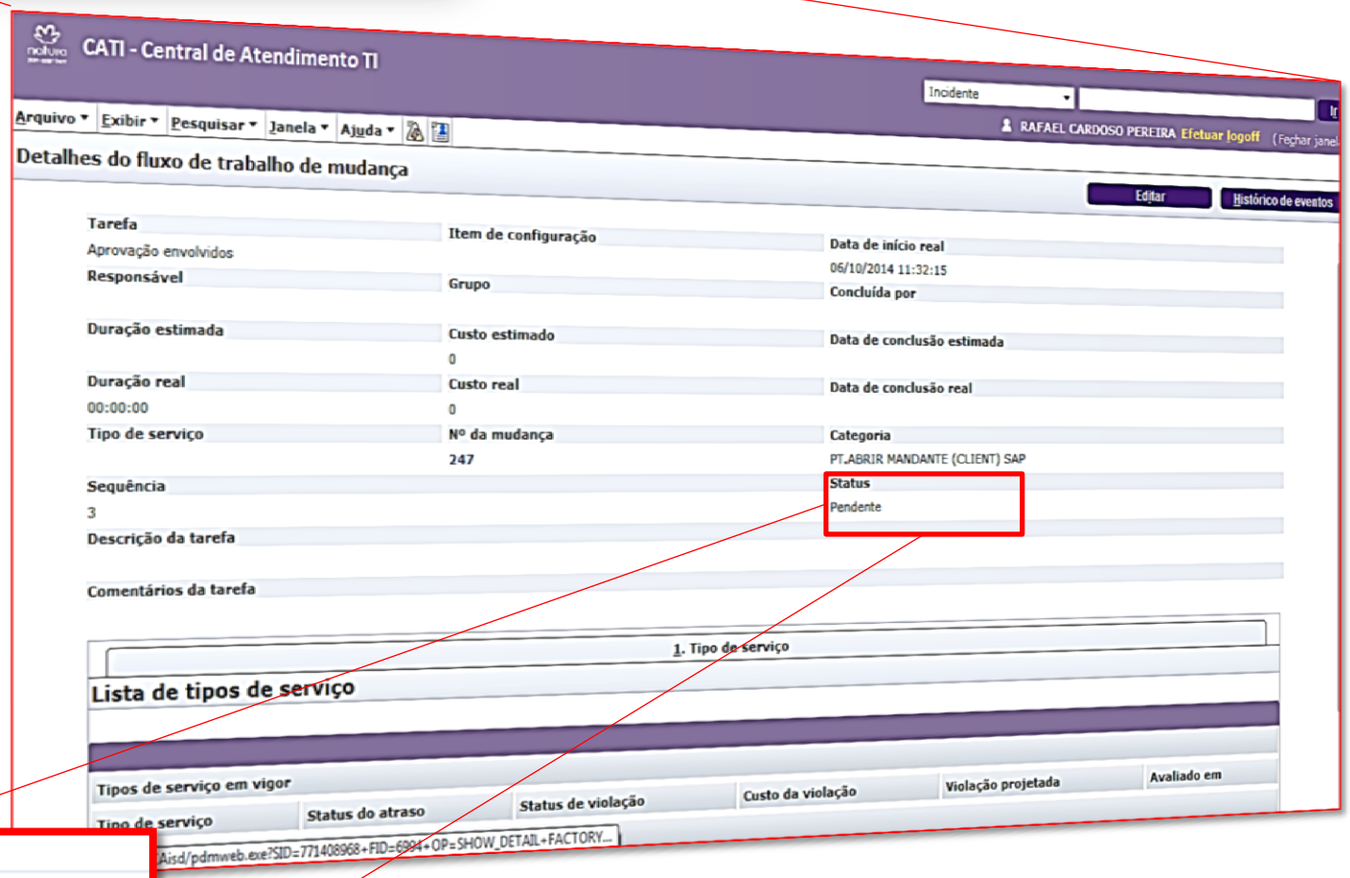



Um IC por tarefa... Uma tarefa por IC




Ao clicar em "Editar" você poderá editar o Status da tarefa conforme lista.

Fluxo de Tarefas - Inserindo novas tarefas

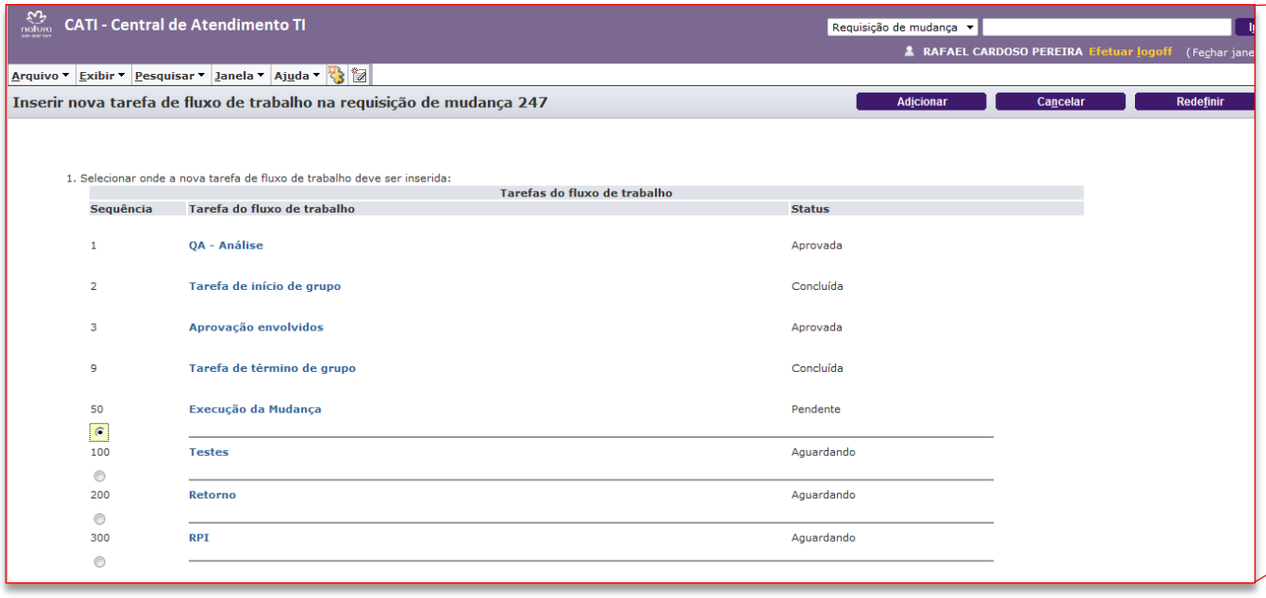

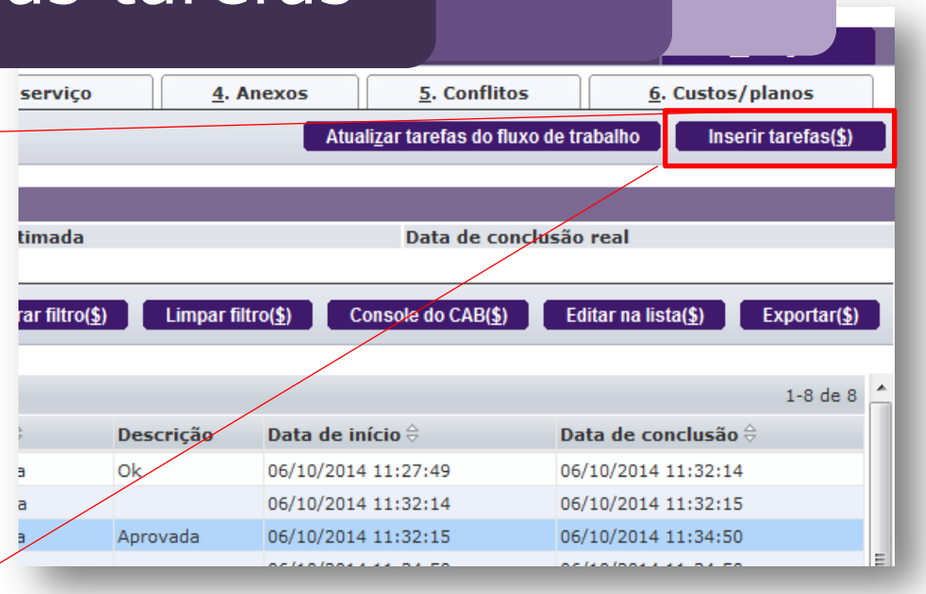

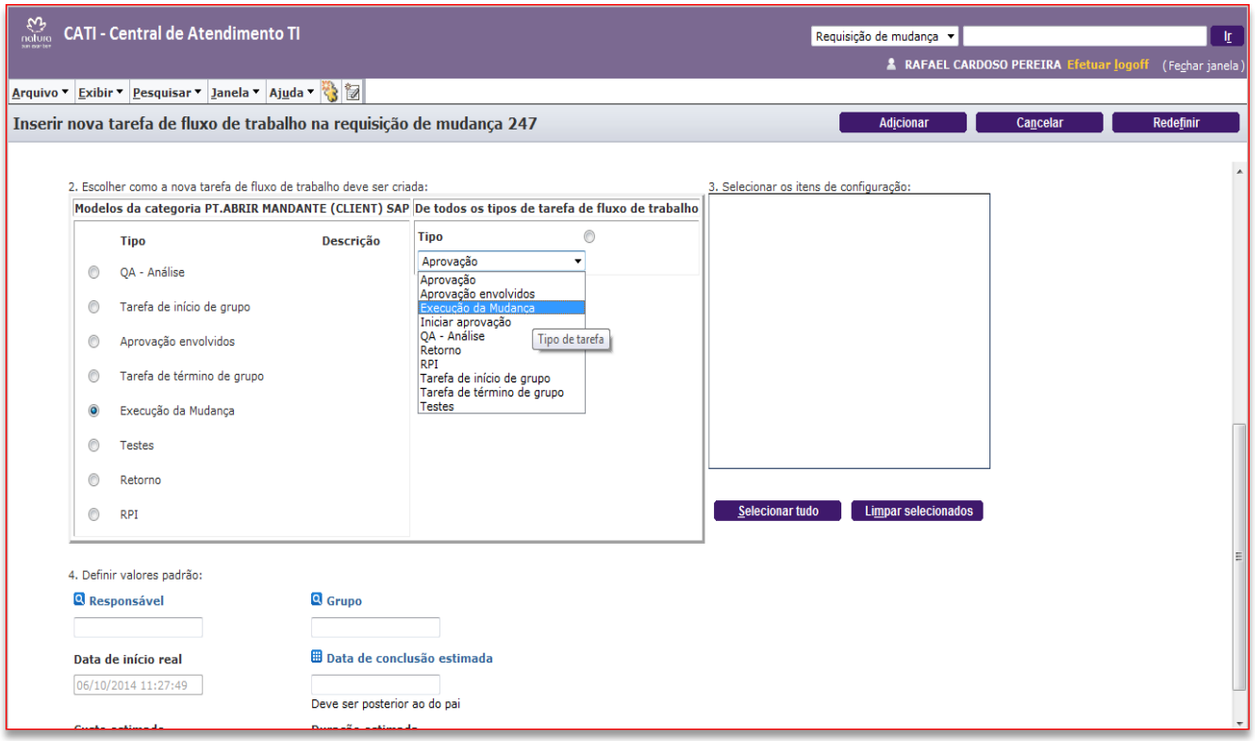


Para inserir uma tarefa, clique no botão "Inserir Tarefas" localizado no canto superior direito a cima do "Fluxo de trabalho".


Irá abrir um pop-up para detalhar qual será a nova tarefa. Irá seguir o fluxo a baixo, conforme as imagens apresentadas ao lado:

1- Informe a partir de qual sequência será a sua tarefa, no caso de aprovação inserir a partir de 'Aprovação envolvidos', o mesmo para execução.
2 – Informe que tipo de tarefa irá inserir (Aprovação, Execução, Retorno), seguindo o seu plano de implementação.
3 – Por fim informe o grupo (área) responsável por esta tarefa ou a pessoa responsável. Clique em adicionar para finalizar.

Relacionando incidentes a mudanças

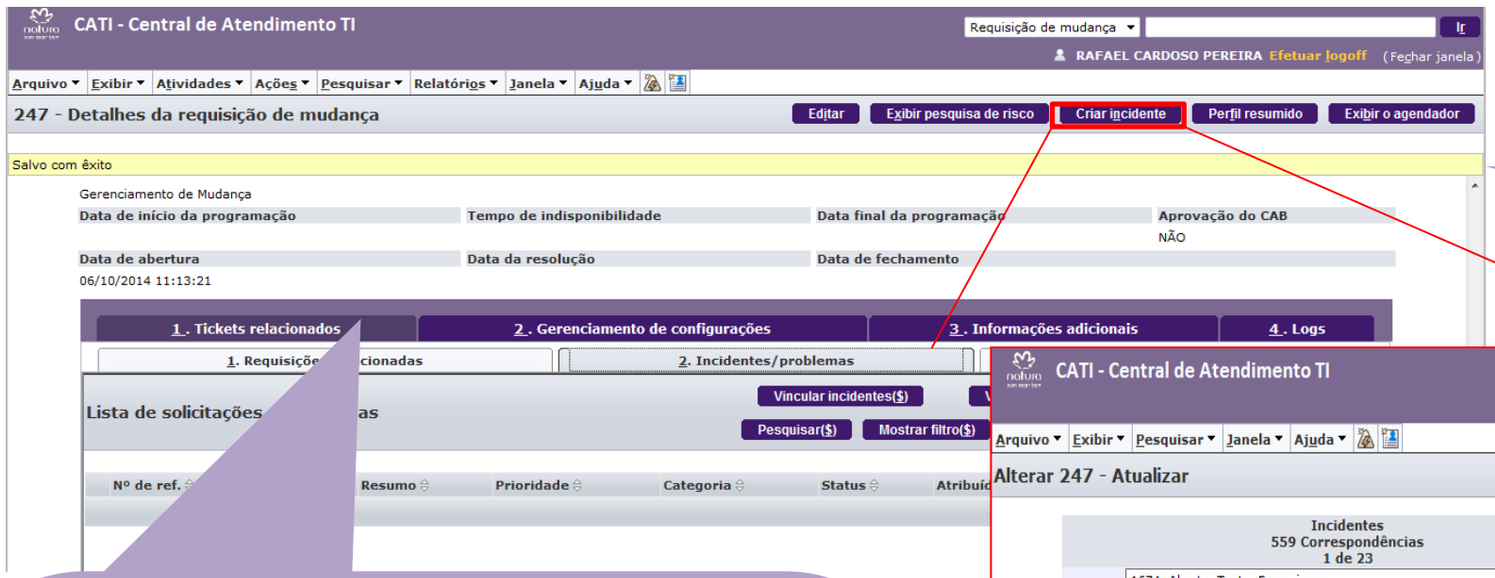

Você poderá verificar os incidentes, requisições e problemas relacionados a mudança na aba 1. Tickets relacionados’

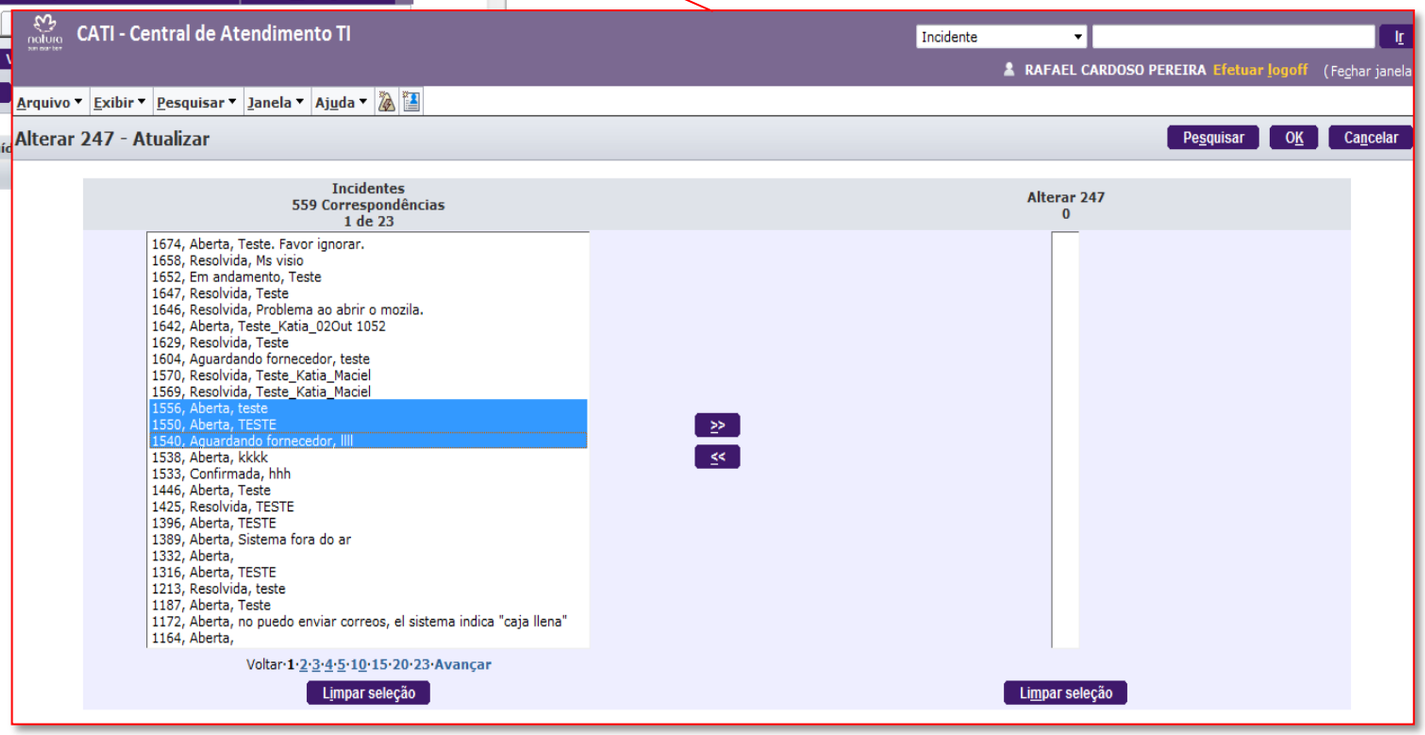


- Na sub aba “2. Incidentes/Problemas’” você poderá vincular um incidente, problema ou/e requisição a sua mudança.


- Clique no botão “Vincular Incidente’” (ou problema e requisição). Ira abrir uma janela de pesquisa.

Com base nos filtros colocado por você a ferramenta irá trazer uma lista com os resultados, poderá vincular quantos tickets for necessário

- Clique em ‘Ok’ para finalizar.




Gerenciador de Filas

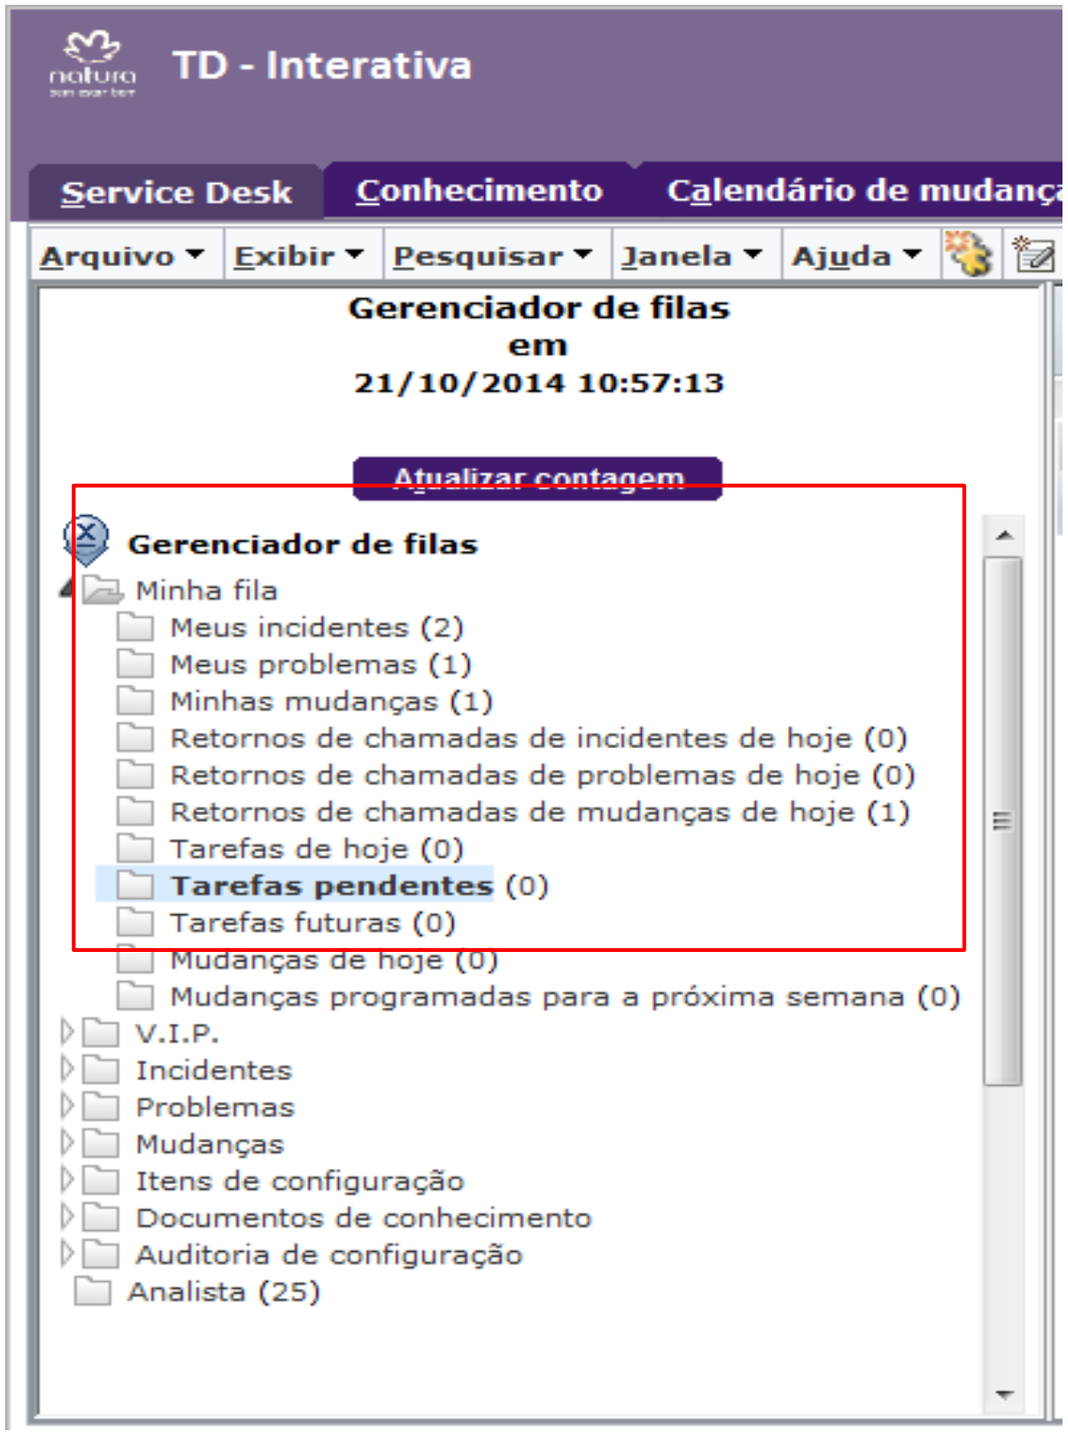

Em sua janela principal você terá seu gerenciador de filas, onde será possível:

- Saber quantos problemas e mudanças estão com você como responsável;
- Tarefas pendentes de execução, futuras e as que estão para vencer hoje;
- Acesso ao CMDB


Filtro de Pesquisa

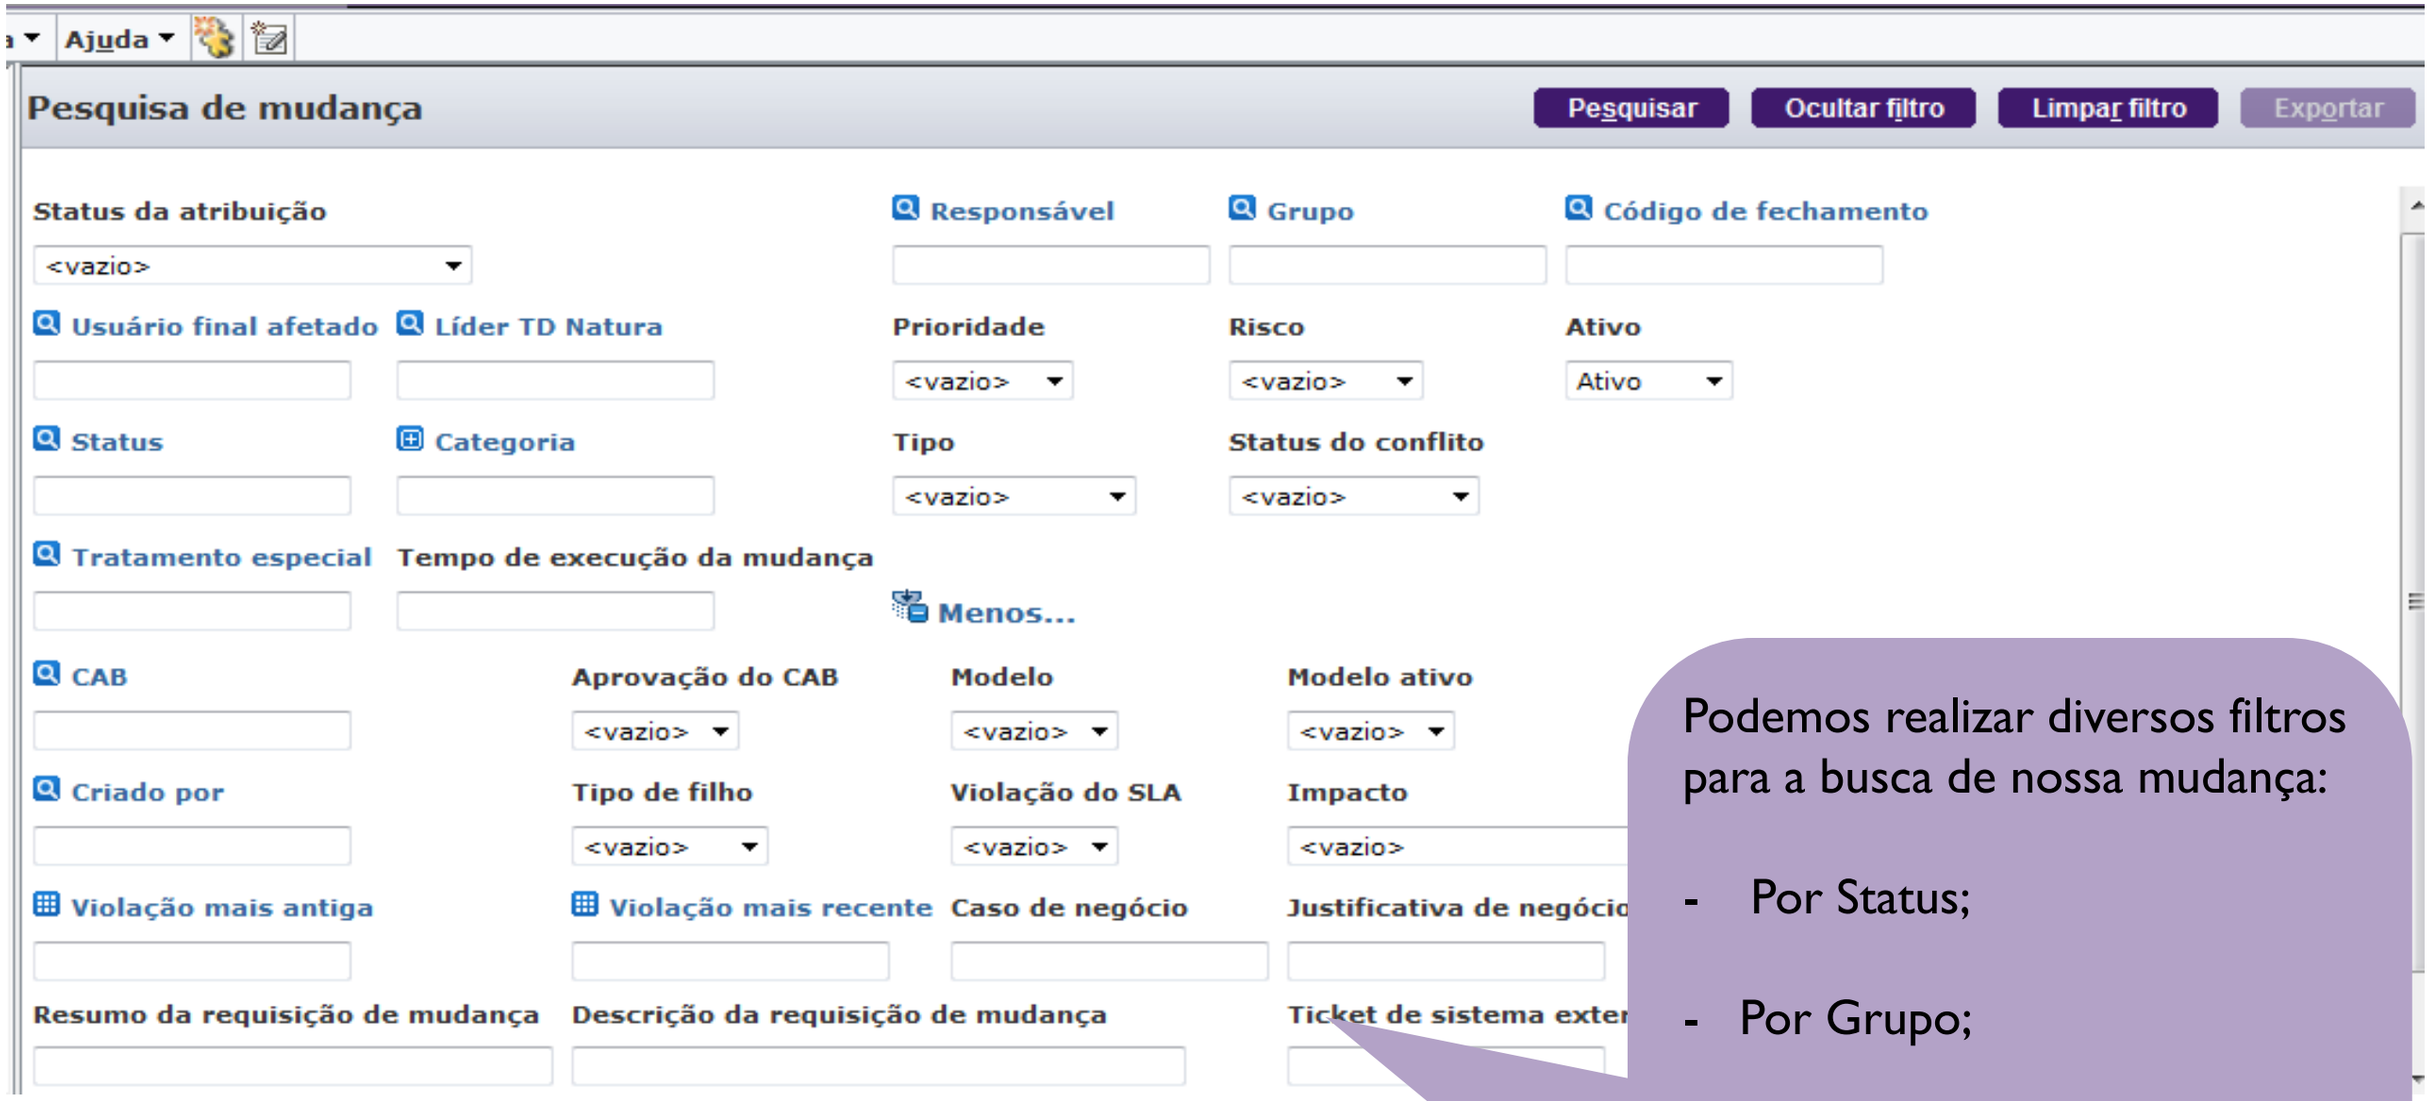

Podemos realizar diversos filtros para a busca de nossa mudança:

- Por Status;
- Por Grupo;
- Por Categoria (Serviço);
- Por Líder TD Natura


Filtro de Pesquisa

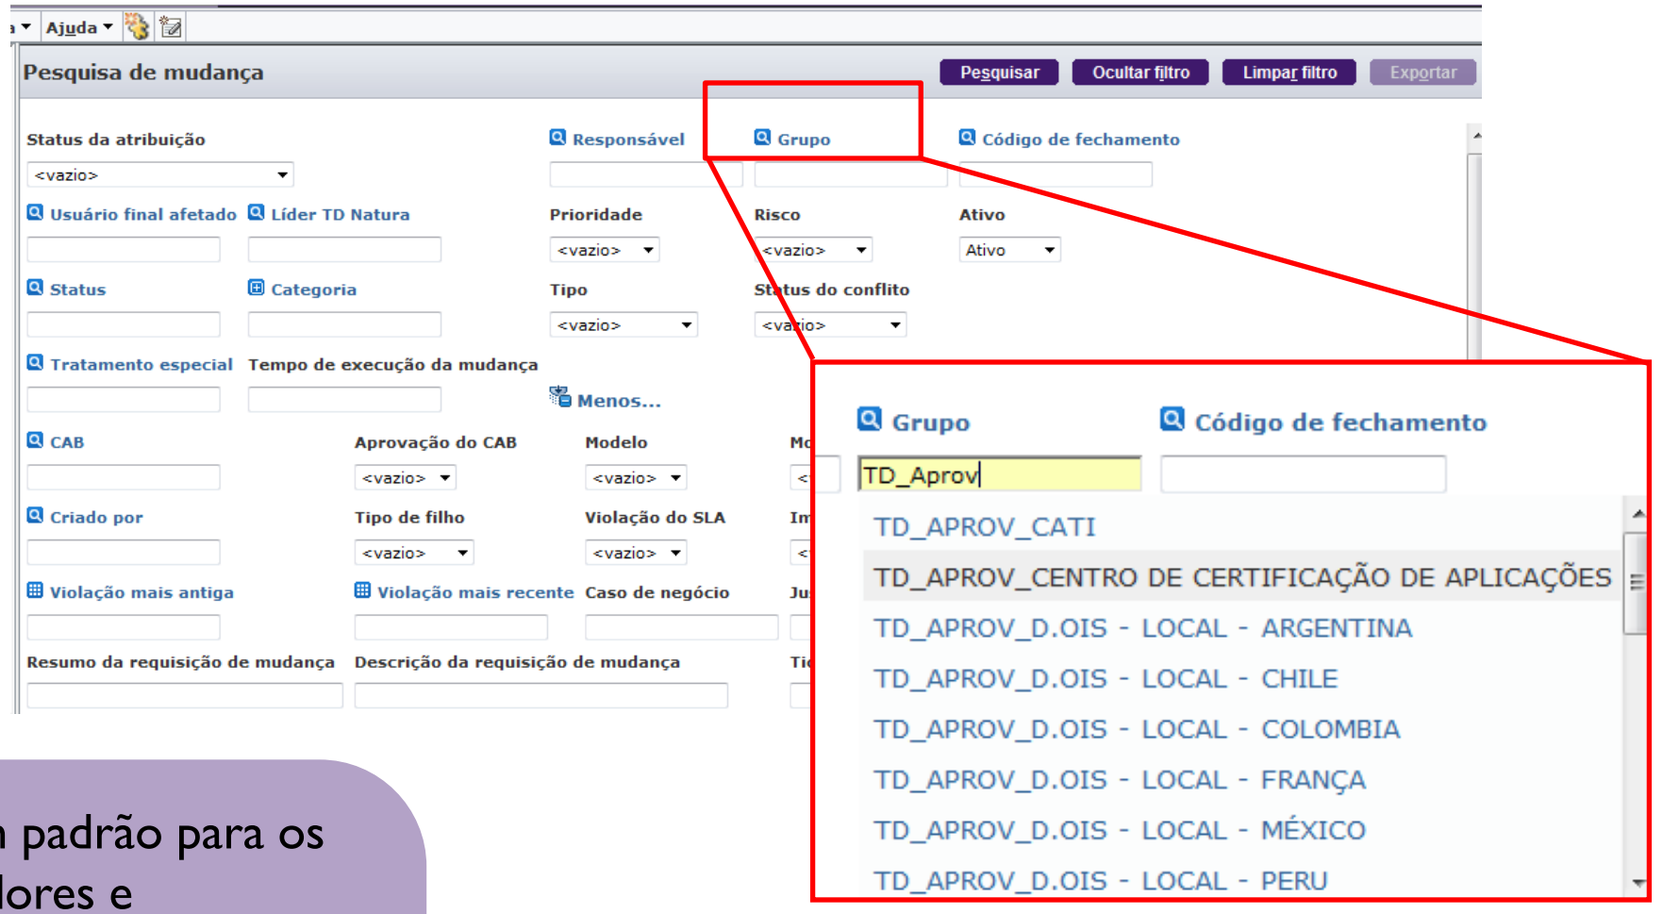

Foi definido um padrão para os grupos aprovadores e executores:

- Para buscar um grupo Aprovador – TD_Aprov...
- Para buscar um grupo Executor – TD_Exec...

Filtro de Pesquisa

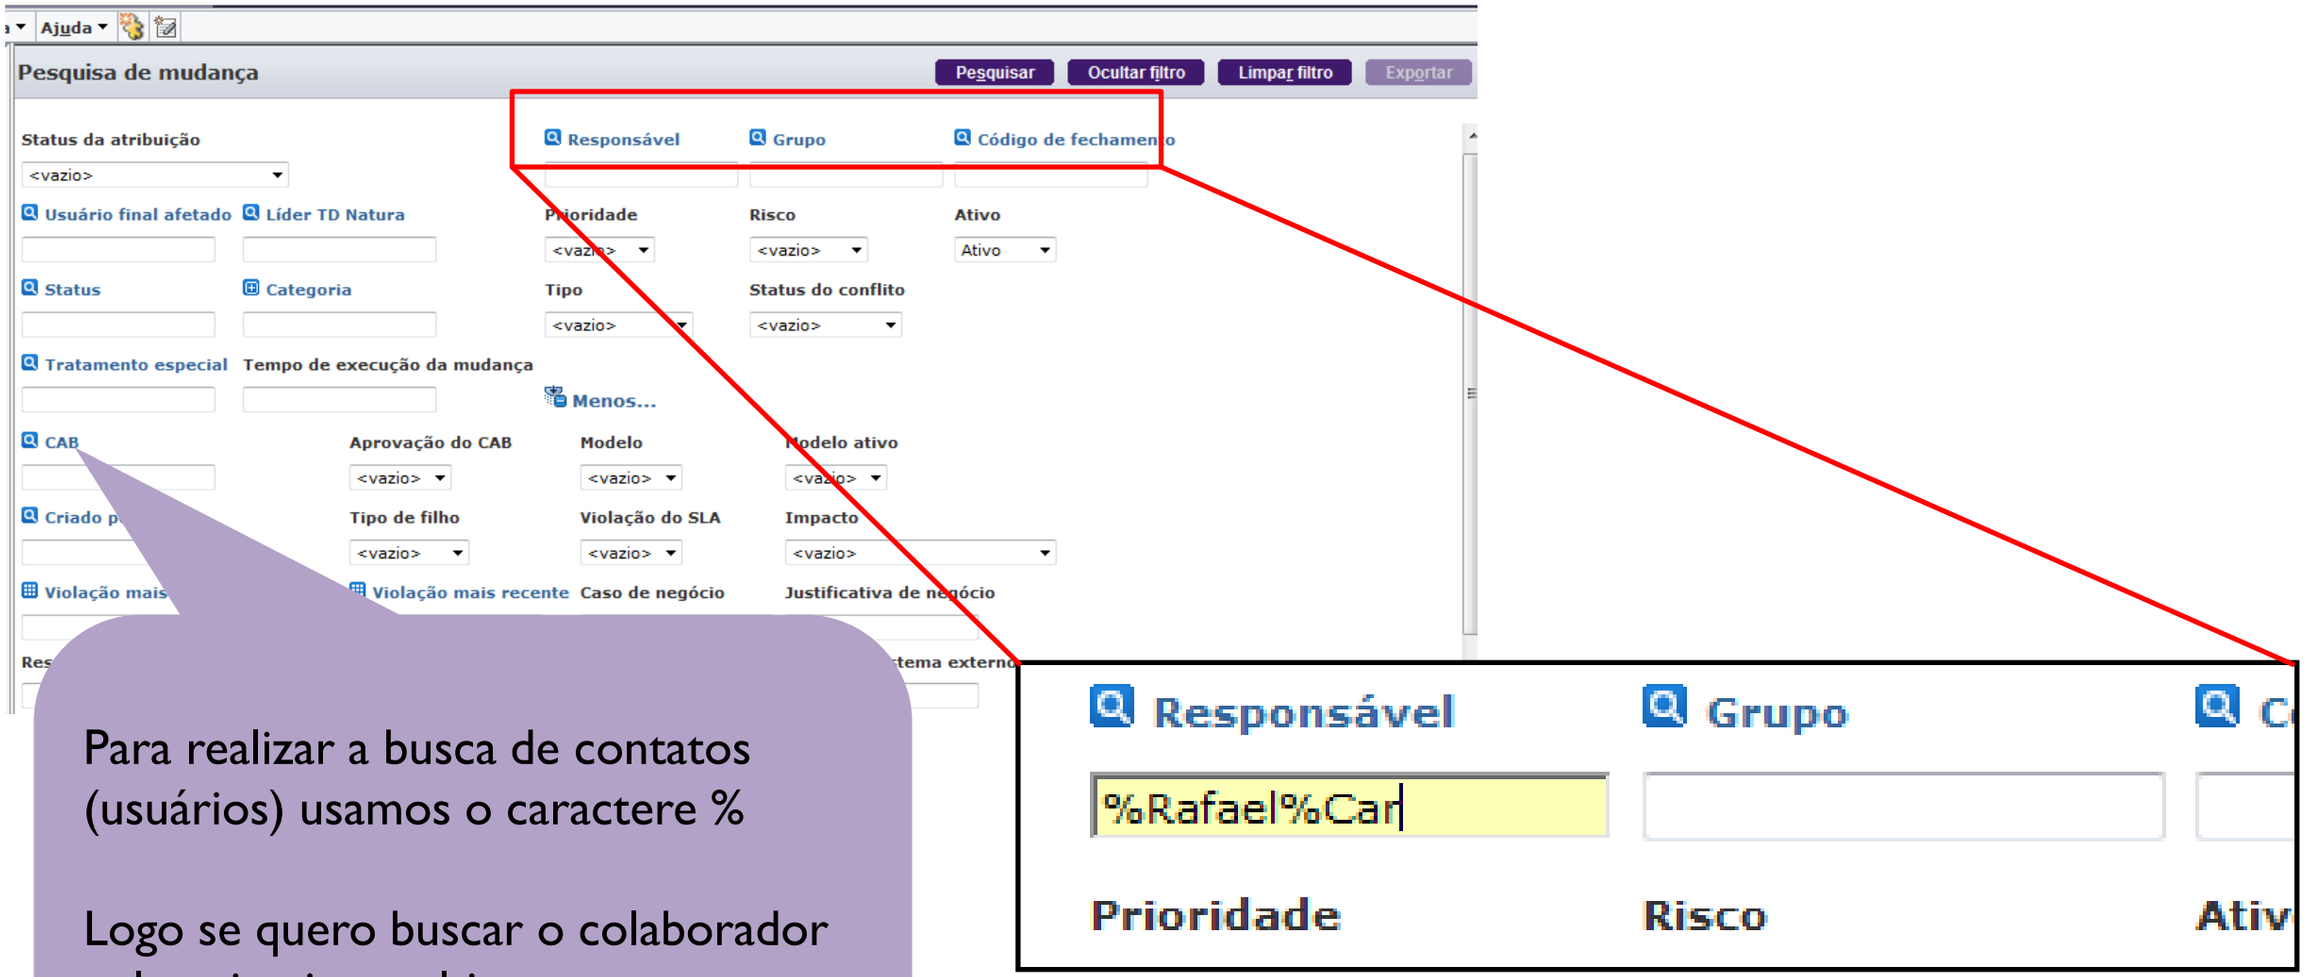


Para realizar a busca de contatos (usuários) usamos o caractere %

Logo se quero buscar o colaborador pelo primeiro e ultimo nome;

Ex: %Rafael%Cardoso%


Atribuições de Perfis

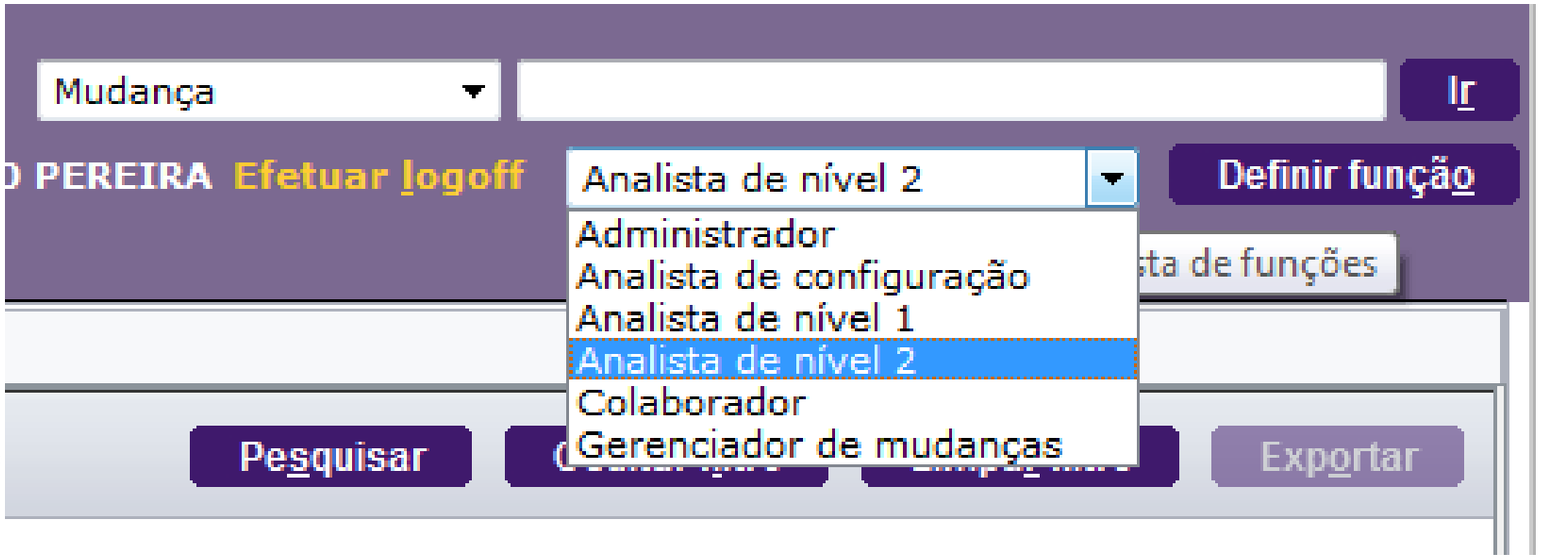

Por padrão todos os colaboradores que abrem Mudanças e Problemas terão na ferramenta os perfis de "'Analista Nível 2" e "Colaborador"

"Analista de Nível 2"– Vai poder abrir mudanças e problemas.

Plano de Ação – Preenchimento das datas

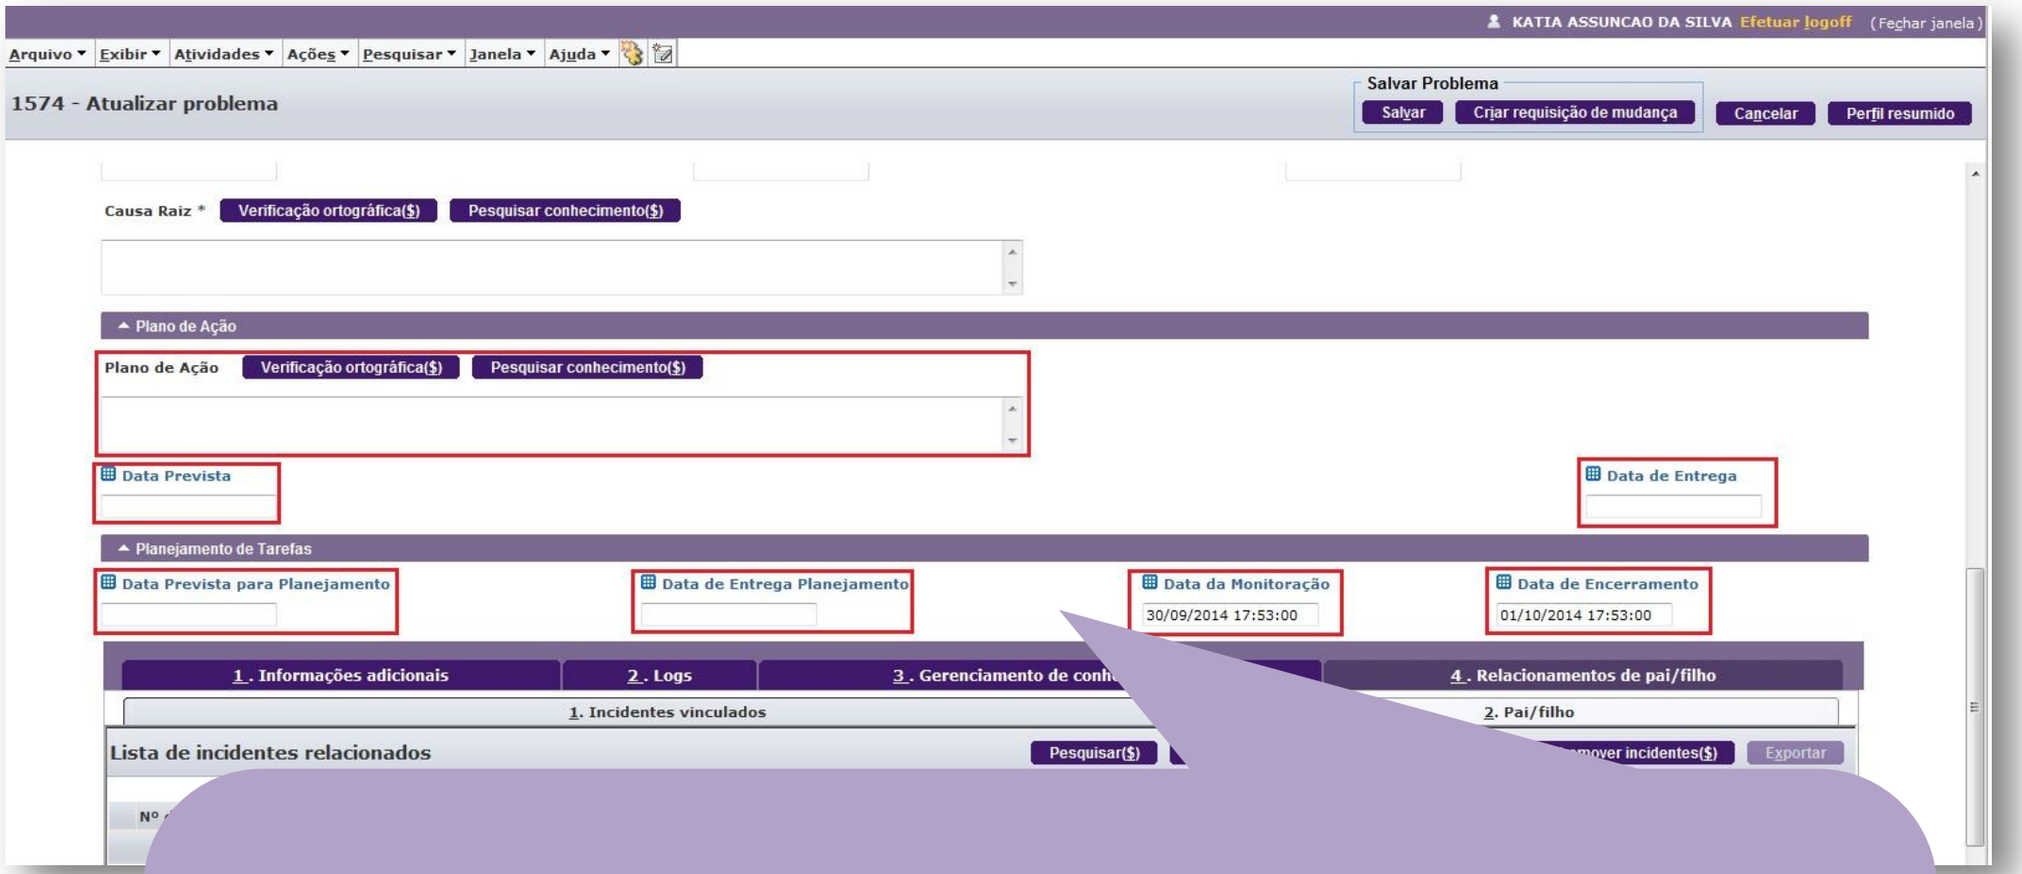

Efetuando o planejamento e preenchimento dos campos datas

- No campo "Plano de Ação" deve-se inserir a descrição para o plano de ação da solução do problema;
- No campo "Data Prevista" deve-se informar a data prevista para implementação da solução do problema;

- Efetuar o preenchimento dos campos: Data Prevista para planejamento, Data de Entrega, Planejamento, Data da Monitoração, Data de Encerramento;
- Após registrar as informações, clicar em salvar

Feedback / Contatos

Feedbacks, dúvidas ou suporte, entrar em contato com a **Equipe GPI – Gestão de Processos e Indicadores**

Gerente da Área: Marcus Marques (marcusmarques@natura.net)

Membros da Equipe de Processos:

Ana Paula Jimenez
Edmilson Gonzalles
Hiago Oliveira
Julia Miquelini
Laerte Vieira
Marcela Oliveira
Natalia Marinho

Contato:

gmud@natura.net

11 4196-2450


Membros da Equipe de Indicadores e CA SDM:

Eduardo Tanese Mascára
Jorge Arcanjo de Souza
Rafael Cardoso Pereira
Roberta Sarah Santos Oliveira

Contato:

SuporteCASDM@natura.net

Mão na massa!

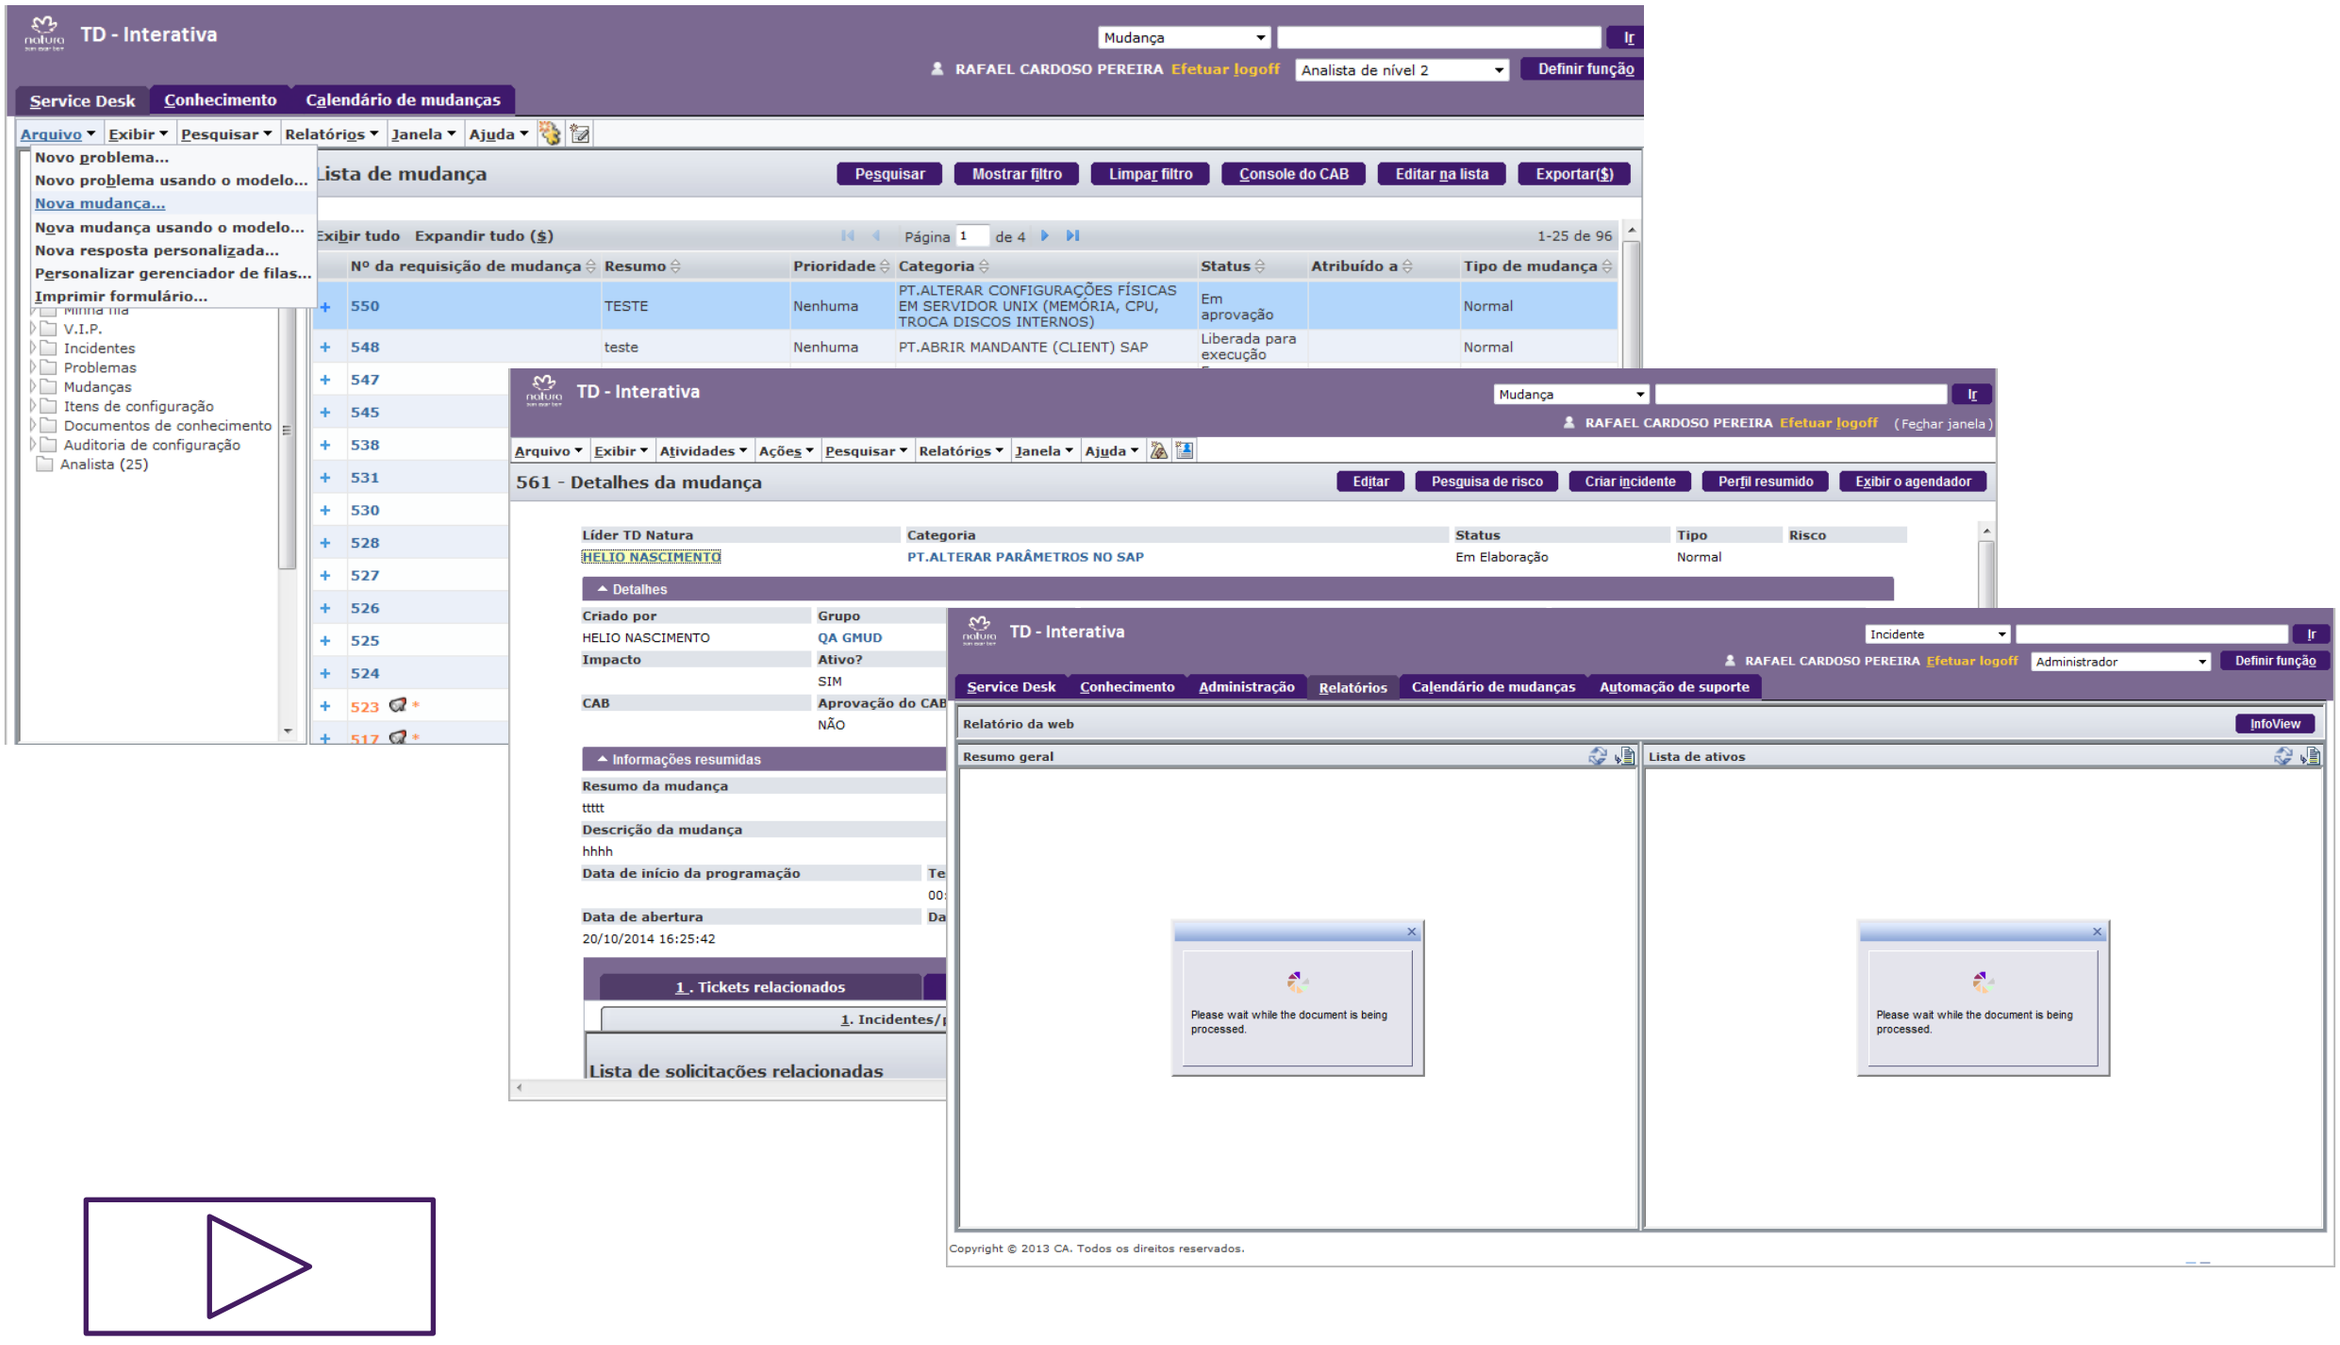
TD - Interativa
Mudança
Ir
RAFAEL CARDOSO PEREIRA Efetuar logoff
Analista de nível 2
Definir função
Service Desk
Conhecimento
Calendário de mudanças
Arquivo
Exibir
Pesquisar
Relatórios
Janela
Ajuda
Novo problema...
Novo problema usando o modelo...
Nova mudança...
Nova mudança usando o modelo...
Nova resposta personalizada...
Personalizar gerenciador de filas...
Imprimir formulário...
Minha fila
V.I.P.
Incidentes
Problemas
Mudanças
Itens de configuração
Documentos de conhecimento
Auditoria de configuração
Analista (25)
Lista de mudança
Pesquisar
Mostrar filtro
Limpar filtro
Console do CAB
Editar na lista
Exportar($)
Exibir tudo
Expandir tudo ($)
Página 1 de 4
1-25 de 96
Nº da requisição de mudança
Resumo
Prioridade
Categoria
Status
Atribuído a
Tipo de mudança
550 TESTE Nenhuma PT.ALTERAR CONFIGURAÇÕES FÍSICAS EM SERVIDOR UNIX (MEMÓRIA, CPU, TROCA DISCOS INTERNOS) Em aprovação Normal
548 teste Nenhuma PT.ABRIR MANDANTE (CLIENT) SAP Liberada para execução Normal
547
545
538
531
530
528
527
526
525
524
523
517
TD - Interativa
Mudança
Ir
RAFAEL CARDOSO PEREIRA Efetuar logoff (Fechar janela)
Arquivo
Exibir
Atividades
Ações
Pesquisar
Relatórios
Janela
Ajuda
561 - Detalhes da mudança
Editar
Pesquisa de risco
Criar incidente
Perfil resumido
Exibir o agendador
Líder TD Natura
Categoria
Status
Tipo
Risco
HELIO NASCIMENTO
PT.ALTERAR PARÂMETROS NO SAP
Em Elaboração
Normal
Detalhes
Criado por
HELIO NASCIMENTO
Grupo
QA GMUD
Impacto
Ativo?
SIM
CAB
Aprovação do CAB
NÃO
Informações resumidas
Resumo da mudança
ttttt
Descrição da mudança
hhhh
Data de início da programação
Data de abertura
20/10/2014 16:25:42
1. Tickets relacionados
1. Incidentes/
Lista de solicitações relacionadas
TD - Interativa
Incidente
Ir
RAFAEL CARDOSO PEREIRA Efetuar logoff
Administrador
Definir função
Service Desk
Conhecimento
Administração
Relatórios
Calendário de mudanças
Automação de suporte
Relatório da web
InfoView
Resumo geral
Lista de ativos
Please wait while the document is being processed.
Please wait while the document is being processed.
Copyright © 2013 CA. Todos os direitos reservados.

#atendimentoTD

natura
bem estar bem

Obrigada!
