Parada Programada

Gerenciamento de Mudanças

Versão 3.1

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
30/08/2007	1.0	- Descrição do Processo de Parada Programada	Thalita Begliomini - HP
30/08/2019	2.0	- Revisão dos papéis e responsabilidades - Alteração do modelo de envio de torpedos para a notificação do status da Parada Programada - Inclusão o modelo do template de comunicado corporativo - Revisão do timeline do processo	Marcus Marques
24/02/2010	2.1	Inclusão do processo de reforço de comunicação do calendário de parada programada aos stakeholders (item 8.2)	Marcus Marques
10/08/2011	2.2	Revisão dos Papéis e responsabilidades	Tamiris Silva
12/01/2015	3.0	Revisão do documento para adequação do processo utilizado atualmente e remoção de parceiros que não atendem mais a Natura.	Ana Paula Jiménez
26/05/2015	3.1	Exclusão de siglas de áreas (GOC e GTO) e atualização do item de Comunicado Corporativo.	Solange Dias

Índice

1. Introdução 4
2. Objetivo da parada 4
3. Benefícios 4
4. Papéis e Responsabilidades 4
5. Descrição do Processo 6
5.1. Execução e acompanhamento das mudanças 6
5.2. Alinhamento dos resultados 7
6. Prazo 7
7. Comunicação 7
7.1. Comunicado Corporativo 7
7.2. Comunicado ao stakeholders 7
7.3. Comunicado durante a janela de execução 7
8. Políticas 8
9. Anexos 11
10. Glossário 11

1. Introdução

O propósito da Parada Programada é reduzir o número de indisponibilidades dos sistemas para o Negócio, concentrando todas as mudanças críticas em ambiente produtivo em período pré-acordado, e garantir o nível apropriado de comunicação das mudanças com o cliente. O calendário proposto é validado pelas principais áreas de Negócio e divulgado anualmente pela Natura. O período da janela será um turno de fábrica, iniciando Sábado às 22:40h e encerrando Domingo às 6:40h (exceto para as paradas de horário de verão que começarão as 22h de sábado terminando às 06h do Domingo). Durante este período todos os Sistemas de TD ficarão indisponíveis.

2. Objetivo da parada

- Reduzir o número de solicitações de paradas ao negócio, concentrando as mudanças nas janelas planejadas;
- Utilizar as janelas para realizar as mudanças planejadas e rotineiras de qualquer componente de TD (Sistema ou Infra) de forma lógica e ordenada;
- Evoluir o processo de Gestão de Mudanças em TD, aumentando a qualidade e previsibilidade das alterações feitas em ambiente produtivo.

3. Benefícios

Os benefícios da Parada Programada são:

- Concentração das mudanças em período acordado;
- Redução dos impactos de indisponibilidade dos sistemas ao Negócio;
- Melhor gerenciamento do conflito entre as mudanças;
- Maior garantia e controle nas mudanças;
- Acompanhamento e monitoramento mais eficaz;
- Integração e sinergia das atividades entre as equipes;
- Redução dos custos com manutenções.

4. Papéis e Responsabilidades

Solicitante da mudança

- ❑ Identificar escopo e atividades da mudança;
- ❑ Preencher modelo definido para as propostas;
- ❑ Participar da reunião para eleger as mudanças;
- ❑ Submeter a SM de cada proposta sua aprovada na reunião;
- ❑ Acompanhar as SMs durante a Parada;
- ❑ Comunicar qualquer problema ou cancelamento de SM;
- ❑ Negociar prazos e indisponibilidades com o Negócio caso seja necessário ultrapassar a janela da parada.

Equipe de mudanças Natura

- ❑ Fazer a solicitação do comunicado interno sobre a Parada Programada, para garantir que os usuários chaves e áreas de Negócio sejam devidamente informados;
- ❑ Consolidar as propostas de mudanças que serão discutidas na reunião;
- ❑ Conduzir a reunião para eleger as mudanças;
- ❑ Enviar o cronograma de mudanças da parada;
- ❑ Validar o texto da mensagem com o andamento das mudanças durante a Parada;
- ❑ Participar da conferência para alinhamento dos resultados pós-parada;
- ❑ Ponto focal Natura para escalação de problemas relacionados à Parada (Cancelamento, incidente, etc);
- ❑ Escalar a GOC em caso de problemas ou incidentes críticos durante a Parada.

Provedores

- ❑ Enviar as propostas de mudanças no prazo estabelecido, para que sejam discutidas na reunião;
- ❑ Participar da reunião para eleger as mudanças da Parada;
- ❑ Fazer previamente o alinhamento das atividades com outros provedores;
- ❑ Comunicar qualquer problema ou cancelamento de SM;

- Acompanhar a execução das mudanças.

Executor

- Executar a solicitação de mudança dentro do prazo e escopo definidos dentro da janela da Parada;
- Comunicar qualquer problema ou cancelamento de SM.

5. Descrição do Processo

- A equipe de mudanças envia com antecedência o convite para a reunião de avaliação das propostas. Neste convite vai anexo o modelo de propostas que deverá ser preenchido e encaminhado até às 13h do dia da reunião.
- O solicitante envia para o Gestor de Mudanças as propostas para a Parada Programada no modelo que vai anexo ao convite.
- A equipe de mudanças envia pauta com as mudanças consolidadas que serão avaliadas na reunião;
- É realizada a reunião para eleger e priorizar as mudanças. Participa da reunião o gestor de mudanças, um representante de cada área de TD Natura e provedores;
- Após a reunião, a equipe de mudanças envia a minuta aos participantes;
- O Solicitante elabora a SM e submente para aprovação dos responsáveis e validação da GMUD (segundo o prazo de mudanças normais);
- A SM é liberada para execução;
- A equipe de mudanças envia o cronograma aos responsáveis de TD natura e provedores.

Notas:

1- As propostas de mudanças devem ser encaminhadas até às 13h do dia em que será realizada a reunião. Propostas encaminhadas depois deste horário não serão discutidas.
2- Em caso de mudança do escopo, a equipe de mudanças deve ser comunicada. Isto também se aplica caso a proposta de mudança não siga adiante.


5.1. Execução e acompanhamento das mudanças

A execução segue normalmente o fluxo do processo de mudanças. A comunicação do status das mudanças durante a parada é feita através do envio de mensagens via WhatsApp para as **áreas** de TD Natura e provedores.

5.2. Alinhamento dos resultados

É feito um alinhamento dos resultados ao término da Parada antes da última mensagem. O detalhamento deste resultado é discutido na reunião Pós Parada.

6. Prazo

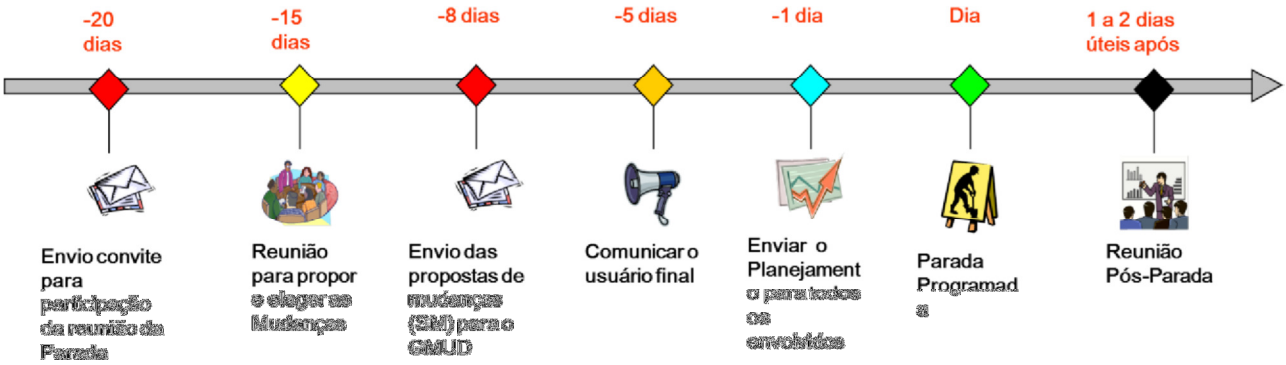

7. Comunicação

7.1. Comunicado Corporativo

A comunicação corporativa tem o objetivo de informar todos os usuários chaves e as áreas de Negócio da Companhia sobre a Parada Programada, apesar de a mesma já ter sido previamente acordada. A comunicação é disponibilizada aos usuários por e-mail, intranet e comunicação no portal de Força de Vendas.

Para que este comunicado seja feito, é necessário que a equipe de Mudanças da Natura solicite para a área de comunicação interna com pelo menos 7 dias (5 dias úteis) de antecedência da data planejada para envio.

7.2. Comunicado ao stakeholders

Mensalmente, o gerente da DI e DA participará da reunião da GGTD para apresentar o calendário da Parada Programada aos stakeholders, com o propósito de reforçar a comunicação do processo e as datas previstas para as manutenções do mês seguinte ao da realização da reunião do fórum.

7.3. Comunicado durante a janela de execução

Para facilitar e padronizar a comunicação, serão enviadas mensagens de WhatsApp ao celular dos responsáveis de TD Natura e Provedores para informar os status das mudanças conforme o quadro abaixo:

Parada Programada – ST [HH]

Aguardando Execução: [XX]
Em Execução: [XX]

Finalizadas
Com Sucesso: [XX]
Sem Sucesso: [XX]
Com Aviso: [XX]
Canceladas: [XX]

Onde:
[HH]: Horário de envio do Status (00h, 03h, 05h e 06:40h)
[HH]: Quantidade de mudanças com o respectivo resultado

Procedimento:

- Os check-points de acompanhamento da Parada Programada serão feitos com a antecedência necessária para que as mensagens sejam enviadas às 00h, 03h, 05h e 06:40h através de conferência telefônica. Nesta conferência participam os líderes das mudanças e o membro da equipe de mudanças GMUD.

- Uma vez alinhado os pontos referentes às mudanças, o gestor de mudanças Natura envia a mensagem de status da Parada Programada seguindo o modelo definido;

- Se houver problema ou incidente crítico com alguma mudança durante a janela de execução, será enviada uma mensagem a parte com texto a ser definido;

- Se alguma mudança for cancelada na Parada Programada, será enviada uma mensagem a parte comunicando a todos;

- Havendo quaisquer desvios durante a execução das mudanças, o analista deve acionar imediatamente o coordenador de Mudanças para escalar o tema com os devidos responsáveis para tomada de decisão e análise de impacto/risco.

8. Políticas

- Período acordado para a Parada Programada

- O período acordado com as áreas de Negócio da Natura para a Parada tem início às 22:40h de Sábado e término às 06:40h de Domingo (um turno de fábrica) conforme calendário anual divulgado;
- As solicitações de mudança que necessitem ser antecipadas ou excederem o horário definido devem ser negociadas diretamente com a GRP e os grupos GRPs devem constar como aprovadores da SM.

- Tipo de mudança da Parada Programada
  - Segundo o prazo definido, todas as mudanças da Parada deverão ser do tipo Normal. Qualquer exceção deverá ser verificada com a equipe de mudanças.

- Mudanças emergenciais e não planejadas
  - Excepcionalmente, se houver a necessidade de abrir uma solicitação de mudança emergencial para corrigir um incidente ou uma SM não planejada devido a um evento não esperado (no caso de projetos e evolutivas), o solicitante deverá validar se existe conflito entre as demais mudanças já aprovadas para execução na janela, e caso não haja, deverá solicitar a aprovação da gerência GPI.
  - Obtendo a aprovação da GPI e dos demais solicitantes que tiveram aprovação de propostas, um e-mail deverá ser encaminhado a equipe GMUD
    (gmud@natura.net) confirmando tal alinhamento;
  - Na abertura da SM, o e-mail de aprovação do Gerente concordando com a execução dentro da parada deverá estar anexo.

- Identificação de uma mudança da Parada Programada
  - A mudança da parada é identificada pelo título do formulário de solicitação. O título deve seguir o padrão: [PARADA PROGRAMADA – "Breve descrição da demanda"]

- Prazo das mudanças
  - As solicitações de mudança para a Parada devem seguir o Prazo descrito no processo de mudanças normais.

- Envio das propostas de mudanças
  - As propostas de mudanças devem ser enviadas até às 13h do dia em que será realizada a reunião. As propostas que não forem enviadas no prazo, não serão aceitas.

- Priorização das mudanças

  - Todas as propostas de mudança que possam ter conflito são priorizadas no fórum da reunião. No final da reunião fica definida a lista das mudanças aprovadas ou não para execução. Se necessário, uma proposta aprovada pode ser posteriormente canceladas.
  - Durante a janela de manutenção da Parada (das 22:40h do sábado às 06:40h do domingo) só serão executadas as mudanças que foram elegidas e aprovadas na reunião. Qualquer outra mudança deverá ser executada fora deste horário.

- Aprovadores das mudanças
  - Conforme mencionado no item "Período acordado para a Parada Programada" se houver a necessidade de antecipar ou ultrapassar o período definido, se deve incluir como aprovador o GRP responsável do sistema ou infraestrutura afetada.

- Cancelamento da Parada Programada
  - Caso o Negócio necessite utilizar o período da Parada devido a um incidente ou demanda crítica, o cancelamento deve ser solicitado com no mínimo 48h de antecedência ao Diretor de TD.

- Cancelamento de mudança prevista para a Parada Programada
  - Se uma mudança prevista para a parada programada for cancelada durante a parada será enviado um torpedo a parte, com um texto a ser definido, comunicando a todos do cancelamento.

9. Anexos

Sempre que houver interesse na utilização da janela da Parada Programada, o modelo "Template Propostas para Parada Programada" deve ser preenchido e deverá ser encaminhado para o e-mail gmud@natura.net até às 13h do dia da reunião, ou de acordo com o informado pelo time de Gestão de Mudanças mencionado no e-mail do convite.

10. Glossário

GGTD – Grupo de Gestores da Tecnologia Digital

GMUD – Gerência de Mudanças

TD – Tecnologia Digital

SM – Solicitação de Mudança

GRP – Gerencia de Relacionamento com Parceiros

VPTD – Vice Presidência de Tecnologia Digital

GPI – Gerência de Processos e Indicadores
