Processo de Gerenciamento de Mudanças de TI

Documento de Especificação (Procedimento)

Ref. COBIT® – AI6 e AI7

Índice

1. OBJETIVO 3
2. ESCOPO DO PROCESSO 3
3. OBJETIVOS DE CONTROLE COBIT 4.1 3
4. CONCEITOS 5
5. DIRETRIZES E DEFINIÇÕES DO PROCESSO 6
6. INTERFACE COM OUTROS PROCESSOS 10
7. FLUXOGRAMA 11
8. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO FLUXOGRAMA 11
9. MATRIZ RACI 14
10. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 14
11. INDICADORES 15
12. DOCUMENTOS DE APOIO 15
13. CONTROLE DE VERSÃO 16

1. Objetivo

Este processo tem como objetivo garantir que todas as Mudanças de TI sejam registradas, avaliadas, autorizadas, priorizadas, planejadas, testadas, implementadas, documentadas e revisadas de maneira padronizada e controlada, reduzindo os impactos e riscos aos negócios da Smiles.

2. Escopo do Processo

O escopo do processo de Gerenciamento de Mudanças de TI da Smiles cobre qualquer alteração em Serviços de TI em ambientes de Produção.

3. Objetivos de Controle COBIT 4.1

Processo / Objetivos de Controle	Situação	Análise sobre o processo atual
AI6 - Gerenciar Mudanças		
AI6.1 - Padrões e Procedimentos de Mudança Estabelecer procedimentos formais de gerenciamento de mudanças para lidar de modo padronizado com todas as solicitações de mudança em aplicações, procedimentos, processos, parâmetros de sistema, parâmetros de serviço e plataformas subjacentes (inclusive solicitações de manutenção e reparo).	**Contemplado**	Procedimento formal para gerenciar Mudanças estabelecido por este processo.
AI6.2 - Avaliação de Impacto, Priorização e Autorização Avaliar todas as solicitações de mudança de modo estruturado com relação a impactos no sistema operacional e na respectiva funcionalidade. Assegurar que todas as mudanças sejam categorizadas, priorizadas e autorizadas.	**Contemplado**	Procedimento formal para gerenciar Mudanças estabelecido por este processo prevê avaliação de impactos e respectivas aprovações (autorizações).
AI6.3 - Mudanças de Emergência Estabelecer um processo para definição, solicitação, testes, documentação, avaliação e autorização de mudanças de emergência que não sigam o processo de mudança estabelecido.	**Contemplado**	Processo prevê uma categoria (Emergencial) e respectivo rito de avaliação e aprovação diferenciado para situações de emergências.
AI6.4 - Acompanhamento de Status e Relatórios de Mudanças Estabelecer um sistema de acompanhamento e relatórios de mudanças para documentar mudanças rejeitadas, comunicar o status de mudanças aprovadas e em andamento e executar mudanças. Garantir que as mudanças autorizadas sejam implementadas conforme planejado.	**Contemplado**	Processo prevê elaboração de indicadores de desempenho e relatórios de acompanhamento diretamente na ferramenta JIRA.
AI6.5 - Finalização da Mudança e Documentação Atualizar a documentação os procedimentos do sistema e de usuários sempre que forem implementadas mudanças no sistema.	**Contemplado**	Processo prevê uma etapa de revisão e fechamento para todas as Mudanças aprovadas e executadas.

Processo / Objetivos de Controle	Situação	Análise sobre o processo atual
AI7 - Instalar e Homologar Soluções e Mudanças		
AI 7.1 – Treinamento Atualizar a documentação os procedimentos do sistema e de usuários sempre que forem implementadas mudanças no sistema.	**Não contemplado**	Controle não contemplado por este processo, em face ao seu objetivo e escopo.
AI 7.2 - Plano de Teste Estabelecer um plano de teste baseado nos padrões organizacionais que definem papéis, responsabilidades e critérios de sucesso de entrada e saída. Assegurar que o plano seja aprovado pelas partes relevantes.	**Contemplado**	Processo prevê a avaliação da realização e das respectivas evidências de testes.
AI7.3 Plano de Implementação Estabelecer um plano de implementação e de retorno à configuração anterior. Obter aprovação de todas as partes relevantes.	**Contemplado**	Processo prevê a documentação do Plano de Trabalho e Plano de Retorno (Rollback) para todas as Mudanças.
AI7.4 Ambiente de Testes Estabelecer um ambiente de testes seguro que reflita o ambiente de operações planejado no que diz respeito a segurança, controles internos, práticas operacionais, exigências de qualidade e confidencialidade e cargas de trabalho.	**Não contemplado**	Controle não contemplado por este processo, em face ao seu objetivo e escopo.
AI7.5 Conversão de Dados e Sistemas Planejar a conversão de dados e a migração da infraestrutura como parte dos métodos de desenvolvimento da organização, incluindo trilhas de auditoria, procedimentos de retorno à situação anterior e de recuperação de falhas.	**Não contemplado**	Controle não contemplado por este processo, em face ao seu objetivo e escopo.
AI7.6 Teste de Mudanças Assegurar que as mudanças sejam testadas de maneira independente e de acordo com o plano de testes definido antes da migração para o ambiente de produção.	**Contemplado**	Processo prevê a avaliação da realização e das respectivas evidências de testes.
AI7.7 Teste de Aceitação Final Assegurar que o gerenciamento do departamento usuário e da área de TI avalie o resultado do processo de testes como determinado no plano de testes. Corrigir erros significativos identificados no processo de testes, executar todos os testes listados no plano de testes, bem como qualquer teste de regressão necessário. Após a avaliação, aprovar a promoção para a produção.	**Contemplado**	Processo prevê a avaliação da realização e das respectivas evidências de testes.
AI7.8 Promoção para a Produção Após a conclusão dos testes, controlar a transferência dos sistemas alterados para operação, de acordo com o plano de implementação. Obter a aprovação das partes interessadas, como usuários, proprietário do sistema e gerência operacional. Quando apropriado, executar o sistema em paralelo com o sistema antigo durante um período e comparar comportamento/resultados.	**Contemplado**	Processo prevê a documentação do Plano de Trabalho e Plano de Retorno (Rollback) para todas as Mudanças.
AI7.9 Revisão pós-implementação Estabelecer procedimentos em linha com o gerenciamento de mudanças organizacionais para garantir a realização da revisão pós implementação, conforme definido no plano de implementação.	**Contemplado**	Processo prevê uma etapa de revisão e fechamento para todas as Mudanças aprovadas e executadas.

4. Conceitos

Os principais conceitos referentes ao processo de Gerenciamento de Mudanças de TI são:

- **Calendário de Mudanças:** equivale a um calendário que demonstra, de forma visual, a lista das Mudanças programadas e suas respectivas datas e horários de execução, de forma a permitir aos responsáveis pelo processo evitar eventuais conflitos de agendamento e sobreposição de atividades. Por outro lado, o calendário também permite que seja considerado o agrupamento de mudanças possam ser implementadas paralelamente, sem conflitos nos serviços de TI afetados.

- **Categoria da Mudança:** equivale a uma classificação referente ao tipo da Mudança, diferenciando fluxos específicos de aprovações.

- **Comitê Consultivo de Mudanças (CAB):** comitê formado para auxiliar os responsáveis pelo processo de Gerenciamento de Mudanças de TI na deliberação das Mudanças de categoria "Normal".

- **Comitê Consultivo de Mudanças Emergencial (ECAB):** comitê formado para auxiliar os responsáveis pelo processo de Gerenciamento de Mudanças de TI na deliberação das Mudanças de categoria "Emergencial".

- **Executores:** papel/função no processo, relativo aos responsáveis pela efetiva execução das atividades das Mudanças. Executores podem ser colaboradores internos ou prestadores de serviços terceirizados (fornecedores externos).

- **Mudança:** uma Mudança refere-se a qualquer adição, alteração ou remoção de um Serviço de TI ou componente de tecnologia e sua respectiva documentação associada.

- **Origem da Mudança:** equivalem às situações que originaram as necessidades de Mudanças.

- **Período de** Freezing**:** equivalem aos períodos de congelamento (freezing) onde não se pode executar Mudanças, estando normalmente associados aos períodos críticos para as operações dos negócios. O "congelamento" de Mudanças tem por objetivo manter a estabilidade operacional dos Serviços TI. Apesar disso, Mudanças Emergenciais podem ser aprovadas em caráter excepcional.

- Request for Change (RFC)**:** equivale ao pedido formal de uma **Mudança**. Uma Request for Change (RFC) inclui o registro detalhado da Mudança solicitada.

- **Risco:** representa a identificação do nível de risco envolvido na Mudança. Trata-se da resultante entre a probabilidade de concretização e os impactos negativos decorrentes da execução malsucedida de uma Mudança.

- Rollback**:** também conhecido como **Plano de Retorno**, equivale ao planejamento de atividades a serem realizadas, em caso de execução malsucedida da Mudança (execução que gere impactos ao negócio, tal como indisponibilidades não planejadas). Deve incluir informações detalhadas das atividades a serem executadas para retornar o ambiente/serviço ao seu estado inicial, bem como seus respectivos executores e dependências críticas.

- **Plano de Trabalho:** também conhecido como **Plano de Execução**, equivale ao planejamento que deve ser elaborado e descreve todo o conjunto de atividades necessárias para a realização da Mudança. Deve incluir informações detalhadas das atividades a serem executadas, bem como seus respectivos executores, dependências críticas e horários/prazos de execução.

- **Solicitante da Mudança**: refere-se a um contato da área de negócio ou da área de TI, o qual esteja demandando efetivamente a Mudança. Equivale ao principal interessado, na empresa, pelo resultado bem-sucedido da implantação da Mudança.

5. Diretrizes e Definições do Processo

O processo de Gerenciamento de Mudanças de TI possui as seguintes diretrizes e definições:

- **Ferramenta**: a ferramenta oficial para registro das Mudanças e demais tratativas deste processo é o Atlassian JIRA.

- **Definição única de Processo:** haverá apenas um único processo de Gerenciamento de Mudanças de TI para a Smiles. O processo de Gerenciamento de Mudanças deve garantir que as Mudanças sejam avaliadas, testadas, autorizadas, e, após suas implementações, revisadas e fechadas.

- **Registro de Mudança**: o processo de Gerenciamento de Mudanças de TI define um conjunto mínimo de informações que devem ser registradas em cada Mudança, a saber:
    - Um ID único (identificação única) para fins de controle e rastreabilidade dos registros;
    - Um Solicitante e respectiva informação de contato (o solicitante poderá ser um colaborador das áreas de negócios ou da própria área de TI);
    - Um descritivo de seu Objetivo principal, que embasa a necessidade de sua implantação/execução;
    - Um descritivo dos Impactos que podem ser gerados caso a mesma não seja implementada / executada;
    - A Origem da Mudança;
    - O Plano de Trabalho das atividades a serem executadas e seus respectivos executores;
    - Informações de Testes efetuados (caso aplicáveis) e demais aspectos relacionados que poderão ser exigidos pelos responsáveis pelo Processo de Gerenciamento de Mudanças de TI para fins de melhor entendimento e deliberação da Mudança.

- **Origem:** toda Mudança deverá ter uma "Origem" informada. As opções de origem definidas para o processo são: Projeto; Melhoria; Problema; Promoção, Incidente e Solicitação.

- **Categoria:** toda Mudança deverá ter uma Categoria informada. As opções de categorias definidas para o processo são:
    - Emergencial: deve ser considerada Mudança Emergencial aquela que não foi emitida no prazo normal para ser deliberada pelo Comitê Consultivo de Mudanças (CAB). Também pode ser considerada Mudança Emergencial uma situação, relacionada ou não a um Incidente, em que a data de execução seja específica e anteceda o próximo Comitê Consultivo de Mudanças (CAB), de forma a evitar ou

mitigar eventuais impactos aos negócios. Mudanças Emergenciais devem ser deliberadas pelo Comitê Consultivo de Mudanças Emergencial (ECAB).

- Normal: deve ser considerada Mudança Normal toda necessidade de execução/implantação que seja realizada de forma planejada, respeitando os prazos e o ciclo de deliberações do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB). Toda Mudança Normal deve ser deliberada neste respectivo comitê. A necessidade de planejamento das Mudanças Normais se deve ao seu grau incerto de complexidade e potenciais riscos de execução malsucedida que possa impactar negativamente os negócios da Smiles.
- Informativa: deve ser considerada Mudança Informativa toda necessidade de reparos imediatos nos Serviços de TI em situações de alto impacto negativo às operações dos negócios. Nestas situações, a Mudança Informativa pode ser registrada após a sua efetiva resolução, desde que informado e/ou associado o respectivo Incidente de Alto Impacto ("Blocker"). O processo também prevê outra situação que pode ser considerada Mudança Informativa, onde a Smiles apenas possui ciência de uma Mudança que esteja sendo demandada e executada por um fornecedor externo nos ambientes de Produção. Nesta situação, a Mudança deve ser registrada como informativa pois a Smiles não possui autonomia de aprovação/reprovação da mesma.
- Pré-Aprovada: podem ser consideradas Mudanças Pré-Aprovadas, aquelas que apresentam baixo risco, sejam frequentes e sigam procedimentos ou instruções de trabalho padronizados. Apesar disso, devem ser avaliadas pelos Responsáveis pelo processo de Gerenciamento de Mudanças de TI, sendo dispensadas de deliberação em comitês. Exemplos de situações a serem consideradas como Mudanças Pré-Aprovadas, mas sem se limitar as mesmas:
  - Alteração de Promoção;
  - Atualização do software antivírus nos servidores;
  - Atualização de patch de correção nos servidores.

- **Risco:** toda Mudança deverá ter seu grau de risco informado. A classificação do risco se baseia na relação entre os potenciais impactos e a probabilidade de ocorrer algum problema que afete a estabilidade dos serviços de TI que são alvo da Mudança. Em termos de risco, o processo define os seguintes níveis:
  - 1 – Crítico: probabilidade muito alta de algum problema ocorrer.
  - 2 – Alto: probabilidade alta de algum problema ocorrer.
  - 3 – Médio: probabilidade média de algum problema ocorrer.
  - 4 – Baixo: probabilidade baixa de algum problema ocorrer.

- **Impacto nos Serviços Afetados**: toda Mudança deverá ter seu grau de impacto informado com base nos Serviços e Sistemas de TI afetados. O impacto indica o grau de exposição negativa de falhas nos Serviços de TI. Desta forma, o processo define os seguintes níveis correlacionado com os principais Serviços e Sistemas de TI:
  - Serviços e Sistemas de TI - **Impacto Crítico**: Gateway de Pagamento, Gateway Smiles, Integrador de Sites, Navitaire, Clube Smiles, Compras de Milhas, Recorrência de Milhas, Adesão do Clube Smiles, Amadeus, Acúmulo online, Aracs, Siebel, Antifraude, UD, Smiles Contábil (final do mês).
  - Serviços e Sistemas de TI - **Impacto Alto**: Shopping Smiles, Transferência de Milhas, BI.

- Serviços e Sistemas de TI - **Impacto Médio**: Reativação do Clube Smiles, E-mail, Internet, Telefonia, Link do Escritório Smiles.
- Serviços e Sistemas de TI - **Impacto Baixo**: Smiles Contábil (exceto final do mês), B2E, Demais Serviços e Sistemas de TI.

- **Plano de Trabalho:** todas as Mudanças, de qualquer categoria, devem possuir um Plano de Trabalho que descreve a relação de atividades a serem executadas e seus respectivos executores.

- **Plano de Retorno (**Rollback**):** todas as Mudanças, de qualquer categoria, devem possuir um Plano de Retorno (Rollback). Caso não seja possível elaborar um Plano de Retorno por alguma razão, técnica ou não, a Mudança deverá conter uma justificativa para isso.

- **Calendário de Mudanças:** um Calendário de Mudanças implementado na ferramenta Atlassian Confluence, para consultas pelos envolvidos e pela Equipe de Gerenciamento de Mudanças.

- **Período de** Freezing**:** a Equipe de Gerenciamento de Mudanças deverá comunicar, sob demanda, a todos os colaboradores da Smiles os períodos de Freezing, conforme as necessidades e respectivos períodos críticos das operações de negócios da Smiles.

- **Comitê Consultivo de Mudanças (CAB):**
  - O Comitê Consultivo de Mudanças (CAB) deve ser realizado semanalmente, todas as quartas-feiras.
    - Em caso de feriado, deve ser realizado no próximo dia útil.
  - O Comitê Consultivo de Mudanças (CAB) deve deliberar sobre todas as Mudanças de categoria Normal.
    - Toda Mudança de categoria Normal deve ser submetida até as 23h59 da segunda-feira imediatamente anterior à realização do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB), estando devidamente preenchida com todo o planejamento de atividades, responsáveis, duração, Plano de Retorno (Rollback) e evidências dos testes realizados.
    - Caso seja submetida após o prazo citado, a respectiva Mudança Normal será considerada apenas no próximo ciclo semanal (próxima reunião do comitê).
  - São **Membros Fixos** do CAB:
    - Analista de Segurança da Informação;
    - Analista de Fraude;
    - Arquiteto de Sistemas;
    - Coordenador de Operações de TI;
    - Especialista em Infraestrutura;
    - Gerente de Governança de TI;
    - Equipe de Gerenciamento de Mudanças.
  - Os Membros Fixos do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB) devem participar de todas as reuniões. Em caso de ausência, o Membro Fixo deve delegar um representante.

- O Gerente de Governança de TI poderá reportar mensalmente ao Diretor de Tecnologia da Informação as ausências recorrentes e/ou não justificadas dos Membros Fixos do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB).

- São **Membros Opcionais** do CAB:
  - Diretor de Tecnologia da Informação (CIO);
  - Gerentes de TI;
  - Gerentes de Projeto de TI;
  - Coordenador da Central de Atendimento Smiles;
  - Áreas de Negócio Smiles;
  - Demais Áreas Smiles;
  - Fornecedor Externo.
- A sequência da apresentação e deliberação das Mudanças será definida pela ordem em que as mesmas foram submetidas ao Comitê Consultivo de Mudanças (CAB).
- A Equipe de Gerenciamento de Mudanças deve elaborar e divulgar previamente, até 12h00 (meio-dia) da respectiva data de realização do comitê, uma Pauta contendo a lista de Mudanças a serem deliberadas durante a reunião. O público-alvo para recepção desta pauta são todos os membros fixos do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB).
- Em caso de ausência do Solicitante para apresentar sua respectiva Mudança, a mesma será automaticamente reprovada.
- O Comitê Consultivo de Mudanças (CAB) deve aprovar somente as Mudanças que estejam devidamente preenchidas (todos os campos preenchidos, sem exceção), incluindo o planejamento das atividades, todas as evidências necessárias, apresentem a concordância dos envolvidos e, por fim, caso nenhum membro do Comitê se oponha durante a reunião.
- As decisões do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB) devem ser consideradas soberanas sobre outras aprovações ou concordâncias evidenciadas nos registros das Mudanças.
- Ao término de cada reunião do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB), a Equipe de Gerenciamento de Mudanças deve elaborar uma Ata incluindo o respectivo controle de presença.

- **Comitê Consultivo de Mudanças Emergencial (ECAB):**
  - O Comitê Consultivo de Mudanças Emergencial (ECAB) será realizado “sob demanda”.
  - O Comitê Consultivo de Mudanças Emergencial (ECAB) deve deliberar sobre todas as Mudanças de categoria Emergencial.
  - São **Membros do ECAB**:
    - Diretor de Tecnologia da Informação (CIO); Gerente de Governança de TI; Gerente Solicitante (com o objetivo de apresentar/defender a Mudança); Coordenador de Operações de TI; Equipe de Gerenciamento de Mudanças.
  - Em caso de ausência do Solicitante para apresentar sua respectiva Mudança, a mesma será automaticamente reprovada.

- As decisões do Comitê Consultivo de Mudanças Emergencial (ECAB) serão registradas diretamente na Mudança, dispensando a elaboração de Ata. Assim sendo, valem as aprovações contidas no registro da Mudança.

- **Implementação da Mudança:** toda Mudança aprovada pode ter sua implementação acompanhada pela Equipe de Gerenciamento de Mudanças de TI, a seu exclusivo critério.

- **Execução da Mudança:** as áreas executoras somente poderão executar uma Mudança depois que a mesma tenha sido formalmente aprovada. Não existe nenhuma exceção para esta definição.

- **Revisão Pós-Implantação (RPI) e Fechamento da Mudança:** todas as Mudanças devem ser revisadas após sua implementação de forma a avaliar se atingiram efetivamente seus objetivos. Depois disso, devem fechadas com as opções: Fechada Com Sucesso ou Fechada Sem Sucesso.

6. Interface com outros processos

- **Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação**
  - Para resolver uma vulnerabilidade técnica descrita em um Incidente de Segurança da Informação pode ser necessária a abertura de uma Mudança.
  - A equipe de Segurança da Informação possui representação fixa no Comitê Consultivo de Mudanças (CAB), com a finalidade de deliberar sobre as Mudanças avaliando sua aderência às normas e diretrizes da área, de forma a prevenir potenciais Eventos/Incidentes de Segurança da Informação.


- **Gerenciamento de Incidentes de TI**
  - Para resolver um Incidente pode ser necessária a abertura de uma Mudança, ainda que em caráter informativo (registro da Mudança após a resolução do Incidente crítico “Blocker”).

- **Gerenciamento de Problemas**
  - Para resolver um Problema pode ser necessária a abertura de uma Mudança.

- **Gerenciamento do Nível de Serviço**
  - O Gerenciamento do Nível de Serviço contribui com o Gerenciamento de Mudanças na avaliação dos impactos das Mudanças, através da identificação dos Serviços/Sistemas Críticos de TI e seus respectivos fornecedores.

- **Gestão de Demandas**
  - A implantação de novos Projetos ou Melhorias através da Gestão de Demandas deve ser realizada através da abertura de uma Mudança.

7. Fluxograma

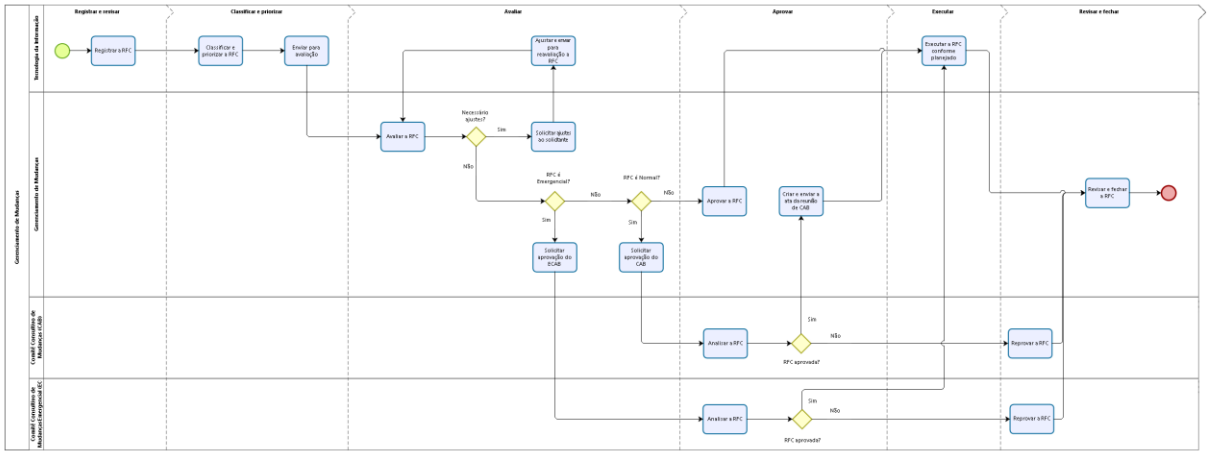

8. Descrição das Atividades do Fluxograma

Passo	Atividade	Executor	Descrição	Passo Seguinte
01	Registra RFC	Solicitante	Nesta atividade, o Solicitante realiza o registro da Mudança (RFC). Ao identificar necessidade de inclusão, alteração ou remoção de Serviço de TI ou componente de tecnologia, o Solicitante deve registrar uma Mudança (RFC) na ferramenta JIRA, respeitando e incluindo todas as informações necessárias para que a mesma possa ser avaliada, conforme as regras e definições do processo.	02
02	Classificar e priorizar a RFC	Solicitante	Nesta atividade, o Solicitante classifica e prioriza a sua Mudança (RFC). Após o preenchimento inicial do Registro de Mudança e ainda utilizando a ferramenta JIRA, o Solicitante deve selecionar a Categoria mais adequada a ser submetida, elegendo assim seu nível desejado de controle, prioridade e respectivo fluxo de aprovação.	03
03	Enviar para avaliação	Solicitante	Nesta atividade, o Solicitante envia a Mudança para avaliação. Após finalizar o preenchimento do Registro de Mudança na ferramenta JIRA, o Solicitante seleciona a opção “Enviar Análise GM” com a finalidade de submetê-la para avaliação pelo Gestor de Mudanças.	04
04	Avaliar a RFC	Gestor de Mudanças	Após fase de documentação da RFC pelo solicitante, a equipe de Gerenciamento de Mudanças deve validar se todas as informações estão documentadas de forma objetiva e clara, permitindo boa compreensão da solução pela equipe de desenvolvimento. Gestão de mudança deve também validar nesta fase a categorização e classificação da RFC podendo solicitar ajustes ao solicitante ou ajustando por si classificações e categorizações. - Solicitar ajustes ao solicitante: caso seja necessário solicitar ajustes, o responsável pelo processo de Gerenciamento de Mudanças deve	05,06

Passo	Atividade	Executor	Descrição	Passo Seguinte
			solicitar ajustes da Request for Change (RFC) para o solicitante. (Atividade 05) - Verificar a categoria da Request for Change (RFC): caso não seja necessário solicitar ajustes, o responsável pelo processo de Gerenciamento de Mudanças deve validar qual é a categoria da Request for Change (RFC). (Atividade 07)	
05	Documenta ajustes solicitados	Solicitante	Ao receber informativo solicitando ajustes necessários para sequência da RFC, o Solicitante documenta as informações e reenvia Mudança para avaliação do Gestor de Mudanças	04
06	Avalia Categoria da RFC	Gestor de Mudanças	Ao avaliar a RFC e concluir que todas as informações necessárias estão documentadas corretamente, Gestão de Mudanças avalia categorização solicitando aprovação para o CAB ou ECAB na opção "Solicitar Aprovação CAB", "Solicitar Aprovação ECAB" ou Direciona RFC para execução em casos de Categorias Informativa ou Pré-Aprovadas. - ECAB: Categoria "Emergencial": (Atividade 07) - CAB: Categoria "Normal": (Atividade 09) - Não precisa de aprovação Categoria "Informativa e Pré-Aprovada" (Atividade 10)	07,09,10
07	Aprova RFC Emergencial	ECAB	Integrantes do ECAB devem avaliar todos os critérios e registro da RFC para decidir se o planejamento documentado está correto e se pode ser implementada. - Aprova RFC: (Atividade 10) Reprova RFC: (Atividade 08)	08,11
08	Reprova RFC	ECAB	Caso a RFC tenha sido reprovada, o responsável pela reprovação documenta o Motivo pela Reprovação Cancelando o planejamento documentado.	-
09	Aprova RFC Normal	CAB	Integrantes do CAB devem avaliar todos os critérios e registro da RFC para decidir se o planejamento documentado está correto e se pode ser implementada. - Aprova RFC: Atividade 10 - Reprova RFC: (Atividade 08)	10,08
10	Executar a RFC conforme planejado	Área executora	Após ser aprovada pelo CAB ou ECAB, a RFC é direcionada para a equipe responsável pela implantação estudar a documentação e se preparar para executar o plano documentado na data planejada mitigando erros de execução e conflitos de implantação. Na data e horário planejado a mudança é executada pelo analista responsável pela implantação da RFC.	11

Passo	Atividade	Executor	Descrição	Passo Seguinte
11	Revisa RFC	Área Executora	Ao implementar a solução em ambiente produtivo, a área executora deve observar o comportamento de todos os serviços para identificar possíveis falhas causadas pelo novo serviço implantado, documentado a revisão pós-implementação para que os erros cometidos sejam registrados e evitados em futuras implementações.	12
12	Fecha RFC	Gestão de Mudanças	Assim que a equipe executora documenta os testes na RFC, o registro do Jira é direcionado para a equipe de Gestão de Mudanças revisar a documentação e encerrar a RFC.	-

9. Matriz RACI

RACI Smiles	Gerenciamento de Mudanças R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed Responsável Aprovador Consultado Informado	CIO	Tecnologia da Informação	Gerenciamento de Mudanças	CAB	ECAB
Diagrama	Atividades					
	Responsável pelo sucesso do processo	**A**				
01	Registrar a RFC		R	C, I		
02	Classificar e priorizar a RFC		R	C, I		
03	Enviar para avaliação		R	C, I		
04	Avaliar a RFC		C	R		
05	Documenta ajustes solicitados		R	C, I		
06	Avalia Categoria da RFC			R	I	I
07	Aprova RFC Emergencial		I	R, C		R, C
08	Reprovar a RFC		I	R, C	R, C	R, C
09	Aprova RFC Normal		I	R, C	R, C	
10	Executar a RFC conforme planejado		R	I		
11	Revisa RFC		R	I		
12	Fecha RFC		C	R		

10. Papéis e Responsabilidades

- **Solicitante da Mudança**
  - Registrar a Mudança incluindo todas as informações necessárias conforme regras e definições do processo.
  - Participar do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB) e Comitê Consultivo de Mudanças Emergenciais (ECAB) com a finalidade de apresentar as Mudanças submetidas pelo mesmo e também para responder eventuais questionamentos dos membros dos respectivos comitês.
- **Executor da Mudança**
  - Executar as atividades das Mudanças aprovadas, de forma alinhada com o detalhamento e especificações presentes no Plano de Trabalho das mesmas.
  - Caso necessário, executar as atividades do Plano de Retorno (Rollback) de forma alinhada com o detalhamento e especificações presentes no mesmo.
- **Equipe de Gerenciamento de Mudanças (Gestor de Mudanças)**
  - Garantir que o processo seja executado segundo as diretrizes estabelecidas e operacionalizado com eficiência e eficácia.
  - Avaliar todas as Mudanças, categorizá-las corretamente e analisar os riscos e impactos aos negócios da Smiles.

- Convocar os membros, elaborar e enviar as Pautas e as Atas de Reunião dos Comitês Consultivos de Mudanças (CAB).
- Analisar e deliberar todas as Mudanças das categorias “Pré-Aprovada” e “Informativa”.
- Acompanhar a deliberação das Mudanças de categoria “Emergencial”.
- Conforme necessidade, enviar comunicados de indisponibilidade para os clientes afetados.
- Revisar e Fechar todas as Mudanças após a sua execução.

- **Membros do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB)**
  - Questionar ao Solicitante toda e qualquer dúvida sobre a Mudança a ser deliberada.
  - Apontar toda e qualquer inconformidade com o seu tema, especialização ou área de atuação, bem como qualquer impacto ou risco potencial não previstos na Mudança.
  - Avaliar todas as Mudanças de categoria “Normal” e deliberar sobre sua aprovação ou reprovação.

- **Membros do Comitê Consultivo de Mudanças Emergenciais (ECAB):**
  - Questionar ao Solicitante toda e qualquer dúvida sobre a Mudança a ser deliberada.
  - Questionar ao Solicitante a efetiva necessidade de submeter emergencialmente a Mudança, ao invés de aguardar o ciclo semanal de Mudanças que avalia as mudanças planejadas (categoria “Normal”).
  - Apontar toda e qualquer inconformidade com o seu tema, especialização ou área de atuação, bem como qualquer impacto ou risco potencial não previstos na Mudança.
  - Avaliar todas as Mudanças de categoria “Emergencial” e deliberar sobre sua aprovação ou reprovação.

11. Indicadores

O Gerenciamento de Mudanças de TI possui a definição de alguns Indicadores de Desempenho para acompanhamento de sua evolução, conforme demonstrado abaixo:

- Percentual e Quantidade de Mudanças (RFCs) por período (mensal);
- Percentual e Quantidade de Mudanças (RFCs) por categoria;
- Percentual e Quantidade de Mudanças (RFCs) por origem;
- Percentual e Quantidade de Mudanças (RFCs) fechadas com sucesso e fechadas sem sucesso;
- Percentual e Quantidade de Mudanças (RFCs) canceladas.

12. Documentos de Apoio

- Guia-Rápido do Processo
- Checklist de Apoio
- Template - Ata de Reunião
- Workshop para Implantação do Processo
- Plano de Trabalho de Mudança (RFC)
- Procedimento de como abrir uma GMUD na GOL

13. Controle de Versão

Versão	Data	Responsável	Principais Alterações
1.0	06/01/2017	CHACON Consultoria	Primeira versão do documento.
1.1	20/03/2017	CHACON Consultoria	Inclusão da Análise dos Objetivos de Controle do COBIT. Revisão e melhorias gerais (formatação e redação para melhor compreensão do processo).
