contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Contact Center

Estabilidade Operacional

13.Novembro.2015





contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Índice

1. Decisões
   - 1.1 Pendencias gerais
   - 1.2 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
   - 1.3 URA Internalização
   - 1.4 Layout Eletrônico
2. Evolução: Projetos Estruturais
3. Indicadores
4. Alinhamento

1.1 Decisões: Pendências Gerais

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Acordo do Steearing

- ✓ R$ 87K Projeto Gravação (Nice).
- ✓ R$ 22K Projeto Monitoração (Zabbix)
- ✓ R$ 15K (Ano 2015) Projeto URA – Internalização.
- ✓ R$ 72K (Ano 2016) Projeto URA – Internalização.

Status do SC- Solicitação de Compras

- ❑ R$ 87K Projeto Gravação (Nice).
  - SC em cotação
- ❑ R$ 22K Projeto Monitoração (Zabbix).
  - SC falta cadastro
  - Falta cadastrar fornecedor
- ❑ R$ 15K (Ano 2015) URA – Internalização.
  - SC em fase de aprovação
  - Falta apresentação do BC
- ❑ R$ 72K (Ano 2016) URA – Internalização.
  - SC em fase de aprovação
  - Falta apresentação do BC

Pendente de decisão do Steearing

- ❑ Sem encargo
- Projeto Layout Eletrônico

1.2 Decisões: Prefeitura do Rio de Janeiro

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Cenário Atual (Problema)

- ❑ **Inaderência** contratual
- ❑ **Atrasos** ocorridos por **alterações de escopo e priorizações**
- ❑ **Concorrência** entre serviços de suporte e desenvolvimento
- ❑ **Gaps de relacionamento** com o cliente.
- ❑ Perda de histórico.
- ❑ Possibilidade de multa em ~1MM

Solução

- ❑ Definição de estratégia para **aderência contratual**
  - Alocação de recursos conforme contrato
- ❑ Documentação histórica disponível.
- ❑ Estreitar relacionamento e analisar concessões.
  - (Ex. Novos servidores)
  - Apresentação das réplicas.

Ações em andamento / Agendadas

- ✓ Call conference entre: CSE, Aplicações e Site para entendimento do cenário.
- ✓ Planilha com respostas para todos os itens elencados
- ❑ Análise de insumos internos para realização de troca do servidor / Melhoria query
- ❑ Endereçamento de 44 itens importantes . Desde Set. 2014 (Eugênio)

A Contax ainda não foi formalmente comunicada. Definir o approach para o assunto.
Assunto encaminhado na reunião de Steearing!

1.3 Decisões: URA Internalização

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Cenário Atual (Problema)

- ❑ **Falta de visibilidade de licenciamento Genesys** (Produto, Quantidade, Propriedade e Estimativa de Custo).
- ❑ **Ausência de estimativa de custo** do Suporte N3 Genesys.
- ✓ **Falta de cotação com outros fornecedores – Renovado contrato**
- ✓ **Pacote único de contrato para 3 frentes;(Serviços de suporte Santander, Serviços de suporte TAM, Desenvolvimento TAM)**
- ❑ **Falta de capacitação interna específica** para a versão.

Solução

- ➢ Receber documentação e informações de licenças (Information) – Alinhado para workshop
- ❑ **Análise de custo X benefício.**
- ❑ Capacitação e treinamento interno. **Investimento 87K.**
- ✓ **Divisão do contrato em 3 pacotes independentes.**

Benefícios

- ❑ **Flexibilidade no gerenciamento dos contratos**.
  - Mitigação de riscos de implementação do projeto.
- ❑ **Ganho / otimização de receita**.
- ❑ Oportunidade de rentabilizar o projeto através da **oferta do serviço de suporte.**

Definição da estratégia a ser alinhada. Após renovação do contrato, seguir com a internalização?
Trabalha no BC, com os novos dados!

1.4 Decisões: Layout Eletrônico

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Cenário Atual (Problema)

- **Alocações indevidas de PA's** a título de contingências operacionais.
  - Segmentação da Operação.
  - **Dificuldade para gerenciamento das imagens de workstations** no layout estipulado.
  - Reserva indevida para crescimento **– Impacto em projetos de TI.**
  - **Invisibilidade do impacto do incidente** por reserva inadequada de contingência.
- **O rateio de custos por alocação onera o resultado da operação** com alocações indevidas, inclusive na composição dos custos de TI.
- **Esforço desnecessário de TI em PA´s desalocadas (Sem receita)**

Solução


- Inicialmente, **sem CAPEX**.
- Avaliação técnica de desempenho e capacity da ferramenta "Layout Eletrônico).
- Estruturação de um plano de projeto "Cross divisional" entre TI, Engenharia, Planejamento, BI e operações.
- Criação de um plano de atualização mensal dos dados da solução.
- Definição das visões (KPIs) importantes para TI – À demandar para BI.
- Definição de um piloto.

Benefícios


- **Composição mais fiel das perdas de receitas geradas por incidentes de TI.**
- **Esforço de suporte inteligente** em PAs que geram receita.
- **Padronização das imagens**, de acordo com o layout.
- **Redução de retrabalho** em implementação de projetos.
- **Coerência na atribuição dos custos de TI.**
- **Rateio do custo das PAs** através da alocação (classificação e negócio).
- **Melhoria no gerenciamento de ativos.**(HW,SW)


Avançar ou não avançar no projeto?
Avançar!


2. Evolução: Projetos Estruturais

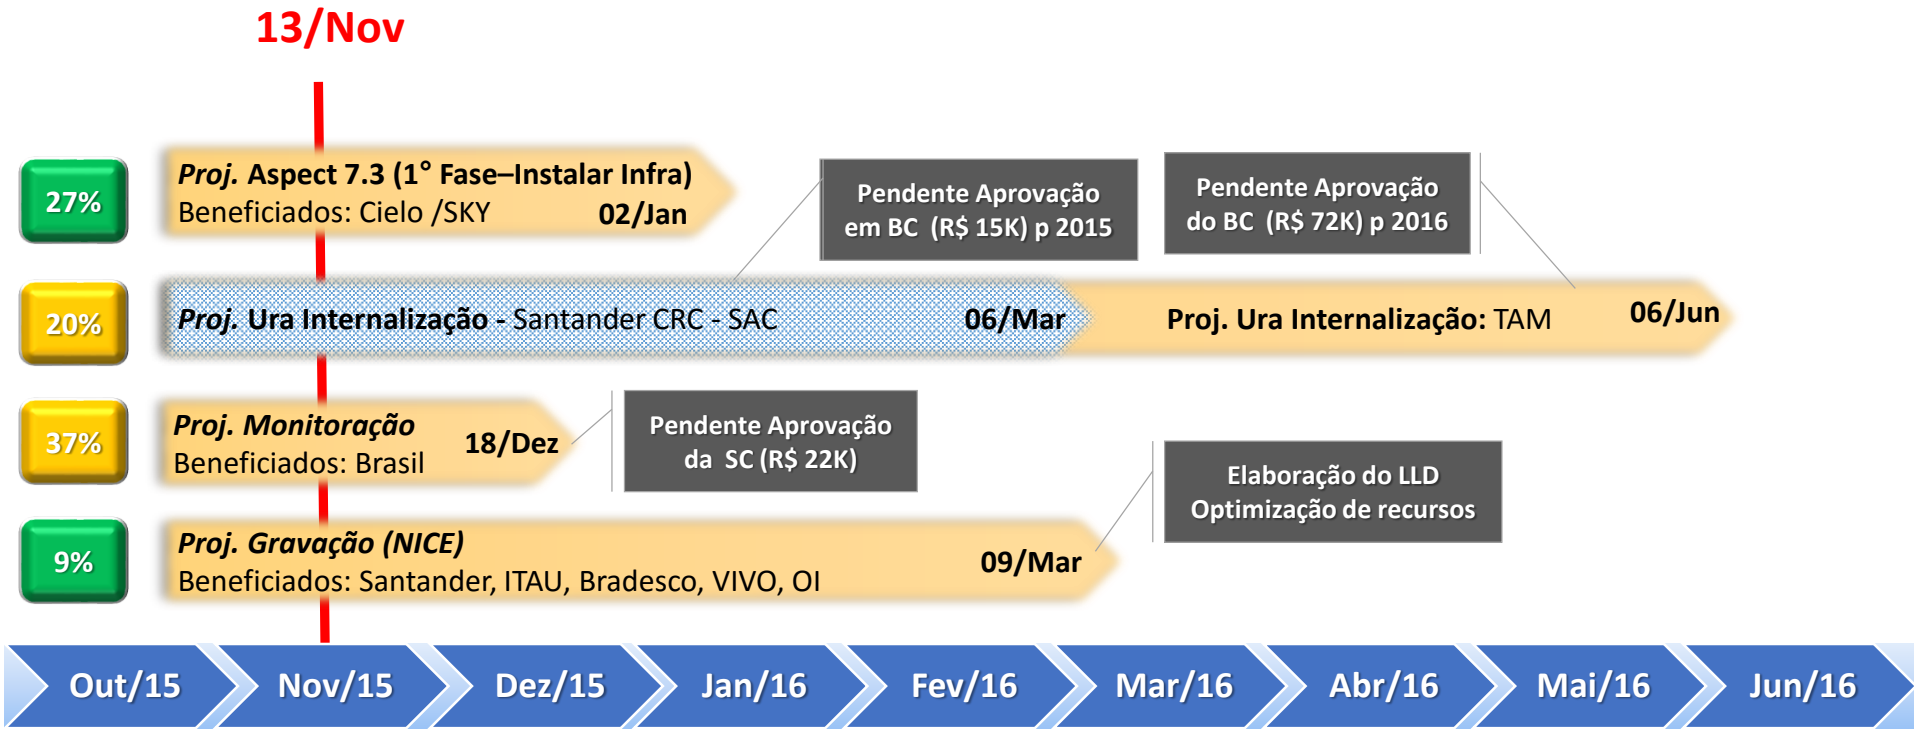

3. Indicadores

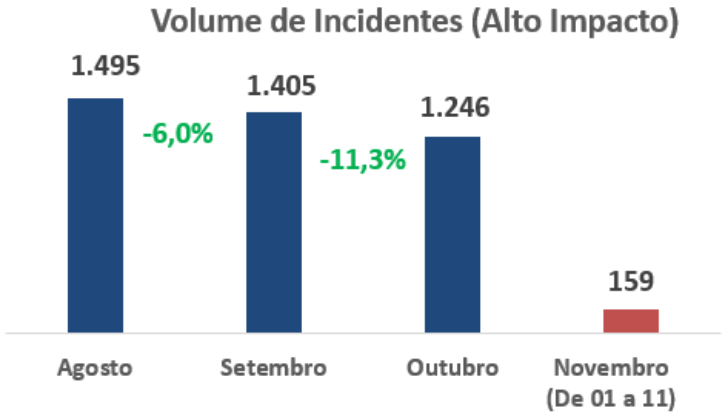

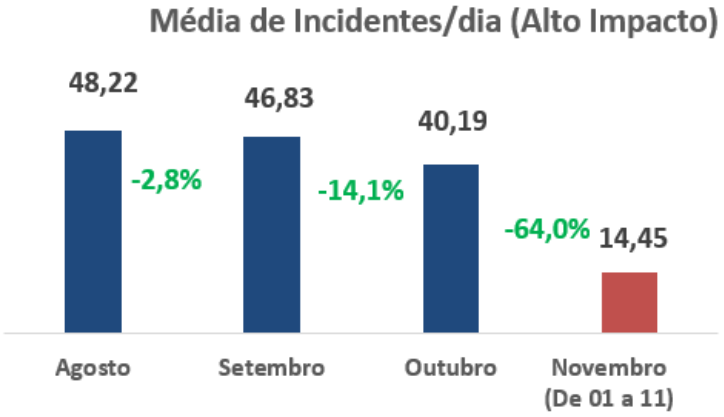

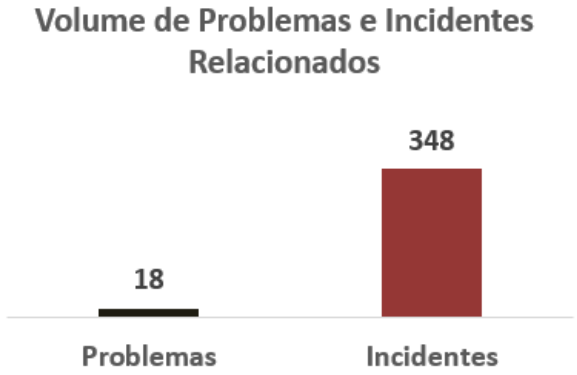





4. Alinhamento

