contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Contact Center

Estabilidade Operacional

10.Dezembro.2015





contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Índice


1. Status das Solicitações de Compra
2. Projetos Estruturantes e Especiais
3. Indicadores
4. Alinhamento

1. Status das Solicitações de Compra


Projeto	Valor	Descritivo	Status
Projeto – Gravação NICE	R$ 30.000,00	Aquisição de 12 HDs	Tem SC 35792
Projeto – Monitoração	R$19.000,00	Consultoria e certificação ZABBIX	Tem SC 34974
Projeto- URA Internalização	R$ 75.000,00	Capacitação equipes de suporte e certificação	Tem SC 35895
Projeto – Prefeitura RJ	R$ 1.743,00	Movimentação servidores	OK

Precisamos dos números dos pedidos.


2. Projetos Estruturantes e Especiais



Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
Projetos Estruturantes	**29%**	**169 dias**	**Qua 14/10/15**	**Seg 06/06/16**
Proj Aspect 7.3 (infra)	***31%***	89 dias	Qua 14/10/15	Seg 15/02/16
Proj Gravacao (NICE)	***13%***	106 dias	Qua 14/10/15	Qua 09/03/16
Proj Monitoração	***57%***	95 dias	Qua 14/10/15	Ter 23/02/16
Proj Minitoração (Dell - Open Manager)	***62%***	95 dias	Qua 14/10/15	Ter 23/02/16
Proj Monitoração (Zabbix)	***49%***	69 dias	Qua 14/10/15	Seg 18/01/16
Ura Unternalização	***20%***	165 dias	Ter 20/10/15	Seg 06/06/16
Projeto Redundância links MPLS	***8%***	65 dias	Ter 01/12/15	Seg 29/02/16
Projetos Especiais	**20%**	**49 dias**	**Ter 17/11/15**	**Sex 22/01/16**
Projetos Perfeitura do RJ	**30%**	49 dias	Ter 17/11/15	Sex 22/01/16
Projeto OCS Inventory	**5%**	31 dias	Sex 04/12/15	Sex 15/01/16

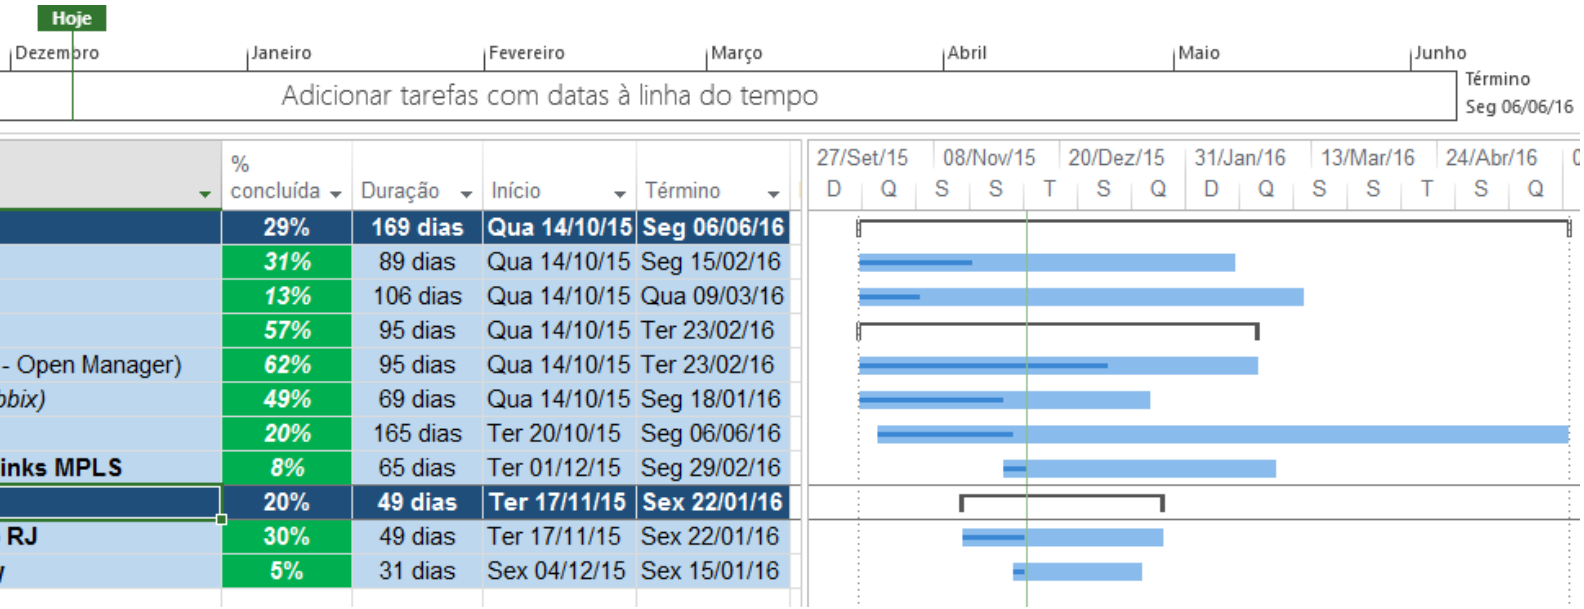

















3. Indicadores: Incidentes e Problemas

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Volume de Incidentes Alto Impacto

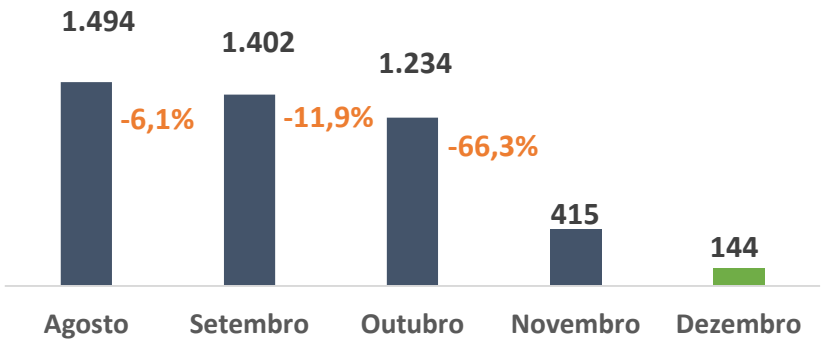


Média diária de Incidentes Alto Impacto

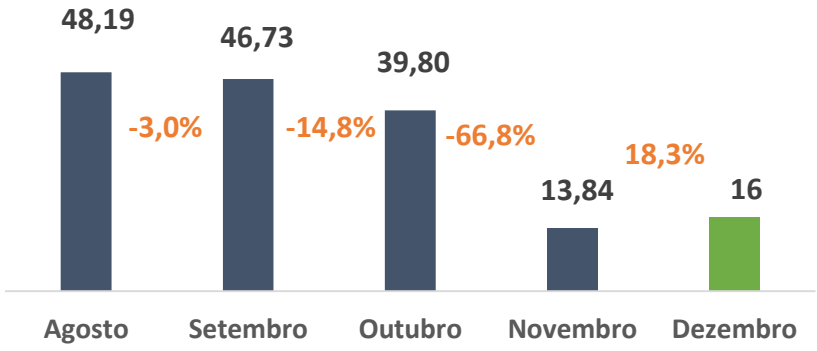

Redução Consolidada Ago / Nov -72,22%

Redução *Projetada* Ago / Dez -66,02%

Gestão de Problemas

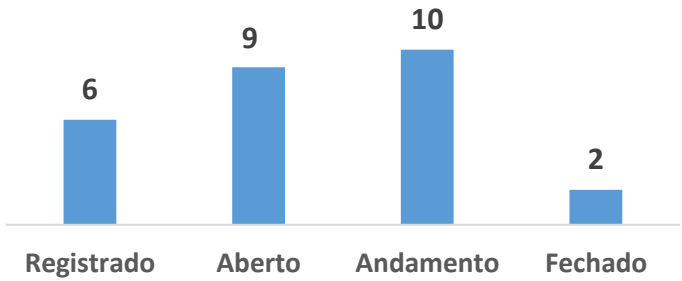

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess!

CHACON | Consultoria Ilimitada

6. Alinhamento

