contax

BPO • CONTACT CENTER • IT

Estabilidade Operacional

4 Agosto de 2016




contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Índice

1. Indicadores totais de Incidentes
2. Gerenciamento de Incidentes – Alto Impacto
3. Incidentes Alto Impacto – Por Clientes
4. Incidentes Alto Impacto - Por Resolvedor
5. Incidentes Médio /Baixo Impacto
6. Gestão de Mudanças
7. Proposta para alteração Metas/SLA TI
8. Gestão de problemas – Dashboard e Indicadores
9. Projetos Estabilidade Operacional
10. Alinhamento

1. Indicadores: Totais de Incidentes

Incidentes Todos os Impactos

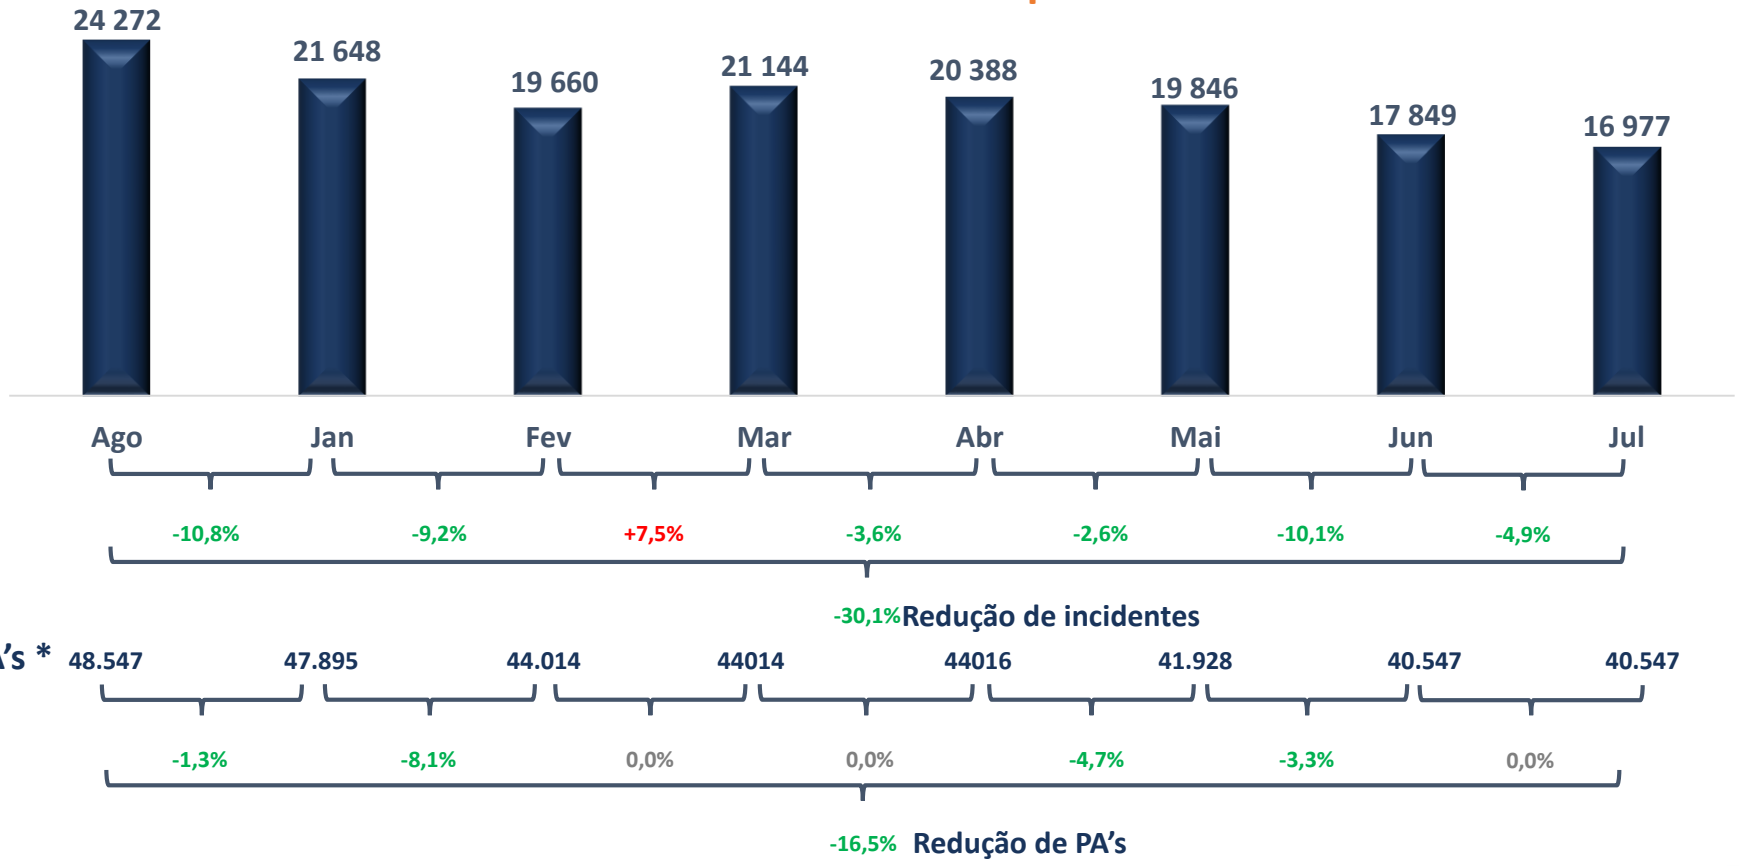


Fechamento do mês de Julho


* Fonte: Contagem manual de Workstation realizada mensalmente pela TI

2. Gerenciamento de Incidentes - Alto Impacto

Volume de Incidentes

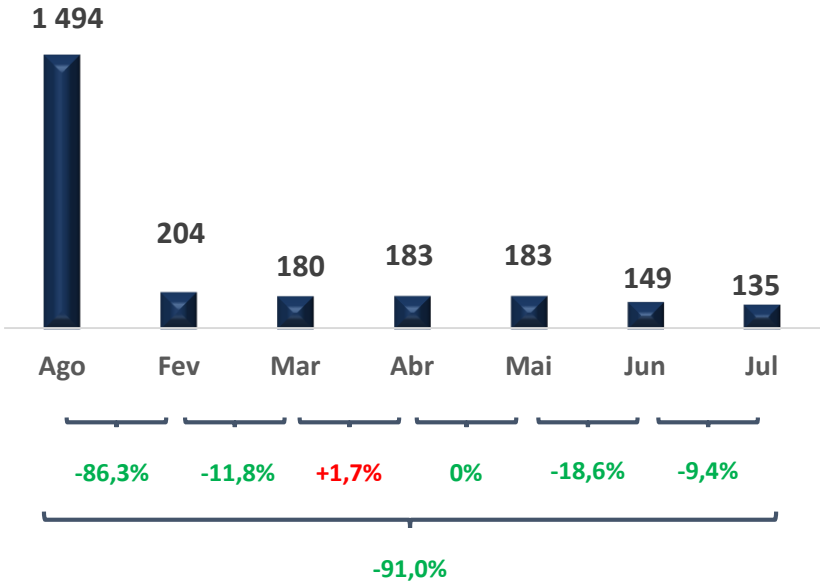

Média diária de Incidentes

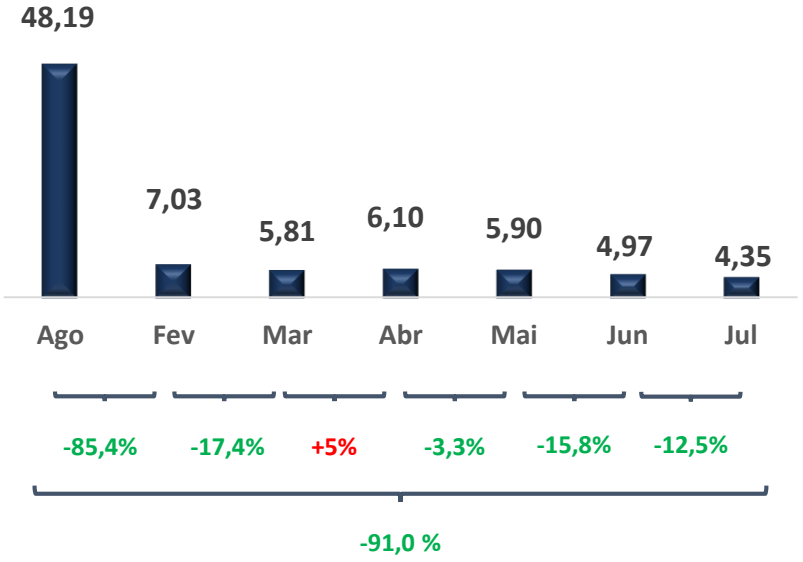


Fechamento do mês de Julho


2. Gerenciamento de Incidentes - Alto Impacto

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Volume de Incidentes

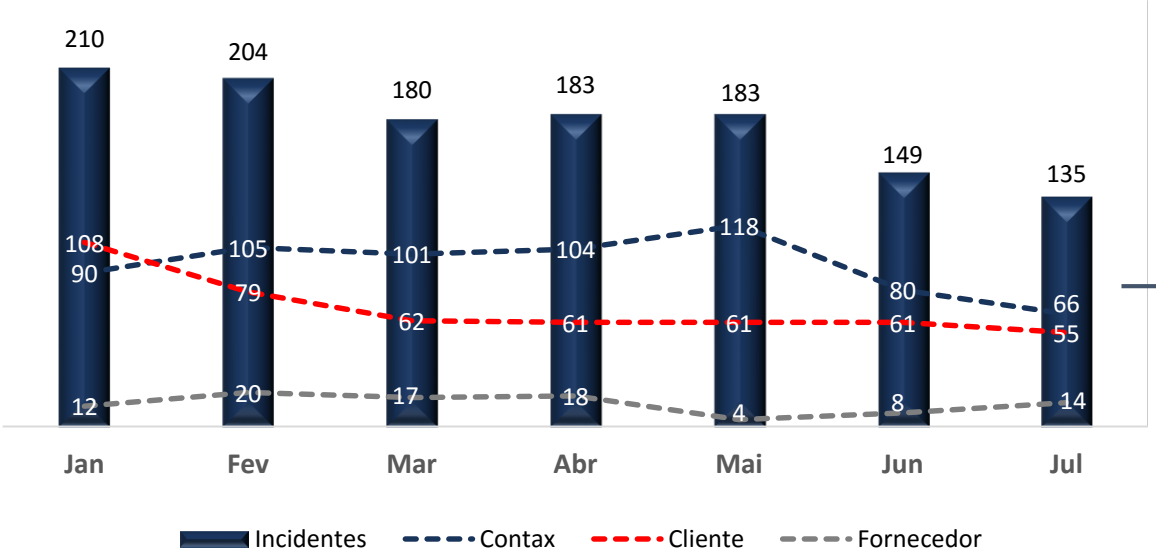

Responsabilidade pela resolução

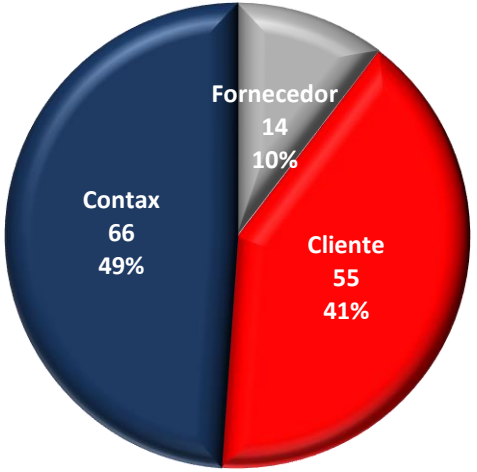

Fechamento do mês de Julho

3. Incidentes Alto Impacto - por clientes

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Chamados por clientes ordenado por (INC X PA's)

Cliente Afetado	Incidentes	PA's	Inc x PA's (%)
Gás Natural	4	183	2,18%
Tam	9	565	1,59%
Globo	1	76	1,32%
Bradesco	8	681	1,17%
Cielo	1	88	1,13%
Intermedica	4	478	0,84%
Souza Cruz	1	124	0,80%
BV Financeira	1	154	0,65%
Citibank	2	610	0,33%
Prefeitura RJ	1	318	0,31%
Net	7	2770	0,25%
Vivo	10	3570	0,28%
Claro	3	1756	0,17%
Santander	7	3073	0,23%
Itaú	10	3966	0,25%
Oi	61	30085	0,20%
Multicliente	5	0	
Total Geral	**135**	**48497**	**0,28%**


Incidentes e Faturamento

Cliente Afetado	Incidentes	Faturamento
Oi	61	102.463.181
Santander	7	15.761.232
Itaú	10	14.171.328
Vivo	10	11.872.948
Net	7	8.331.841
Claro	3	4.234.034
Bradesco	8	2.530.331
Citibank	2	2.528.306
Intermedica	4	1.835.619
Prefeitura RJ	1	1.623.980
Tam	9	1.380.310
BV Financeira	1	643.576
Globo	1	527.200
Souza Cruz	1	524.668
Cielo	1	315.073
Multicliente	5	-
Gás Natural	4	-
Total Geral	**135**	**168.743.627**

* Fonte: Contagem manual de Workstation realizada mensalmente pela TI

Fechamento do mês de Julho

4. Incidentes Alto Impacto - por resolvedor

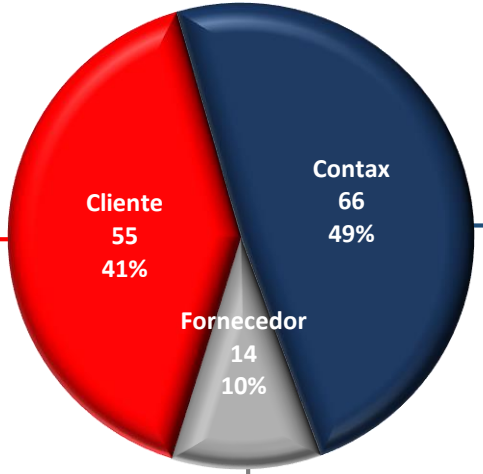

Cliente		
Tipo	Quant	%
Software	44	80,00%
Rede	6	10,91%
Processo	3	5,45%
Telecom	1	1,82%
Hardware	1	1,82%
Total Geral	55	100,00%

Fornecedor		
Tipo	Quant	%
Rede	7	50,00%
Software	6	42,86%
Processo	1	7,14%
Total Geral	14	100,00%

Contax		
Tipo	Quant	%
Software	39	59,09%
Processo	13	19,70%
Hardware	7	10,61%
Rede	6	9,09%
Telecom	1	1,52%
Total Geral	66	100,00%


5. Incidentes Médio /Baixo Impacto

Incidentes Médio / Baixo			
Regional / Sites	Incidentes	PA	Incidentes por workstation
Regional Minas Gerais	510	768	0,66
Regional Pernambuco	4689	8801	0,53
Regional Ceara	2271	5063	0,45
Regional Rio de Janeiro	2794	6643	0,42
Regional Bahia	2675	6693	0,40
Regional São Paulo	2325	7070	0,33
Regional Sul	875	3855	0,23
Regional Acre	183	731	0,25
Regional Paraíba	141	923	0,15
Multi-Regional	378	-	-
Todos os Sites	**16841**	**40547**	**0,42**

Tipo	Quantidade	%
HARDWARE	7916	47,00%
SOFTWARE	5912	35,10%
TELEFONIA	1029	6,11%
NOC	992	5,89%
OUTROS - N / A	528	3,14%
REDE	275	1,63%
GRAVADORES	124	0,74%
URA	63	0,37%
DAC	2	0,01%
Total	**16841**	**100,00%**

* Fonte: Contagem manual de Workstation realizada mensalmente pela TI

5. Incidentes Médio /Baixo Impacto

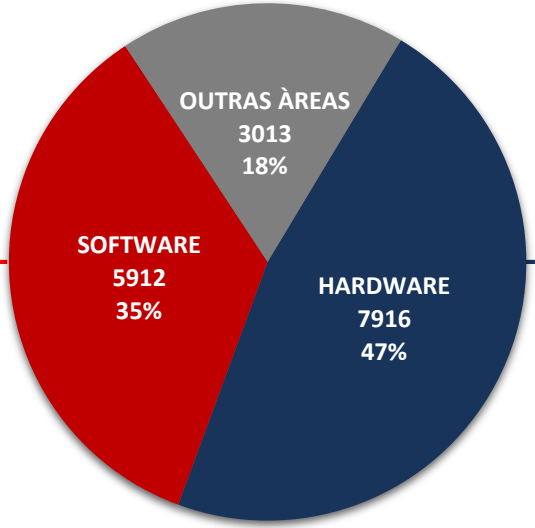


SOFTWARE	QUANTIDADE	%
Tclock	1032	17,46%
SMPA	375	6,34%
Front Fácil	327	5,53%
Tguidance	288	4,87%
CMS	134	2,27%
Total View	133	2,25%
Webmail	133	2,25%
TControl	132	2,23%
CITRIX	112	1,89%
Pacote office	103	1,74%
SIEBEL	92	1,56%
STC	72	1,22%
TLV/TQS	67	1,13%
Demais Software	2912	49,26%
TOTAL	**5912**	**100,00%**


HARDWARE	QUANTIDADE	%
Headset	2987	37,73%
Computador	2312	29,21%
Mouse	1201	15,17%
Teclado	563	7,11%
Telefone	471	5,95%
Monitor	333	4,21%
Impressora	49	0,62%
Total	**7916**	**100,00%**

6. Gestão de Mudança

Volume de mudanças por mês

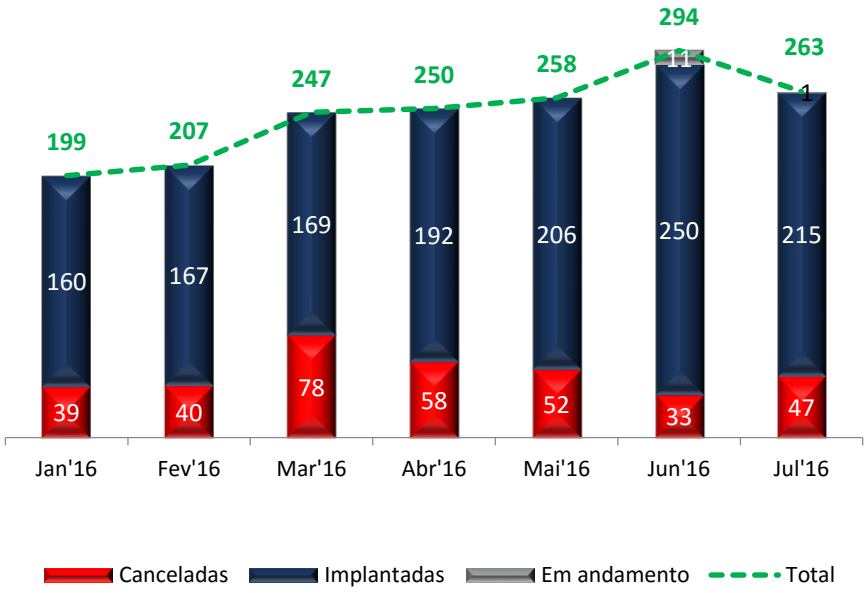

Implantadas por categoria

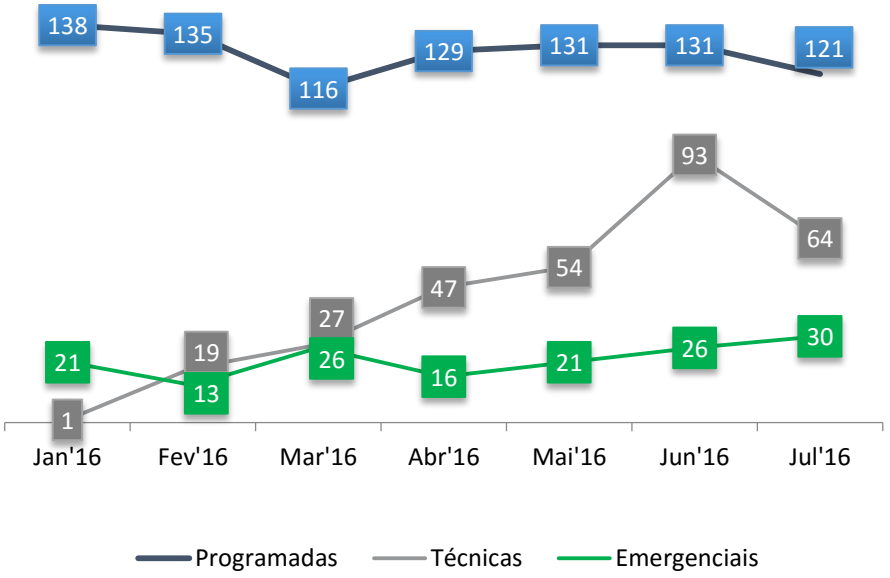

Gmud Técnica: *Mudanças registradas exclusivamente por profissionais especialistas das áreas de TI*

Demais conceitos

Fechamento do mês de Julho

Draft

7. Proposta para alteração Metas/SLA TI

Impacto	Prioridade	Conceito		SLA		Meta	
		As Is	To be	As Is	To be	As Is	To be
Alto	Crítica - 1	100%	90% a 100%	2 horas	2 horas	95%	95%
	Muito Alta - 2	30% a 99%	30% a 89%				90%
Médio	Maior - 3	6% a 29%	20% a 29%	3 horas	3 Horas	85%	85%
	Média - 4	1% a 5%	5% a 19%		4 Horas		80%
Baixo	Baixa - 5	0%	0% a 4%	12 horas	8 horas	75%	75%


Em Revisão


Avaliar:




- SLA Fornecedores/Terceiros (Superiores a 2h)
- Suporte Especializado casos que não temos especialistas 24x7 (EX: Aplicações, DBA)
- Escala de Operações Módulo SLA x Escala times de Suporte
- Severidade de Chamados de Gravadores

8. OLA – Gestão de problemas – Médio e Alto impacto

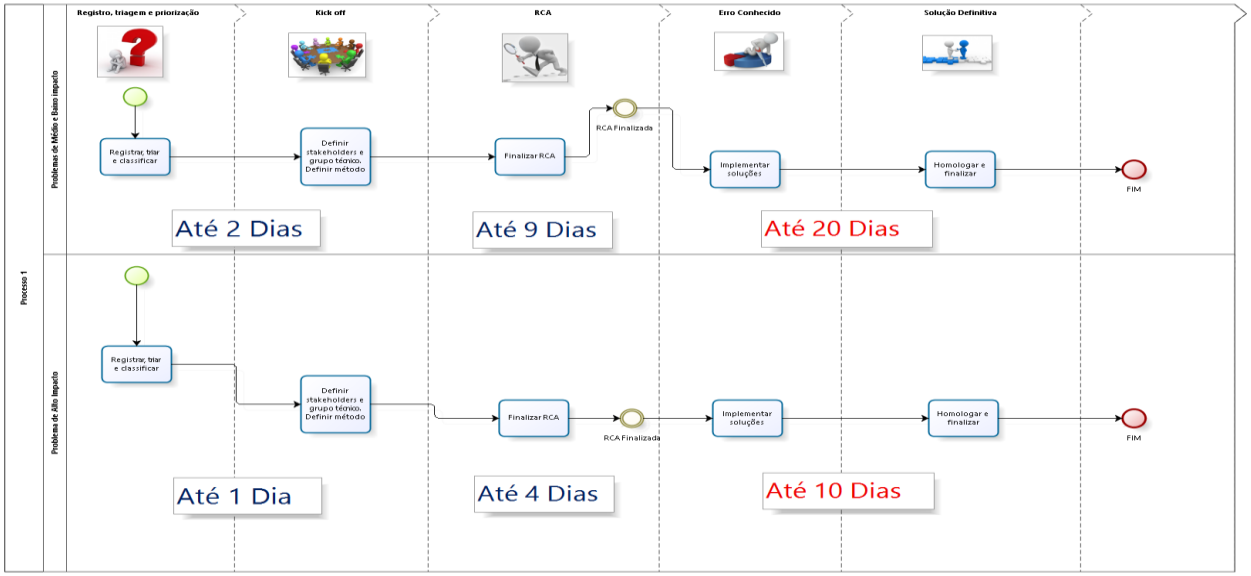

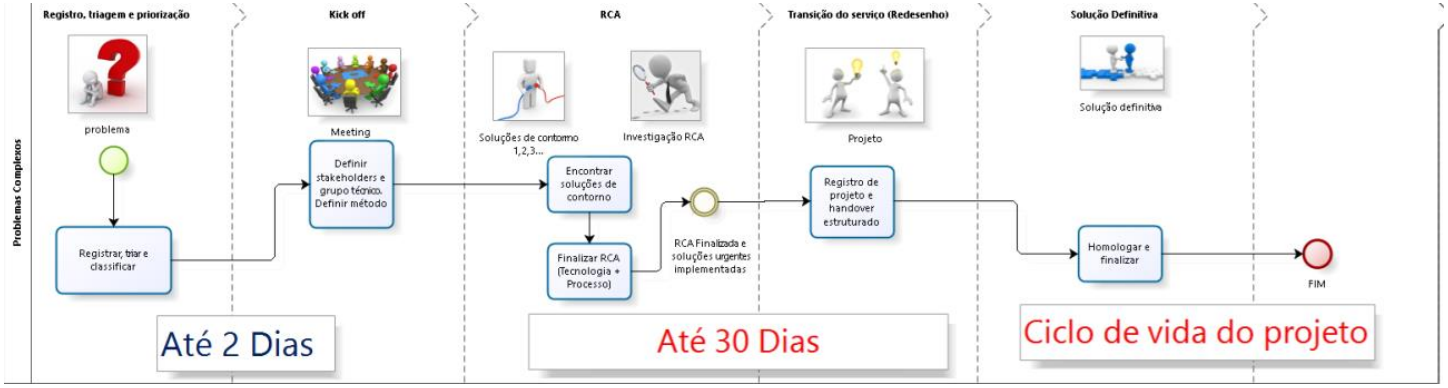

8. Problemas Complexos

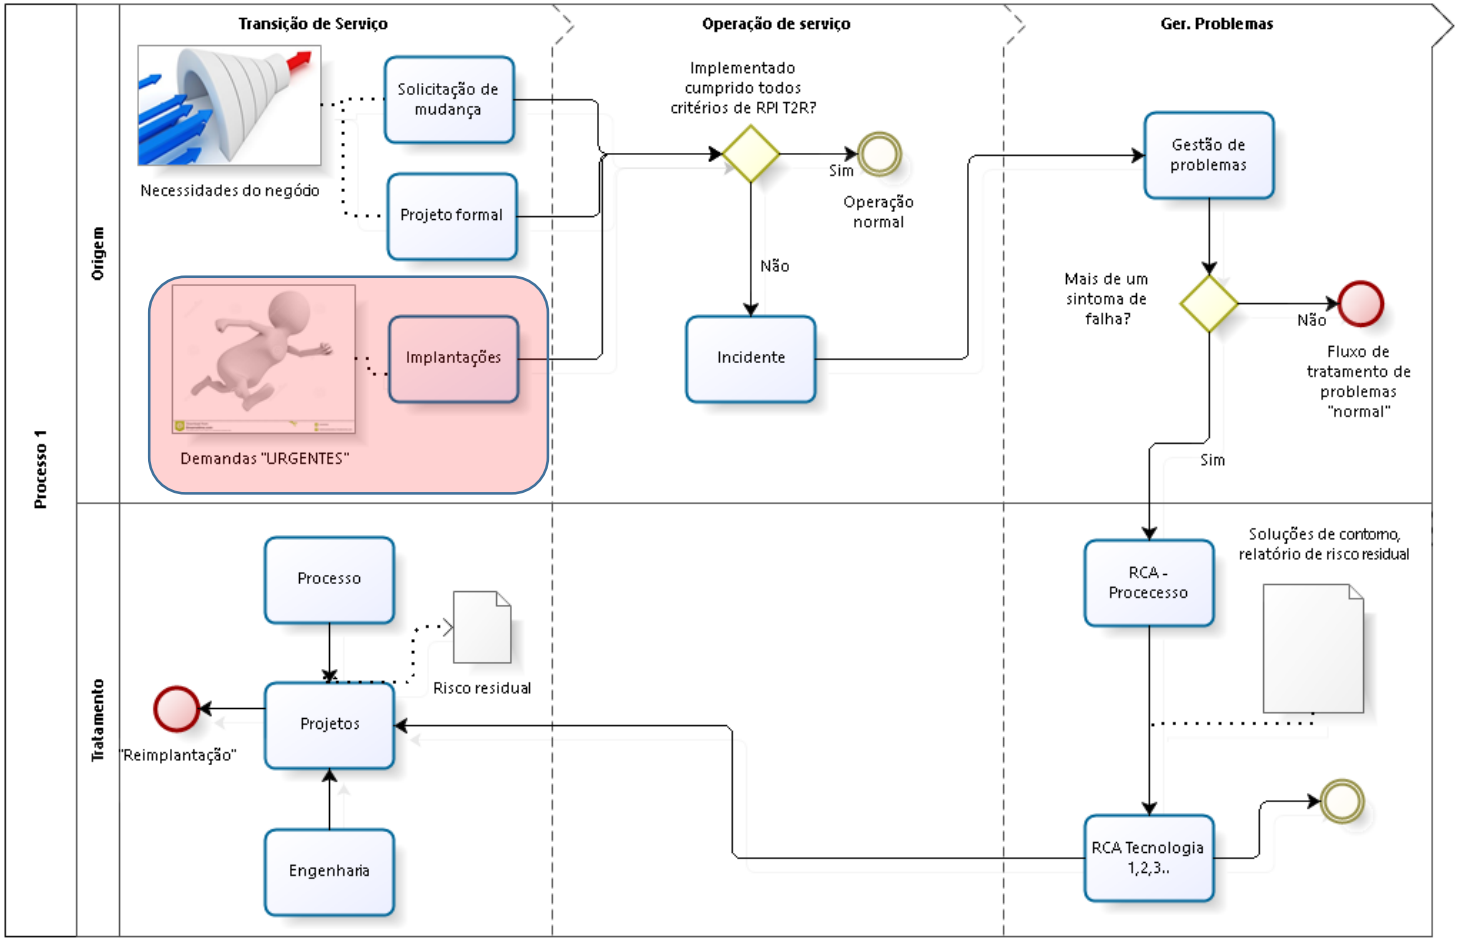


8. Processos de comunicação e envolvimento

Fases de comunicação para todos os stakeholders.



Nível de envolvimento: Fases X Grupos

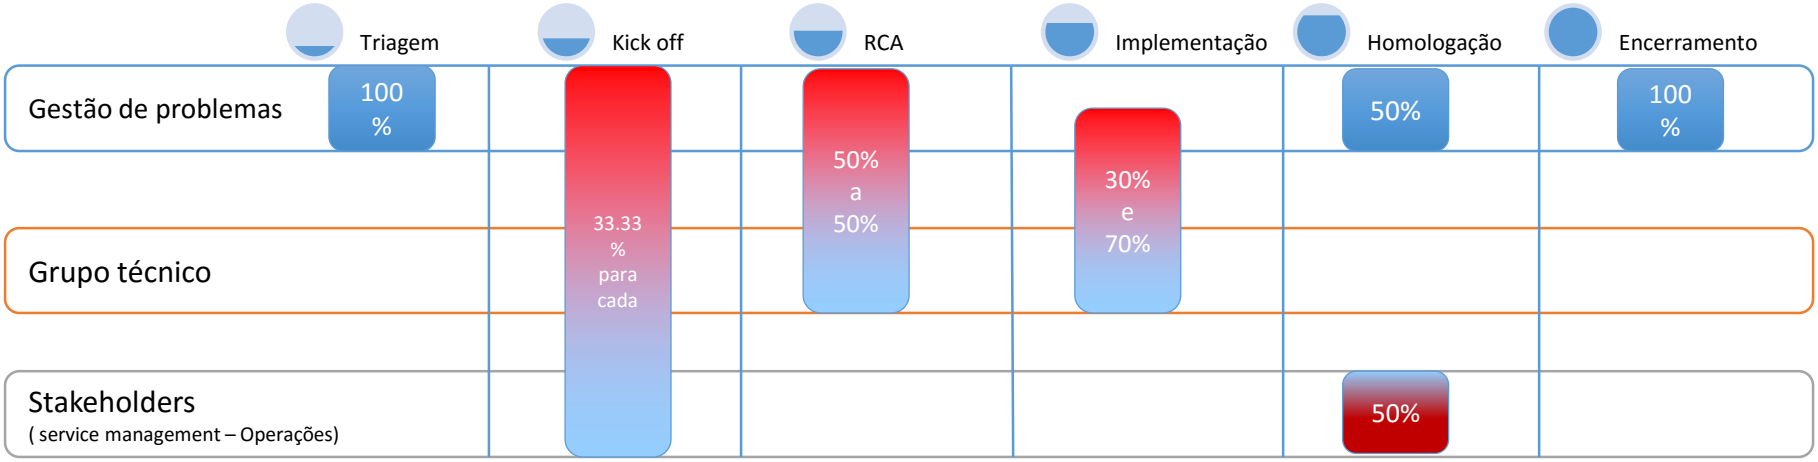

8. Processos de escalonamento

Escalonamento



Comunicação do escalonamento:

A) Notificação de atraso da atividade via e-mail + contato telefônico

B) Problemas complexos são comunicados para o nível executivo via e-mail (automaticamente).

C) Problemas de alto impacto são comunicados para as gerências automaticamente.

D) Relatórios de riscos residuais são comunicados por e-mail para todos os grupos e preferencialmente entregues em via física para os níveis gerencial e executivo.

9. Projetos

Projeto: Ura Internalização

Data Inicio: 14-4-2016 *Data Conclusão: 02-09-2016*

PM: Luis Marçal *Progresso: 34%*



- Agendado treinamento para **29 Agosto** do último modulo **"Genesys Framework, Routing, and Reporting Administration 8.5".**
- Foi identificada a necessidade de criar **2 novos ambientes, para entrar no "Pipe" da Engenharia**:
  - **Treinamento**
  - **Homologação**

RISCO: O contrato com a Information termina em Novembro.

Projeto: Qualidade em Gravação

Data Inicio: 24-02-2016 Data Conclusão: 31-10-2016

PM: Luis Marçal Progresso: 84%



✓ Conclusão do **"Piloto" na OI** no módulo Recuperação de gravações.

- **Roolout** no módulo Recuperação de gravações:
  - Treinamento das operações **Itaú, Citibank, Santander e Vivo, Bradesco até 15 Agosto.**
- **Homologação do modulo Painel e Tela do NOC.**

Projeto: Gravação (NICE): Elektro, TAM e Bradesco

Data Inicio: 02-05-2016 *Data Conclusão: ~~09-09-2016~~ 13-10-2016*

PM: Luis Marçal *Progresso: 67%*



➢ **Em fase de conclusão o projeto TAM para a plataforma NICE**.

- ➢ Em fase de estabilização da plataforma de gravação (92% OK).

Bradesco pendente de migração da infra de gravação para o CPD do Site Alegria.

Elektro estável e sem incidentes de gravação, após implantação do projeto.

Nota: Elektro só solicita recueração de chamados, maior que 3 meses.

Projeto: Redundância links MPLS

Data Inicio: 01-12-2015 *Data Conclusão: 30-09-2016*

PM: Luis Marçal *Progresso: 84%*



✓ **Executado com sucesso** intervenção no **site Antártica** com os testes de redundância MPLS.

Intervenção no site **Sto Amaro e Comercio,** em negociação para ser realizada em meados de Agosto.

9. Projetos

Projeto: T2R – Transição de Serviços

Data Inicio: 22-03-2016 *Data Conclusão:29-07-2016*

PM: Adolpho Chacon *Progresso: 90%*



- ✓ Produção de indicadores relacionados ao T2R (*dashboards*).
- ✓ *Definição* de novos critérios para definição de ritos de Mudança ou Projeto (*pipeline*).
- ✓ Entregue e aceita a documentação de Ger. de Projetos (*booking* e RACI).
- ✓ Suporte ao time GMUD durante férias da Gestora.
- ✓ Workshop sobre conceitos do T2R (Demandas X Mudanças X Projetos).
- ✓ Implantação de *checklist* dos requerimentos mandatórios GMUD.

Proreto: Backup & Restore Ambiente de Produção

Data Inicio: 01- 01-2016 *Data Conclusão: 30-09-2016*

PM: Rafael Alves *Progresso: 81%*



- ✓ Atividade de autenticação de integração SQL em andamento
- ✓ Padronização de bkp dos AD nível BR da empresa em conjunto com o CSE finalizado
- ✓ Padronização de bkp dos DHCP nível BR da empresa em conjunto com o CSE em andamento – 80%
- ✓ Padronização de bkp de todos os File Servers – 50 % concluídos

Projeto: OCS Inventory

Data Inicio: 04-12-2015 *Data Conclusão: 06-10-2016*

PM: Felipe Poubel *Progresso: 63%*




- ✓ Servidores cadastrados no OCS: 2351/ 3685
- ✓ Integração com as atividades do CTX PLAN nas atividades dos sites e da equipe DAS
- ✓ Acesso criado e enviado a todos os sites juntamente com a POP do sistema
- ✓ Organização dos servidores já ativos por site
- ✓ Servidores já agrupados por site

10. Alinhamentos





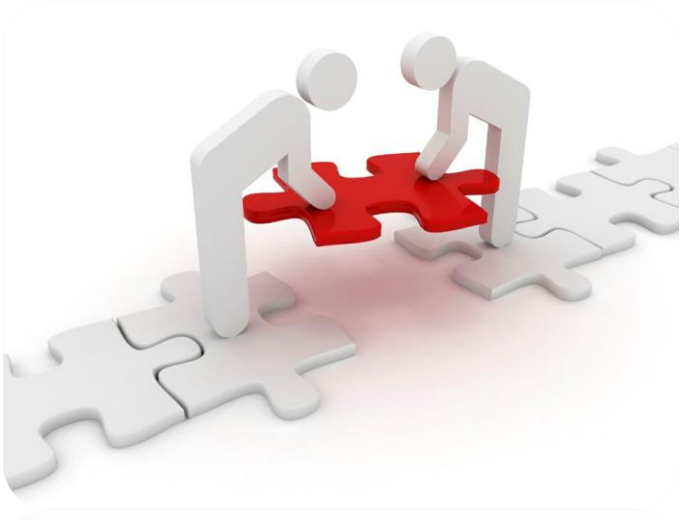



contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Obrigado!
