VISÃO GERAL DO PROJETO - Qualidade na Gravação

QUA 17/02/16- QUA 18/05/16

% CONCLUÍDA

31%


MARCOS A VENCER

Marcos chegando em breve.

Nome	Término
Projeto Encerrado	Qua 18/05/16
Fim Processos	Ter 26/04/16
Disponibilizar para os sites	Sex 01/04/16
Fim da escala de operações	Sex 01/04/16
Fim Pessoas	Sex 01/04/16
Fim Tecnologia	Ter 17/05/16
Fim Fases do Projeto	Ter 17/05/16

% CONCLUÍDA

Status de todas as tarefas de nível superior. Para ver o status de subtarefas, clique no gráfico e atualize o nível de estrutura de tópicos na Lista de Campos.

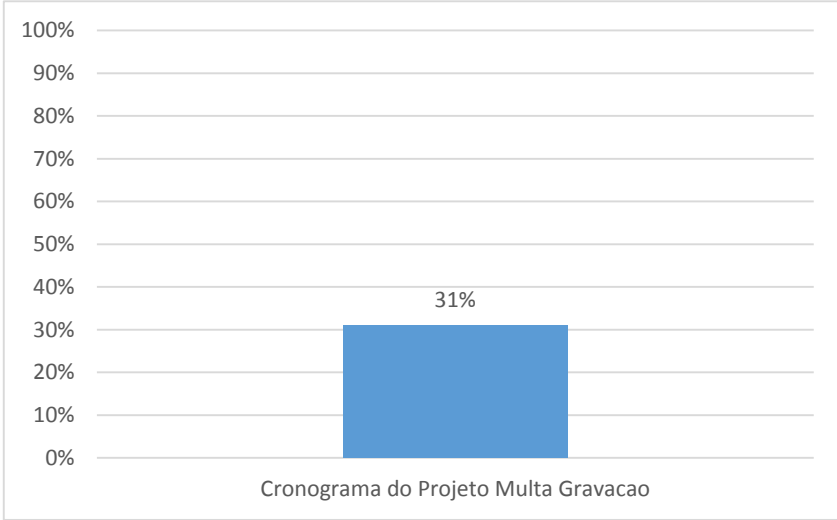

TAREFAS ATRASADAS

Tarefas que estão vencidas.

Nome	Início	Término	Duração	% concluída	Nomes dos recursos
Validar execução do Checklist Local – Sites	Sex 19/02/16	Seg 07/03/16	12 dias?	80%	Fabi;Sites
Garantir operações logando no layout gravado	Seg 07/03/16	Sex 18/03/16	10 dias?	0%	Operacoes;Fabi
Levantamento dos contratos	Qua 17/02/16	Qui 31/03/16	30 dias	5%	Rafael;Stuart
Criar Matris de indicadores de SLA de contratos	Seg 07/03/16	Seg 04/04/16	20 dias	0%	Ronald;Stuart;Henrique;Rafael
Validação das multas aplicadas	Qua 24/02/16	Ter 26/04/16	44 dias?	10%	Rafael
Providenciar racional de não entrega de gravações por motivo	Seg 22/02/16	Ter 08/03/16	12 dias?	70%	Fabi;Operacoes
Atualizar lista de	Seg 22/02/16	Qua 02/03/16	8 dias?	75%	Fabi;Ilana

contatos dos pontos focais de Retrievel - todos os clientes					
Comunicação do projeto para as pontas	Seg 29/02/16	Qui 10/03/16	9 dias?	50%	Chacon
Reunir com financeiro (Patricia Decursi) - Detalhe das multas	Sex 04/03/16	Sex 04/03/16	1 h	0%	Donaire;PM;Ilana
Criar uma rotina para revisitar junto as pontas (site)	Qua 24/02/16	Sex 11/03/16	13 dias?	20%	Rogerio;wagner
Execução do treinamento	Qui 25/02/16	Sex 11/03/16	12 dias?	50%	Rafael
Identificar serviços que podem ser monitorizados proativamente	Seg 29/02/16	Ter 08/03/16	7 dias?	50%	Ludson;Rogerio
Informar "janela" para execução da ferramenta de Checklist Aut.	Sex 04/03/16	Seg 07/03/16	2 dias?	0%	Rafael;wagner
Implantar ferramenta de controle de Checklist Sites	Ter 23/02/16	Qui 07/04/16	32 dias	30%	Alexandre;Fabi
Raio X do ambiente de gravação	Ter 23/02/16	Ter 08/03/16	11 dias?	75%	Rogerio
