contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Contact Center

Estabilidade Operacional

18.Fevereiro.2016





contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Índice

1. Indicadores – Incidentes de Alto Impacto e Problemas
2. Indicadores – Total de Incidentes (Alto, Médio e Baixo)
3. Gestão de problemas
4. Incidentes de Alto Impacto por Responsável pela Solução Janeiro 2016
5. Processo de Escalonamento de Incidentes Alto Impacto
6. Projeto: Multas de Gravação
7. Projetos Estruturantes e Especiais
8. Alinhamento


1. Indicadores: Incidentes Alto impacto e Problemas

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Volume de Incidentes Alto Impacto

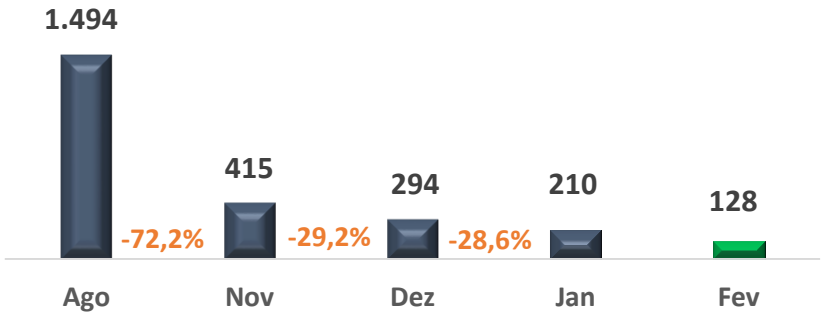

Média diária de Incidentes Alto Impacto

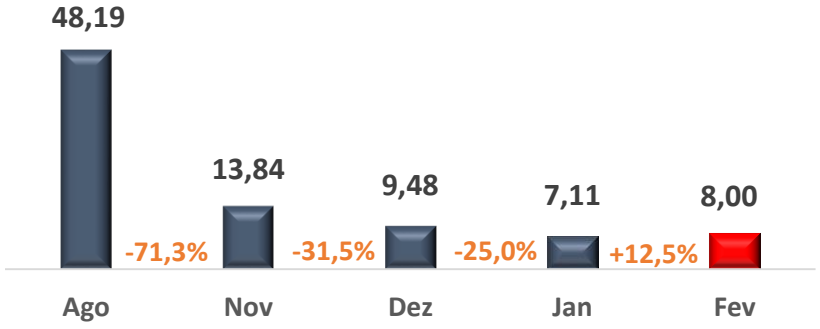


Redução *Consolidada* Ago / Dez -80,32%

Redução *Projetada* Ago / Fev -91,43%

Gestão de Problemas


Total 36

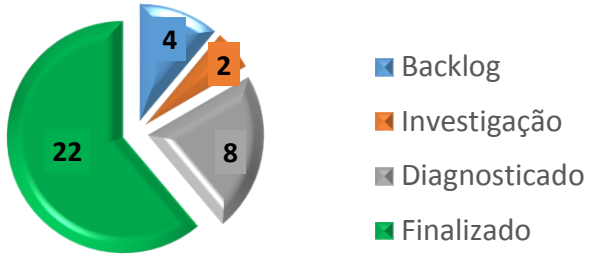

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 16/02.

CHACON | Consultoria Ilimitada

2. Indicadores: Total de Incidentes

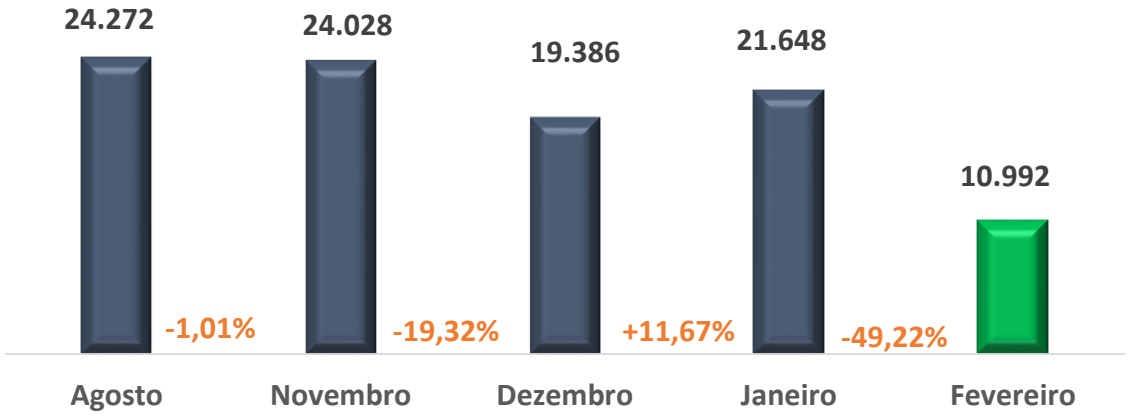

Fev - 29 dias	Real	Projeção	Meta	Desvio	Farol
Total	**10.992**	**19.923**	**21.954**	**-9,3%**	
Alto	128	232	**294**	-21,1%	
Médio	6.740	12.216	**13.076**	-6,6%	
Baixo	4.124	7.475	**8.305**	-10,0%	


Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 16/02.

3. Gestão de problemas

Descrição do problema	Ticket Problema	Tempo de vida	Tempo para RCA	Solução de contorno existente?	Risco residual e/ou investimento?
Back up - Todos os sites | Falta de backup de servidores críticos |	CTXMLTREG-4365	126	0	Não	Sim
tCollect - Televendas Oi - Prado II - Broges de Melo | Lentidão para pop up de tela |	CTXFORBM-332487	100	24	Sim	Não
GENESYS | CHAT | SITE OI CHAT R1 E R2 INDISPONÍVEL	CTXRECAM-56321	78	-	Sim	Sim
ASPECT - Discador - Polo CE- Propenso OCT , TV , Ativo reversão Fixa , Velox -Nascente e Borges de Melo | Ligações Mudas|	CTXFORBM-338551	75	3	Parcial	Avaliar
NICE - Gravador Legado | Multi operações | Perda de gravações | Não grava	CTXMLTREG-4321	70	-	Parcial	Sim
Citrix Web Apresentando travamento para site Santo Amaro	CTXRECSA-455619	27	0	Sim	Não
NOC | NGR | ECH | DAC MACKENZIE A | Possivel falha na carga de bilhetes ECH	CTXRJOMK-132213	22	2	Sim	Não
Vivo 360 | Vivo JP | Lentidão ao logar no sistema	CTXJPASA-5389	21	12	Parcial	Avaliar
Cielo | Fidelidade | URA | Atendimento | Ligação ficando muda/presa durante navegação	CTXSPOAL-105710	14	2	Sim	Sim
Aplicativo - Erro - IIS - AYTYCRM - Rede Card - Itaú	CTXRECSA-460002	13	-	Sim	Avaliar
APC - AVAYA| Bahia | Operações Oi ativo| Discador não realiza discagens|	CTXSALAS-163481	11	-	Sim	Não
NICE - Gravador NGR | Contax 2.0 | Falha em gravação e/ou recuperação de áudio | Multa	CTXMLTREG-6046	5	-	Parcial	Sim
NOC | AYTY DB | DBSCTX121SPODA |Alta reincidência de alarme em monitoração do NOC	CTXSPOAR-1215	5	0	Sim	Não
NOC | tClock (Contax) | Lentidão da ferramenta	CTXSPOAL-106681	5	-	Sim	Avaliar

CHACON | Consultoria Ilimitada

4. Incidentes de Alto Impacto por Responsável pela Solução
Janeiro de 2016

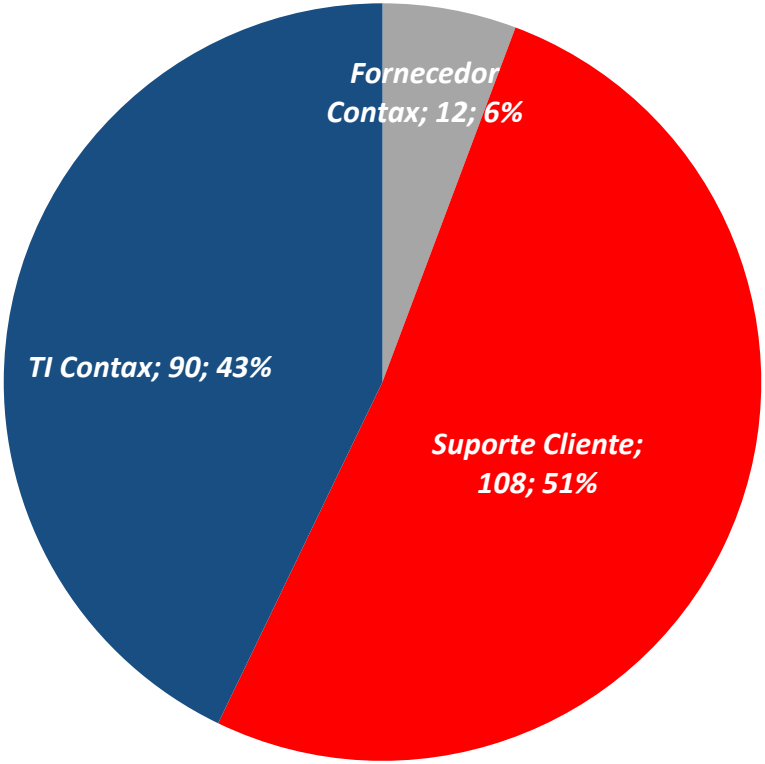

4. Incidentes de Alto Impacto por Responsável pela Solução
Janeiro de 2016


contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

	Todos		TI Contax		Suporte Cliente		Fornecedor Contax	
Cliente	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%
Oi	93	44,3%	39	43,3%	50	46,3%	4	33,3%
Vivo	29	13,8%	11	12,2%	16	14,8%	2	16,7%
Net	16	7,6%	1	1,1%	15	13,9%		
Santander	13	6,2%	9	10,0%	2	1,9%	2	16,7%
Bradesco	12	5,7%	6	6,7%	6	5,6%		
Itaú	9	4,3%	2	2,2%	7	6,5%		
Citibank	5	2,4%	1	1,1%	3	2,8%	1	8,3%
BV Financeira	4	1,9%	4	4,4%				
Cielo	3	1,4%	2	2,2%	1	0,9%		
Contax	2	1,0%	2	2,2%				
TAM	3	1,4%	1	1,1%			2	16,7%
Ticket Serviços	3	1,4%			3	2,8%		
Claro	2	1,0%	1	1,1%	1	0,9%		
Não Identificado	2	1,0%	2	2,2%				
Multi Clientes	3	1,4%	3	3,3%				
Prefeitura RJ	2	1,0%			2	1,9%		
Volkswagen	2	1,0%	1	1,1%	1	0,9%		
Alelo	1	0,5%	1	1,1%				
Banco do Brasil	1	0,5%					1	8,3%
Banco Toyota	1	0,5%			1	0,9%		
BB Mapfre	1	0,5%	1	1,1%				
Intermédica	1	0,5%	1	1,1%				
Interodonto	1	0,5%	1	1,1%				
Leader Magazine	1	0,5%	1	1,1%				
TOTAL	210		90		108		12	

5. Processo de Escalonamento de Incidentes Alto Impacto

Draft

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

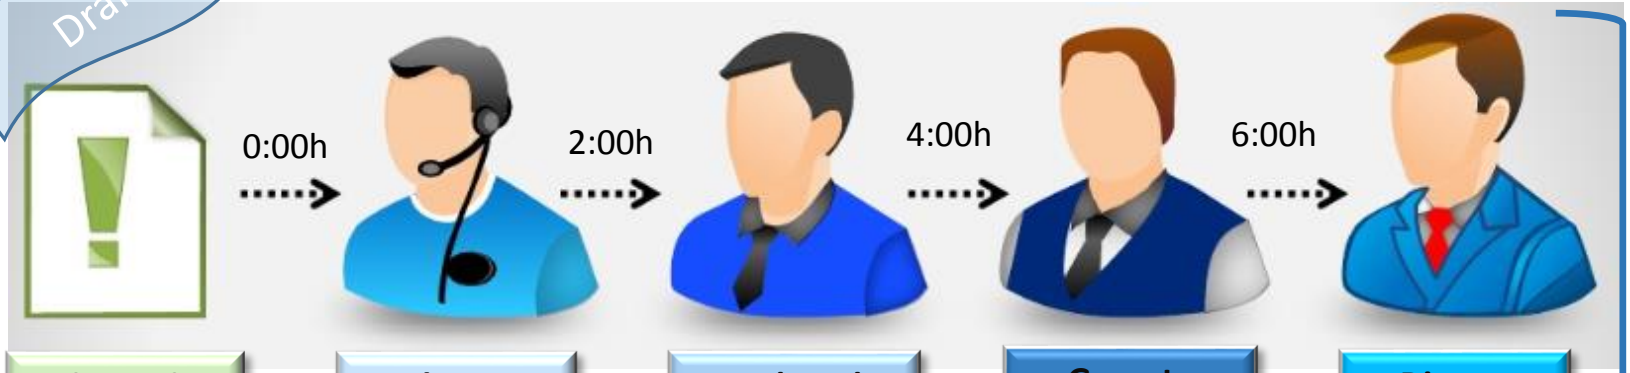

Cliente







Chamado

- **Critico**
- **Muito Alto**

Chamado com a descrição da situação detectada.

Técnico

Analisa o chamado.

Execução de procedimentos para resolver o incidente.

Coordenador

Validar alternativas para intervir no incidente. Elaborar uma analise técnica para a solução.

Gerente

Gerente é escalado. Decide se envolve parceiros e/ou fornecedores para resolver o problema.

Diretor

O Diretor é escalado para tomada de decisão executiva.

5. Processo de Escalonamento de Incidentes Alto Impacto

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Resultados do filtro: ALTO IMPACTO - Para Escalonamento - Coordenador - De 2 a 4 horas

Sem Solicitações

Resultados do filtro: ALTO IMPACTO - Para Escalonamento - Gerente - De 4 a 6 horas

T	Chave	Resumo	Imp	Cliente/Operação	Criado	Grupo Designado	Responsável	SLA	Sta
	CTXPOARB-102385	Ferramenta Amdocs com erro!		Net - Multifuncional N1	17/Fev/16	CSC - Alto Impacto	Renan Ribeiro Alberto	**Prazo:** 17/Feb/2016 10:00	

Exibindo as Solicitações **1** até **1** de **1** Solicitações encontradas.

Resultados do filtro: ALTO IMPACTO - Para Escalonamento - Diretor - De 6 a 24 horas

Sem Solicitações

6. Projeto: Multas de Gravação

Descritivo: Este projeto tem como escopo, executar um plano de ação para eliminar multas (de gravação) nos clientes Contax.
Vamos adotar o trabalho baseado em PPT (Pessoas – Processos – Tecnologia)

Pessoas

- Slide semanal de update do projeto (S.R).
- Comunicação do projeto para as pontas (sites).
- Processo de transição de serviços para atividades que se relacionem a mudanças no ambiente de gravação.
- Avaliar a necessidade de treinamento das equipes envolvidas no retrieval.

Processos

- Definir as prioridades.
- Levantamento dos contratos.
- Documentação do projeto.
- Definição de KPIs e indicadores
- (Valor de multas, quantidade, evolução por cliente).
- Revisão do processo de entrega (venda x delivery): É coeso? Possui risco? É exequível?
- Processo de transição de serviços para atividades que se relacionem a mudanças no ambiente de gravação
- Validação das multas aplicadas
- Sugestões de demais atividades processuais.

Tecnologia

- Raio X do ambiente de gravação
- Atrelar os chamados de ligações não recuperadas para problemas – Tratar todas chamadas não recuperadas.

6. Projeto: Multas de Gravação

Descritivo: Este projeto tem como escopo, executar um plano de ação para eliminar multas (de gravação) nos clientes Contax.
Vamos adotar o trabalho baseado em PPT (Pessoas – Processos – Tecnologia)

Pessoas | **Processos** | **Tecnologia**

Definição de papéis

Donaire – Demanda projeto (Sponsor)
Fabiana – Processos
Rogerio dos Santos – Tecnologia
Chacon – Pessoas / Processo
Marçal – Gestão do projeto
Stuart – Gestão do problema
Muto – Auditoria
Rafael Alves – Dono do processo

7. Projetos Estruturantes e Especiais

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Status do Projeto					Status das SCs			
Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos	Valor	Descritivo	Status das SCs
Portfólio de projetos Estabelização	45%	169 dias	Qua 14/10/15	Seg 06/06/16				
Projetos Estruturantes	43%	135 dias	Qua 14/10/15	Ter 19/04/16				
Proj Aspect 7.3 (infra)	40%	135 dias	Qua 14/10/15	Ter 19/04/16	Luiz Washington	N/A	N/A	N/A
Proj Gravacao (NICE) TAM e VIVO	25%	106 dias	Qua 14/10/15	Qua 09/03/16	Thiago Sousa	R$ 30.000,00	Aquisição de 12 HDs	SC 775 - A equipe de suprimentos/Aquanima esta alinhando a entrega dos equipamentos com o fornecedor
Proj Monitoração	61%	99 dias	Qua 14/10/15	Seg 29/02/16		N/A	N/A	N/A
Proj Monitoração (Dell-Open Manager)	73%	95 dias	Qua 14/10/15	Ter 23/02/16	Julio Cesar;Thiago Sousa	N/A	N/A	N/A
Proj Monitoração (Zabbix)	49%	96 dias	Seg 19/10/15	Seg 29/02/16	Thiago Sousa;Julio Cesar	R$ 19.000,00	Consultoria e certificação ZABBIX	SC 750 - A Aquanima iniciou o processo de concorrencia. Aguardamos resultado.
Proj Redundância links MPLS	20%	65 dias	Ter 01/12/15	Seg 11/04/16	Luis Marçal	N/A	N/A	N/A
Proj Backups Ambiente de Produção	53%	122 dias	Qua 14/10/15	Qui 31/03/16	Poubel, Rafael	N/A	N/A	N/A
Projetos Especiais	60%	42 dias	Sex 04/12/15	Seg 01/02/16		N/A	N/A	N/A
Proj OCS Inventory	60%	42 dias	Sex 04/12/15	Seg 22/02/16	Thiago Sousa	N/A	N/A	N/A
Projetos Novos	0%					N/A	N/A	N/A
Proj Multas Gravação	0%				Luis Marçal	N/A	N/A	N/A
Projetos temporariamente suspensos	20%	165 dias	Ter 20/10/15	Seg 06/06/16				
Proj Ura Internalização	20%	165 dias	Ter 20/10/15	Seg 06/06/16	Luis Marçal	R$ 75.000,00	Capacitação equipes de suporte e certificação	SC 784 e 785 - Processo Concluído



7. Projeto: Proj Aspect 7.3 (infra)

Projeto: Proj Aspect 7.3 (infra)
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 29-02-2016
Progresso: 40%
PM: Luiz Washington



Descritivo: Este projeto tem como escopo, preparar/adequar toda a infra de HW para instalar a versão 7.3 do Aspect. O objetivo é a permitir o alinhamento de toda a plataforma Aspect da Contax.

Último Status

- ✓ Validação do ambiente
- ✓ Início dos entendimentos para definição de qual polo será migrado

Objetivos alcançados na última semana

- Configuração dos UMS.
- Definição do primeiro polo a ser migrado: Polo Belo Horizonte.
- Iniciado contatos com fornecedores para adequação de integração (Ayty e TQS)
- Definição da data de encerramento da migração – até 20/05

Riscos/Problemas/Observações

- Não foi possível "rodar" a ferramenta APEA para validação final do ambiente – Não foi possível segregar o acesso. Pré-requisito para inicio das instalações – Definição de solução alternativa para o dia 17/02.
- Definição das datas de migração das Operações.
- Alinhamento com o Planejamento
- Contratação de troncos.
- Definição de treinamento

7. Projeto: Gravação (Nice) TAM e VIVO

Projeto: Gravacao (NICE) TAM e VIVO
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 25-03-2016
Progresso: 26%
PM: Julio Cesar e Thiago Augusto



Descritivo: Este projeto tem como escopo, adequar infra de HW para instalar 3K licenças de gravação , atualmente sem uso.

Último Status

- Aguardamos a entrega dos 12 HDs

Objetivos alcançados na última semana

- Recebemos o numero do pedido de Suprimentos.

Riscos/Problemas/Observações

- Processo de compras demorado.
- SC 775 - A equipe de suprimentos/Aquanima esta alinhando a entrega dos equipamentos com o fornecedor.

67 Projeto: Monitoração Dell – Open Manager

Projeto: Monitoração (Dell-Open Manager)
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 23-04-2016
Progresso: 61%
PM: Júlio Cesar e Thiago Augusto



Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware para eliminar a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Último Status

- Concluir/corrigir a execução da Gmud de abertura de Vlans, para permitir o cadastro de equipamentos.

Objetivos alcançados na última semana

- Continuação do cadastro de equipamentos na ferramenta por agrupamento de Vlans.

Riscos/Problemas/Observações

- Processo de liberação das redes foi complexo.

7. Projeto: Monitoração Zabbix

Projeto: Monitoração Zabbix
Data Inicio: 19-10-2015
Data Conclusão: 29-02-2016
Progresso: 49%
PM: Júlio Cesar e Thiago Augusto



Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware e elimina a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Último Status

- Aguardamos aprovação de verbas para treinamento da equipe.
- ✓ Continuação de cadastro de equipamentos.

Objetivos alcançados na última semana

- Continuação de cadastro pontual de equipamentos.

Riscos/Problemas/Observações

- Risco: Perda de proficiência na ferramenta for falta de treinamento.
- SC 750 - A Aquanima iniciou o processo de concorrência. Financeiro aguarda retorno.

7. Projeto: Redundância links MPLS

Projeto: Redundância links MPLS
Data Inicio: 01-12-2015
Data Conclusão: 11-04-2016
Progresso: 21%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Para dar **resposta imediata** a situações recorrentes de incidentes, relacionados com a perda de **Links** que interligam os sites da Contax, este projeto visa, **Garantir e documentar a funcionalidade da contingência e** validar caminhos possíveis e documentar ações.

Último Status

- ✓ Foi realizado com sucesso o teste de redundância de MPLS no site Navegantes (GMUD 19350)

Objetivos alcançados na última semana

- No site Navegantes no dia 18 de Fevereiro vai ser efetuada a correção /configuração nos equipamentos da VIVO para 400MB (GMUD 19412)

Riscos/Problemas/Observações

- Foi detectado que a banda contratada (25-06-2015) para o link MPLS VIVO no Site Navegante é de 400MB. Atualmente os equipamentos estão configurados para 100MB.

7. Projeto: Backups Ambiente de Produção

Projeto: Backup & Restore Ambiente de Produção

Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 31-03-2016
Progresso: 53%
PM: Poubel e Rafael



Descritivo: Providenciar Backup em todos os equipamentos de produção da Contax. Garantir plano de restore do ambiente.

Último Status

- ✓ Backup realizado em 52% do parque
- ✓ Licença da *feature* ArcServe UDP recebida
- ✓ Instalação do piloto do ArcServe UDP para teste de backup e restore de ambientes Windows e Linux (Virtuais e Físicas) – Em andamento

Objetivos alcançados na última semana

- Continuação da execução de Backups do ambiente de produção da Contax.
- Apoio da Regional NE e MG para suporte e discovery dos servidores nos sites
- Centralizado os servidores do SPOAS e um servidor do SPOAL apontando para o DC
- Plano de restore iniciado

Riscos/Problemas/Observações

- Queda na aderência de backup devido as desmobilizações de sites sem nossa ciência.
- Baixo índice de aderência no plano de restore devido a falta de infra.
- Armazenamento indevido das mídias causando degradação das mesmas.

7. Projeto: OCS Inventory

Projeto: OCS Inventory
Data Inicio: 04-12-2015
Data Conclusão: 22-02-2016
Progresso: 60%
PM: Thiago Augusto



Descritivo: O OCS é uma ferramenta de Inventário de servidores para auxiliar a equipe de Controle de Ativos.

Último Status

- ✓ Ativos cadastrados no OCS: 3576/6476.

Objetivos alcançados na última semana

- Continuação de cadastramento de ativos.

Riscos/Problemas/Observações

- Faltam cadastrar:
  - 1200 servidores Windows.
  - 1000 Linux.
  - 700 Outros ativos

7. Projeto: Ura Internalização

Projeto: Ura Internalização
Data Inicio: 20-10-2015
Data Conclusão: 06-06-2016
Progresso: 20%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware e elimina a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Último Status

- Aguardando definição da estrutura que será responsável por assumir os serviços de suporte dessa Internalização. Pendente de uma definição do Rivaldo e Koreeda.

Objetivos alcançados na última semana

- ✓ Confirmado dia 16 o recebimento da Genesys do pedido para treinamento.
- ✓ SC 784 e 785 - Processo Concluído.

Riscos/Problemas/Observações

- Risco: Prazo de treinamento vencido esta semana.
- Existe ainda a pendência de definição de qual equipe será treinada. Depende de uma conversa do Rivaldo com o Koreeda.

8. Alinhamento

