

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Contact Center

Estabilidade Operacional

22.Março.2016



contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Índice

1. Indicadores – Incidentes de Alto Impacto
2. Indicadores – Total de Incidentes
3. Gestão de problemas – Dashboard e Indicadores
4. Tempo médio entre falhas
5. Incidentes resolvidos de Alto Impacto
6. Projetos Estruturantes e Especiais
7. Alinhamento


1. Indicadores: Incidentes Alto Impacto

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Volume de Incidentes Alto Impacto

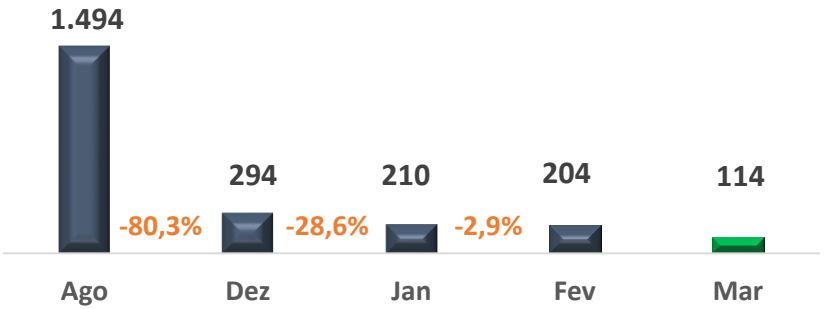

Média diária de Incidentes Alto Impacto

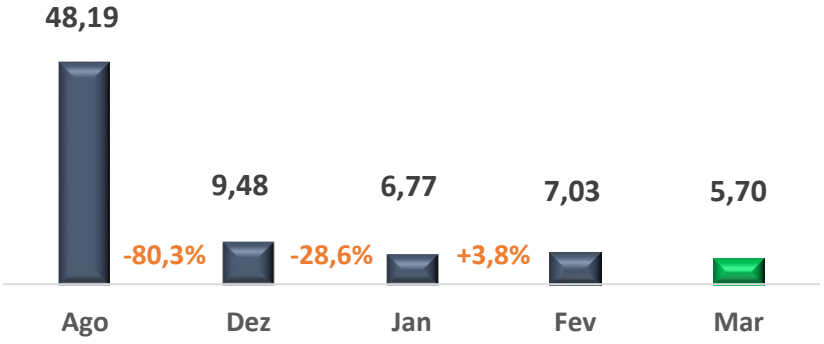


Redução Consolidada Agosto-15 a Fevereiro-16 **- 86,35%**

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01/03 a 20/03.

CHACON | Consultoria Ilimitada

2. Indicadores: Total de Incidentes

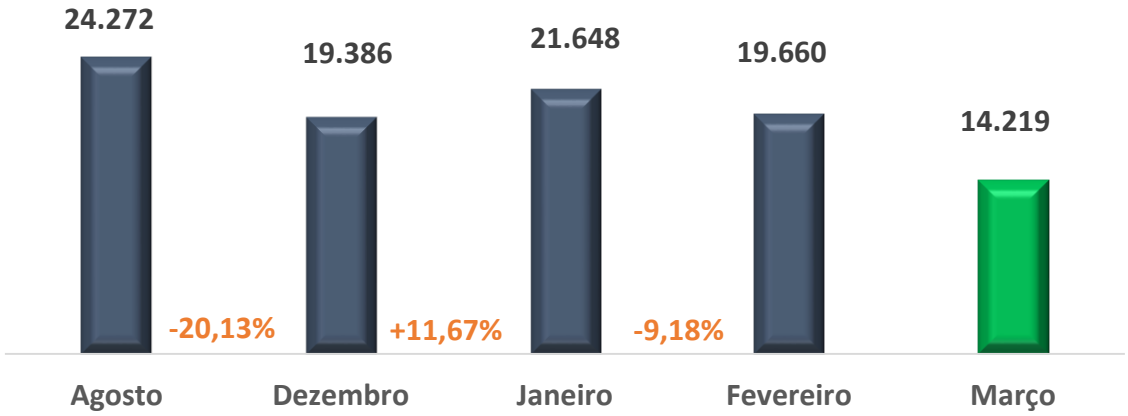


Mar - 31 dias	Real	Projeção	Meta	Desvio	Farol
Total	**14.219**	**21.330**	**19.246**	**10,8%**	✗
Alto	114	206	**250**	-17,4%	✓
Médio	8.045	12.319	**11.402**	8,0%	✗
Baixo	6.060	8.804	**7.594**	15,9%	✗

Ações

- Catálogo de Serviços;
- Ação de Investigação dos Ofensores junto aos Sites;
- Gestão de Problemas;
- Projetos de Estabilização;
- GEROT Diária de Incidentes;
- Gestão de Vulnerabilidades;
- Política de Mudanças (Mudança Técnica).
- Gerot sites para médio e baixo impacto (em planejamento).


Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01/03 a 20/03.

3. Gestão de Problemas - Dashboard

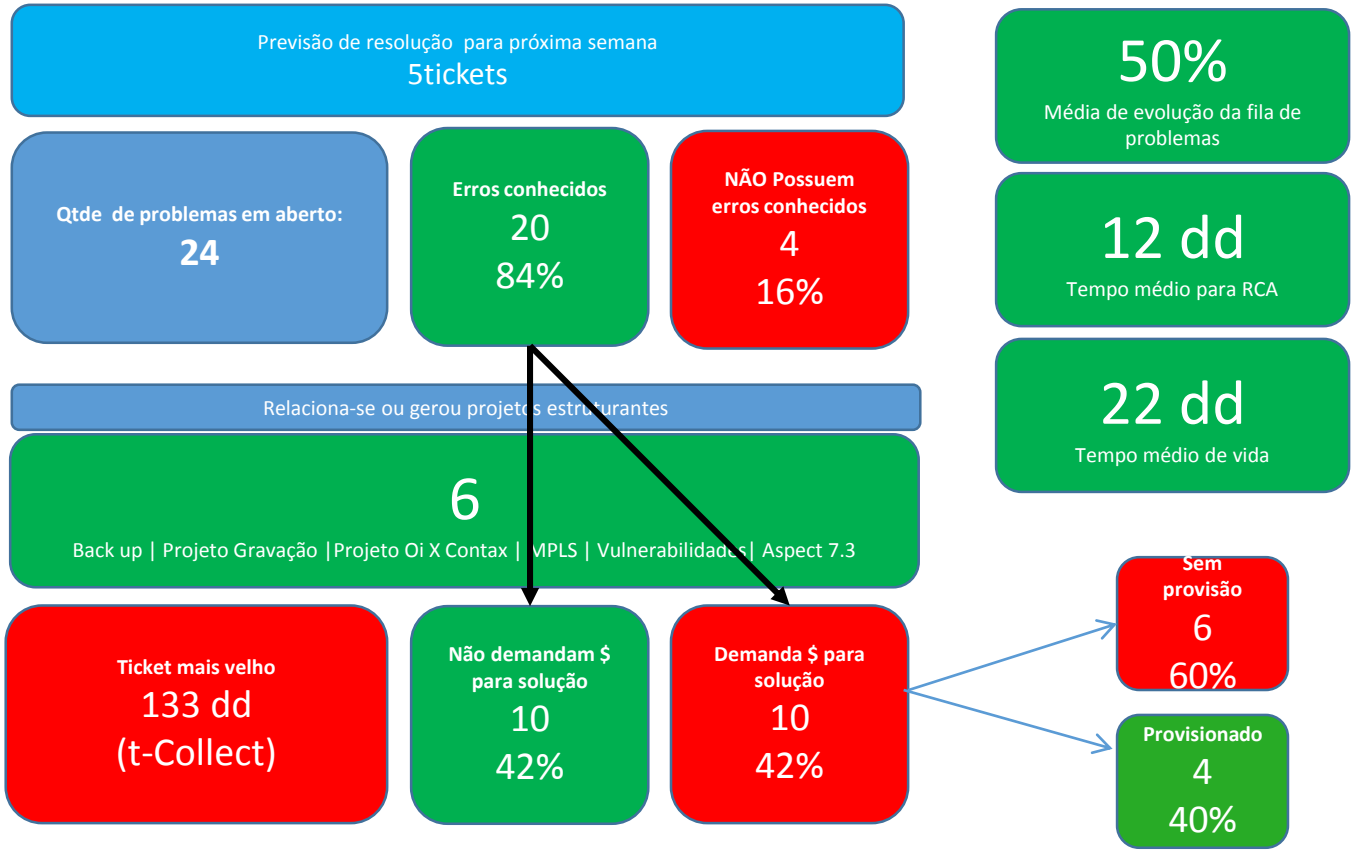

3. Gestão de Problemas - Indicadores

Status - Problemas

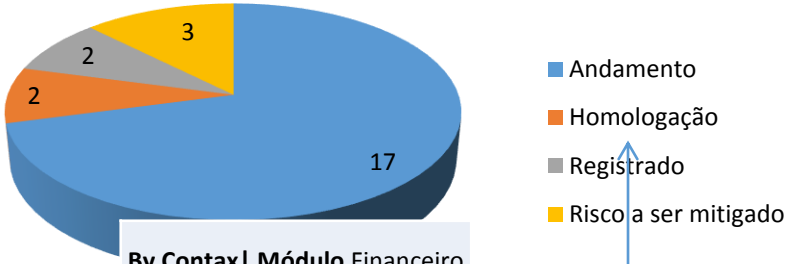


By Contax| Módulo Financeiro New Age | Vulnerabilidade de suporte especializado

Webchat Genesys |Pernambuco |Site Oi Chat R1 e R2 indisponíveis


DNK URA |Cielo | Fidelidade |Ligação ficando muda/presa durante navegação

Problem Owners	Qtde
Aplicações - Camila Firmiano	1
Aplicações - Vicente	1
Cliente Oi - Sabrina	1
CSC Noc - Katia Lustosa	1
CSE Discadores - Alexandre Yukio	1
CSE Discadores - Leleco	1
CSE Discadores - Vinicius Cruz	1
CSE Gestão - Célio Andrade	1
CSE Redes - Rogério Santos	1
Engenharia - Felipe Villa	1
Engenharia - Klaus	1
Engenharia - Villa	1
Gestão de Problemas - Stuart Faria	2
Não atribuído	2
Produção - Rafael Alves	2
Sites - Alexandre Gustavo	1
Sites - Rafael Correa	1
Sites - Rogério Mendonça	1
Telecom - Felipe Villa	1
Projetos - Thiago Ferreira	1
CSC Noc - Dennys	1


4. Tempo médio entre falhas

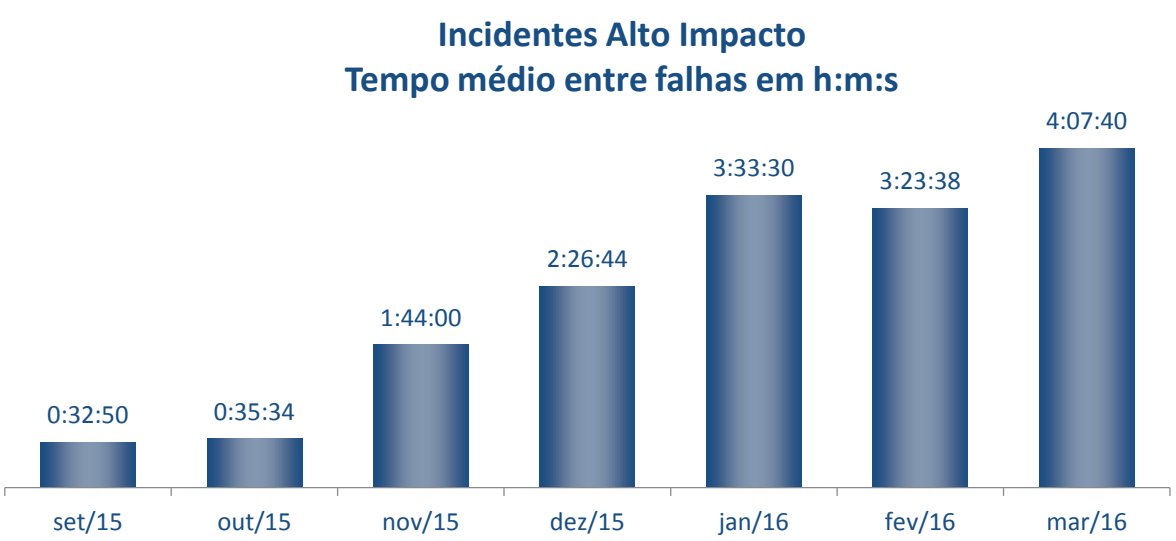


Responsabilidade da TI Contax



Responsabilidade do Suporte do Cliente




Responsabilidade do Fornecedor Contax




O cálculo foi realizado considerando **todos** os chamados de Incidentes Alto Impacto (Críticos + Alto impacto)


4. Tempo médio de Recuperação

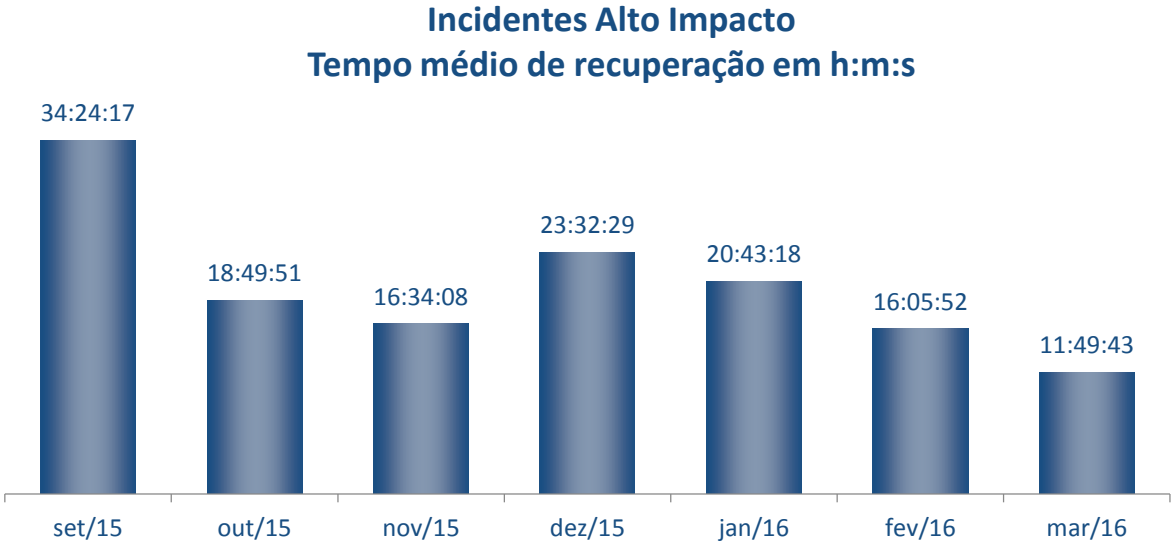


Responsabilidade da TI Contax



Responsabilidade do Suporte do Cliente



Responsabilidade do Fornecedor Contax



O cálculo foi realizado considerando **todos** os chamados de Incidentes Alto Impacto (Críticos + Alto impacto)

5. Incidentes Resolvidos de Alto Impacto

De 01 a 20 de março de 2016

Responsável pela Solução	Quantidade	%
TI Contax	56	49,1%
Suporte Cliente	45	39,5%
Fornecedor Contax	13	11,4%
Total	114	

TI Contax		
Tipo	Quantidade	%
Software	25	44,6%
Hardware	15	26,8%
Processo	11	19,6%
GMUD	3	5,4%
Manutenção	1	1,8%
Em análise	1	1,8%
Total	56	

Suporte Cliente		
Tipo	Quantidade	%
Software	33	73,3%
Rede	3	6,7%
Infra	2	4,4%
Processo	2	4,4%
Telecon	2	4,4%
Gravador	1	2,2%
Hardware	1	2,2%
Link	1	2,2%
Total	45	

Fornecedor Contax		
Tipo	Quantidade	%
Software	7	53,8%
Rede	4	30,8%
Link	1	7,7%
Suprimento	1	7,7%
Total	13	

5. Incidentes Resolvidos de Alto Impacto

De 01 a 20 de março de 2016

TI Contax		
Tipo	Quantidade	%
Software	25	44,6%
Hardware	15	26,8%
Processo	11	19,6%
GMUD	3	5,4%
Manutenção	1	1,8%
Em análise	1	1,8%
Total	56	

Software		
Tipo	Quantidade	%
Gravador	8	32,0%
Discador	2	8,0%
Front Fácil	2	8,0%
Nice	2	8,0%
tCollet	2	8,0%
AES	1	4,0%
Ayty	1	4,0%
Carga	1	4,0%
Proxy	1	4,0%
Rede	1	4,0%
SCAI	1	4,0%
Telefonia	1	4,0%
tIntegra	1	4,0%
URA	1	4,0%
Total	25	

Hardware		
Tipo	Quantidade	%
Discador	6	40,0%
Rede	2	13,3%
Telecon	2	13,3%
Cabo	1	6,7%
Gravação	1	6,7%
Memória	1	6,7%
Switch	1	6,7%
Telefonia	1	6,7%
Total	15	

Processo		
Tipo	Quantidade	%
Operacional	5	45,5%
Planejamento	4	36,4%
CMS	1	9,1%
NID	1	9,1%
Total	11	

GMUD		
Tipo	Quantidade	%
Falha	1	33,3%
Processo	1	33,3%
Rede	1	33,3%
Total	3	

6. Projeto: Aspect 7.3 (infra) System 1

Projeto: Proj Aspect 7.3 (infra)
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 31-03-2016
Progresso: 75%
PM: Luiz Washington



Descritivo: Este projeto tem como escopo, preparar/adequar toda a infra de HW para instalar a versão 7.3 do Aspect para 2000 PAs.

Último Status

- Finalização Validação da Plataforma pela Aspect.

Objetivos alcançados na última semana

- Gmud realizada com sucesso para upgrade na versão de VMW.
- Gmud planejada para esta semana de incremento de memória.
- Hoje vamos realizar uma reunião para estimar datas de migração do polo BH, Santander e novas operações.

Riscos/Problemas/Observações

Obs:

- A Aspect vai realizar treinamento de 2 elementos, sem custos.

6. Projeto: Gravação (Nice) TAM e VIVO

Projeto: Gravacao (NICE) TAM e VIVO
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: ~~25-03-2016~~ 25-04-2016
Progresso: 26%
PM: Thiago Augusto



Descritivo: Este projeto tem como escopo, adequar infra de HW para instalar 3K licenças de gravação , atualmente sem uso.

Último Status

- Roberto Elias acordou com a TAM a entrega para a 3° semana de Abril

Objetivos alcançados na última semana

- Aguardamos a entrega dos 12 HDs

Riscos/Problemas/Observações

- Processo de compras demorado.
- SC 775 - A equipe de suprimentos/Aquanima nova entrega estimada para a 1° semana de Abril.

6. Projeto: Monitoração Dell – Open Manager

Projeto: Monitoração (Dell-Open Manager)
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 22-04-2016
Progresso: 75%
PM: Júlio Cesar



Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware para eliminar a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Último Status

- Em execução o cadastramento de vlans de servidores (Total).

Objetivos alcançados nas últimas duas semanas

- Homologação do SW.
- **Aceitação das regras de liberação por SI.**

Riscos/Problemas/Observações

- Servidores sem client OMSE.

6. Projeto: Monitoração Zabbix

Projeto: Monitoração Zabbix
Data Inicio: 19-10-2015
Data Conclusão: 23-04-2016
Progresso: 49%
PM: Júlio Cesar



Descritivo: Monitoração pró ativa, que elimina a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Último Status

- ✓ Agendado o treinamento e a Consultoria:
  - Treinamento: 11 a 15/04
  - Consultoria: 18 a 23/04

Objetivos alcançados na última semana

- Geração de pedido

Riscos/Problemas/Observações

- N/A.

6. Projeto: Redundância links MPLS

Projeto: Redundância links MPLS
Data Inicio: 01-12-2015
Data Conclusão: ~~11-04-2016~~ 31-06-2016
Progresso: 27%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Para dar **resposta imediata** a situações recorrentes de incidentes, relacionados com a perda de **Links** que interligam os sites da Contax, este projeto visa, **Garantir e documentar a funcionalidade da contingência e** validar caminhos possíveis e documentar ações.

Último Status

- Encontramos uma inconsistência no roteamento no acesso do Site JP com o Site Niterói. Trata-se de um problema que pode afetar não somente o Site JP, mas também outros Sites que usem links da OI. Estamos analisando a situação para programar GMUD corretiva.


Objetivos alcançados na última semana

- Teste de redundância de MPLS realizado com sucesso no sites **Aurora.**

Riscos/Problemas/Observações

- Foi detectado que a banda contratada (25-06-2015) para o link MPLS VIVO no Site Navegante é de 400MB. Atualmente os equipamentos estão configurados para 100MB.

6. Visão Macro - Cenário Atual

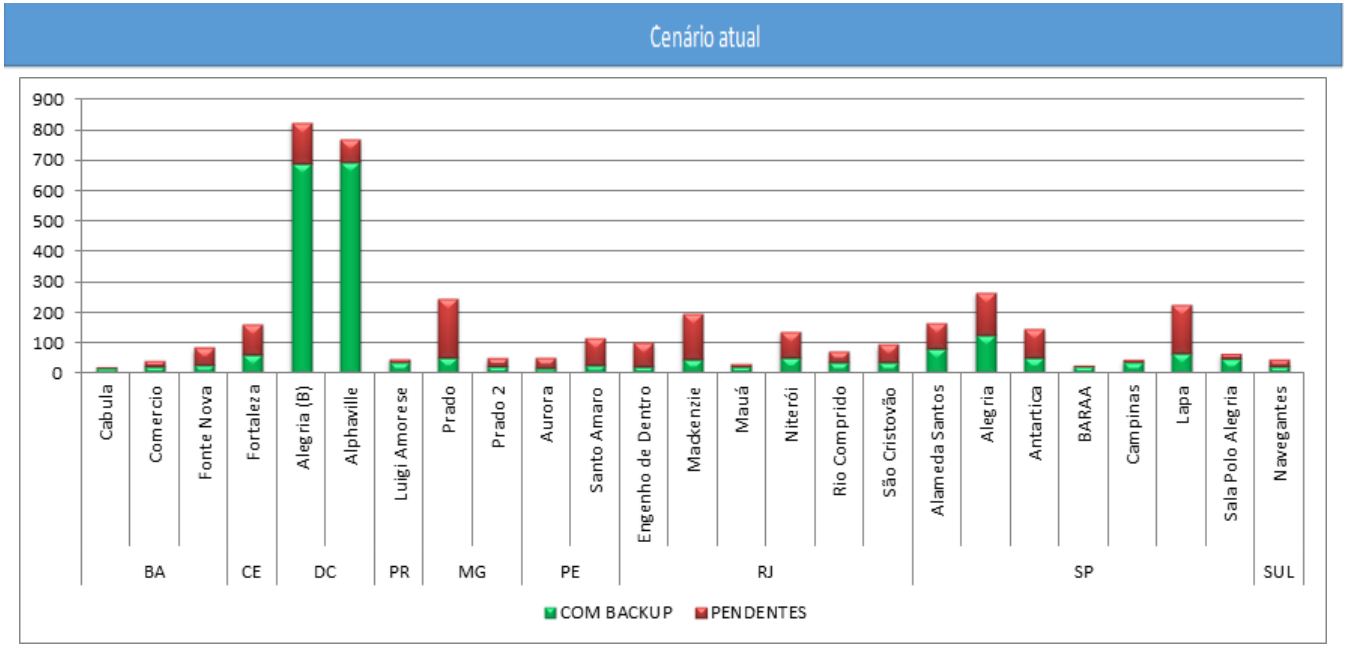


4024 servidores mapeados	2327 servidores incluídos	1697 servidores pendentes de backup

6. Report - Site a Site

REGIONAL	SITE	TOTAL	COM BACKUP	PENDENTES	ADERENCIA	EVOLUÇÃO	OBSERVAÇÃO
BA	Cabula	17	16	1	94,12%	0	
	Comercio	42	22	20	52,38%	3	
	Fonte Nova	85	29	56	34,12%	0	
CE	Fortaleza	162	61	101	37,65%	-9	correção de inventário
DC	Alegria (B)	824	690	134	83,74%	0	
	Alphaville	770	692	77	89,87%	1	
PR	Luigi Amorese	48	36	12	75,00%	0	
MG	Prado	246	53	193	21,54%	2	
	Prado 2	50	23	27	46,00%	0	
PE	Aurora	51	16	35	31,37%	2	
	Santo Amaro	114	28	86	24,56%	0	
RJ	Engenho de Dentro	100	23	77	23,00%	0	
	Mackenzie	196	45	151	22,96%	1	
	Mauá	32	21	11	65,63%	-2	correção de inventário
	Niterói	137	51	86	37,23%	11	
	Rio Comprido	72	35	37	48,61%	6	
	São Cristóvão	94	35	59	37,23%	4	
SP	Alameda Santos	165	81	84	49,09%	0	
	Alegria	264	125	139	47,35%	5	
	Antártica	146	50	96	34,25%	0	
	BARAA	29	24	5	82,76%	0	
	Campinas	44	35	9	79,55%	23	
	Lapa	226	65	161	28,76%	0	
	Sala Polo Alegria	64	48	16	75,00%	11	
SUL	Navegantes	45	23	22	55,00%	0	

6. Evolução

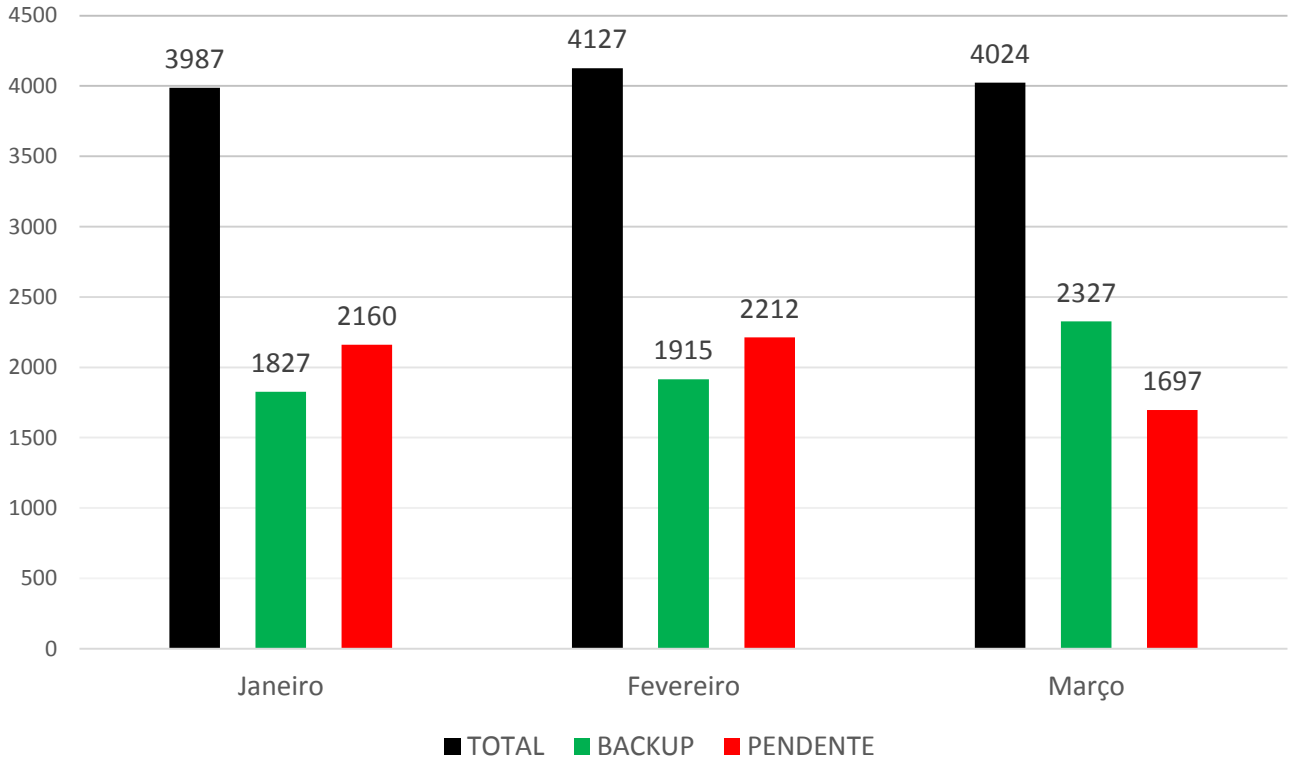
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3987
1827
2160
4127
1915
2212
4024
2327
1697
Janeiro
Fevereiro
Março
TOTAL
BACKUP
PENDENTE

6. Detalhamento - Ofensores

Ofensores

RJ

- SC 246 aberta para transporte do robô de Alegria para Engenho de dentro - Aguardando aprovação do Bourboun
- SC 245 aberta para aquisição de fitas para backup da regional
- Reparo de três robôs da Mackenzie parados
  - 2 x TL 2000 - Necessário um servidor para plugar os robôs afim de realizar os testes solicitados, então gerar o orçamento junto a DELL
  - TL 4000 – Magazine travada pelo braço, realizando os testes junto a DELL antes da visita técnica
- Troca do robô do site de São Cristóvão pelo robô do site Mauá

SP

- Falta de fita na regional SP
- Reparo de robô no site Alegria, enviado o orçamento ao site para aprovação do custo
- Robô no site Lapa sem magazine, porém instalado e sem uso.

Engenharia

- Sem prioridade nas criações de rede de backup nos Data Centers
- Sem licença do Data Protector para inclusões de novos backups.
  - Solicitado o orçamento para aumento de licenças para zerar GAP negativo


CSE

- Sem acesso a instalação dos agentes, retardando o serviço de inclusão de servidores até o atendimento do chamado.

CONTAX

- Equipamentos sem garantia
- Sem local adequado para a armazenar as fitas
- Apenas Mackenzie e São Cristóvão possuem rede de backup apartada sem onerar o site;
- Encontrado 04 robôs no Lapa sem uso, solicitado envio para o Alegria afim de testá-los e disponibilizar para os sites.

6. Time Line

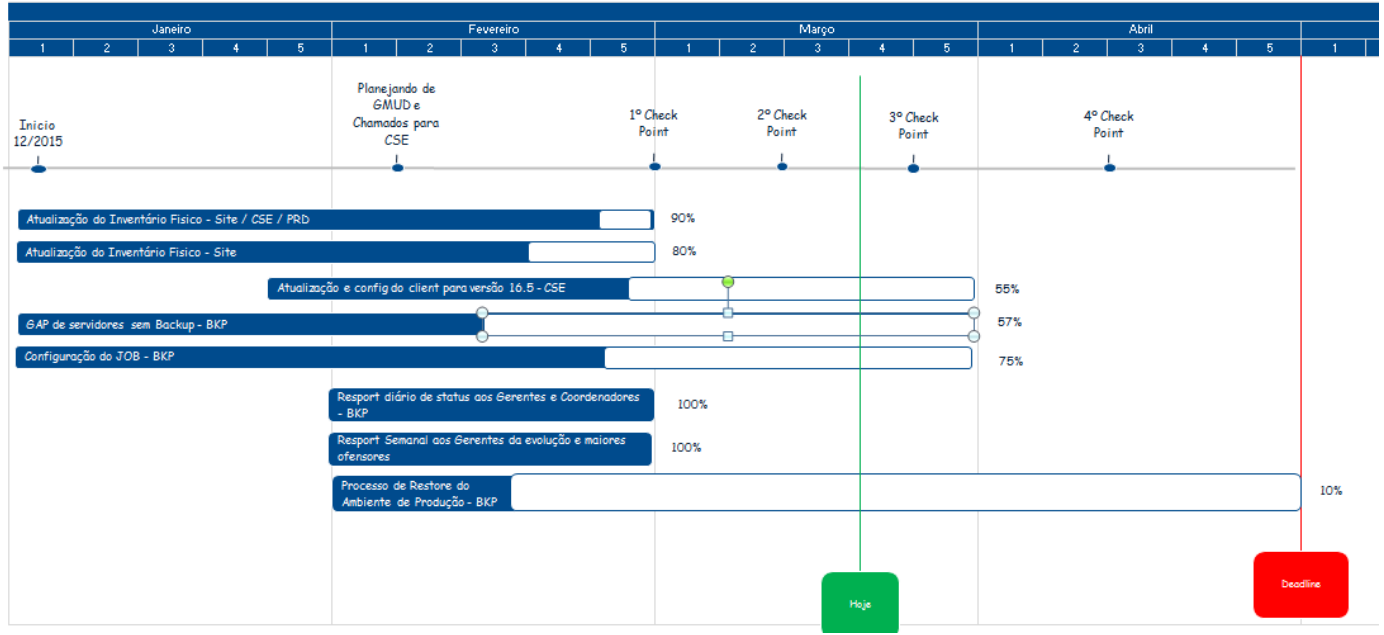
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
Inicio
12/2015
Planejando de GMUD e Chamados para CSE
1º Check Point
2º Check Point
3º Check Point
4º Check Point
Atualização do Inventário Fisico - Site / CSE / PRD
90%
Atualização do Inventário Fisico - Site
80%
Atualização e config do client para versão 16.5 - CSE
55%
GAP de servidores sem Backup - BKP
57%
Configuração do JOB - BKP
75%
Resport diário de status aos Gerentes e Coordenadores - BKP
100%
Resport Semanal aos Gerentes da evolução e maiores ofensores
100%
Processo de Restore do Ambiente de Produção - BKP
10%
Hoje
Deadline

6. Projeto: OCS Inventory

Projeto: OCS Inventory
Data Inicio: 04-12-2015
Data Conclusão: 14-04-2016
Progresso: 73%
PM: Thiago Augusto



Descritivo: O OCS é uma ferramenta de Inventário de servidores para auxiliar a equipe de Controle de Ativos.

Último Status

- ~~✓ Ativos cadastrados no OCS: 4.001/6.476 (08/03/2016).~~
- ✓ Ativos cadastrados no OCS: 4.344/6.476 (21/03/2016).
- ✓ Evolução de ~~(220~~) 344 media de 34 por dia.

Objetivos alcançados na última semana

- Customização para alocar informações dos contratos de manutenção dos servidores.
- Customização para alocar a certidão de nascimento dos equipamentos.

Riscos/Problemas/Observações

- Velocidade de evolução da instalação é afetada de acordo com instabilidade do ambiente.
- Conflitos entre prioridades do gestor de projetos (pré-vendas Contact Center/IT e Estabilidade operacional).
- Tivemos incidentes de alto impacto que nos afetou a produtividade.
- Tivemos a ausência por 03 dias do recurso que está dedicado ao projeto.

6. Projeto: Ura Internalização

Projeto: Ura Internalização
Data Inicio: 20-10-2015
Data Conclusão: 06-06-2016
Progresso: 20%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware e elimina a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Último Status

- A equipe do José Carlos será responsável pelo suporte deste ambiente.
- SC 784 e 785 - Processo Concluído.

Objetivos alcançados na última semana

- Inicio da passagem de "testemunho" da equipa do Boarim para José Carlos.

Riscos/Problemas/Observações

- Obs: Projeto esteve parado até definição de nova estragia. O cronograma terá de ser atualizado.

6. Projeto: Qualidade em Gravação

Projeto: Qualidade em Gravação
Data Inicio: 24-02-2016
Data Conclusão: 23-05-2016
Progresso: 41%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Este projeto tem como escopo, executar um plano de ação para eliminar multas (de gravação) nos clientes Contax.

Último Status

- Realização de reuniões semanais com a equipe de projeto.

Objetivos alcançados na última semana

- 1ª publicação do Dashboard de Retrieval
- Desenvolver ferramenta para registro de resgates.
- Análise para realização de Merge da APP PAINEL de produção e CSE.

Riscos/Problemas/Observações

Obs: Entendimento de todos os contratos poderá ser mais “complicado” que o esperado.

8. Alinhamento





