

Contact Center

Gerenciamento de Problemas

09 Outubro 2015




contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Índice


1. Indicadores
2. Status
3. Problemas – Solução Definitiva
4. Ações previstas
5. Alinhamento
6. Fichas técnicas


.


1. Indicadores

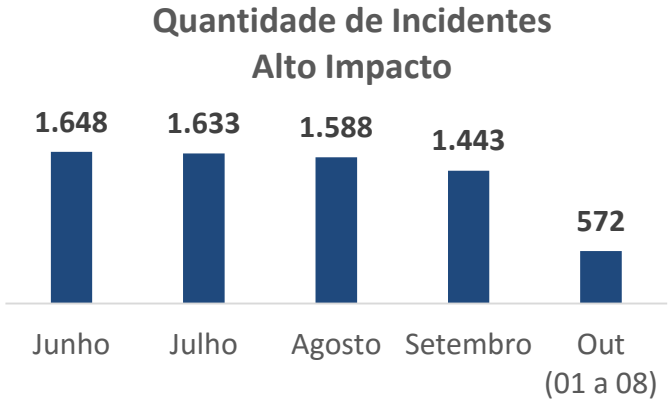



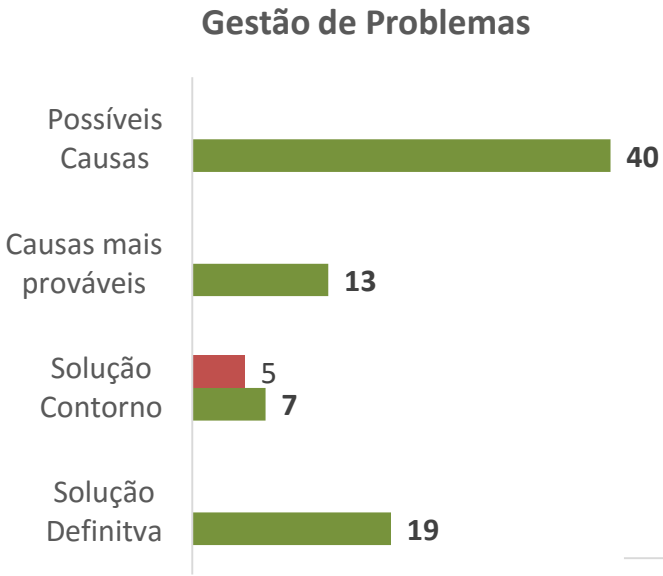

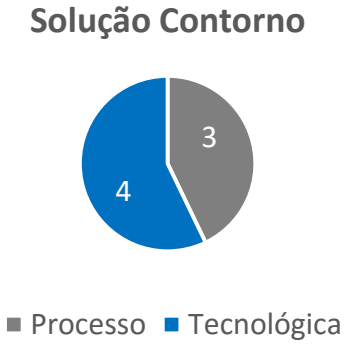

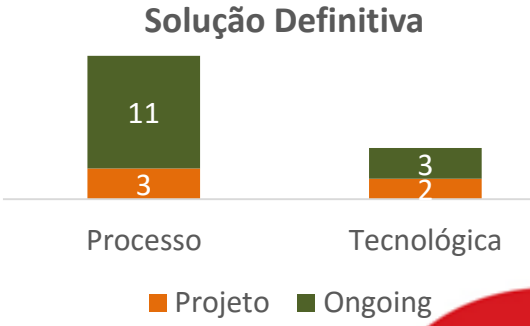

2. Status

Status dos principais “problemas” identificados

2.1 . NICE - Gravações > Não grava > Perda de Gravação

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Categoria	Tarefa	Prioridade	Data limite	Data efetiva	Responsável	Status	Comentário
Alinhamento	Criação de uma campanha de conscientização e comunicação dos impactos e eventuais penalizações	Muito Alta	**N/A**		**Sem responsável**	Congelado	**Havia sido sugerido o nome da Fabiana Dias, em contato com a Fabiana, ela achou importante, porém sugeriu alinhar com o Rivaldo**
Processo	Confirmar se existe a categoria de movimentação de ramal no tprocess	Muito Alta	**8/10**	**8/10**	Chacon Consultoria	Concluída	Existe a categoria " Requisição" -> Alterar ramal
Processo	Estabelecimento de metodologia / procedimento padrão para recuperação de desastre	Muito Alta	**16/10**		Fabrine Alvim	Atrasada	Atividade atrasada. Reprogramada para 16/10
Processo	Incluir o procedimento de restart do serviço VRSP, em caso de indisponibilidade SBC	Média	**13/10**		Thiago Belico	Ñ inciado	Alinhar com o Belico
Processo	Estabeler modelo de mudança para evidência de teste de redundância	Muito Alta	**6/11**		Daniel Donaire	Ñ inciado	Alinhar com o Donaire
Compra /Aquisição	Elaboração de "business case" para defesa de investimento em ZABBIX	Alta	**15/10**		Thiago Augusto	Em andamento	Realinhado para 15/10
Tecnologia	Proposta de migração clientes criticos de legado para modelo 2.0	Muito Alta	**8/10**	**8/10**	Thiago Augusto	Conluído	

Projeto Gravação

Projeto Gravação

Problemas:
- Perda de gravação
- Não grava

Efeito:
- Perda financeira (Informação disponível R$22M - JAN~JUN)
- Perda de credibilidade

Solução definitiva:
- Utilizar polo de gravadores Contax 2.0
  - Dispõe de 3K licenças de gravação (Sem uso)
  - 200TB de Storage centralizado (*3K P.A. em 1 Ano)

Investimento P/ 3k P.A.:
- Compra de loggers para captura do áudio no site (R$25k P/ 500 P.A.);
- Equipamentos de Rede para gravadores (A avaliar);

Investimento migrar restante do parque 6.5K P.A
- Negociar upgrade e migração das licenças da plataforma obsoleta para o polo Contax 2.0.
- Upgrade de Storage;
- Compra de loggers;
- Equipamentos de Rede;

1. Prós

Soluciona os seguintes problemas:
- Perda de gravação por armazenamento obsoleto;
- Falta de contrato de manutenção com fornecedor;
- Elimina a necessidade de retrieval por fita;
- Bugs das plataformas atuais (8.x/3.0/3.1/3.4/3.5);
- Permite a busca de chamadas por login full;

Ganhos
- Reduz a carga elétrica no DataCenter;
- Gerenciamento centralizado;
- Padronização do Parque;
- Maior disponibilidade;

2. Contras

- Aumenta a necessidade de recursos de rede;
- Demanda investimento;
- Médio prazo de implementação;


*Solução elaborada pelos times Engenharia IT/ CSE / Engenharia

Topologia Projeto Gravação

Etapas:

1. Reestruturar Nice Contax 2.0;
2. Definir clientes/operações;
3. Avaliar capacidade técnica;
    - Rede
    - DAC
    - Logins
4. Elaborar o LLD;
5. Ciclo de projeto;
6. Desativar a função de gravar Nice legado;

*Nosso objetivo é que a plataforma seja implementada em paralelo a plataforma atual, após todos os Juntos ao cliente e as aeras envolvidas, deste modo será uma transição indolor para o cliente.

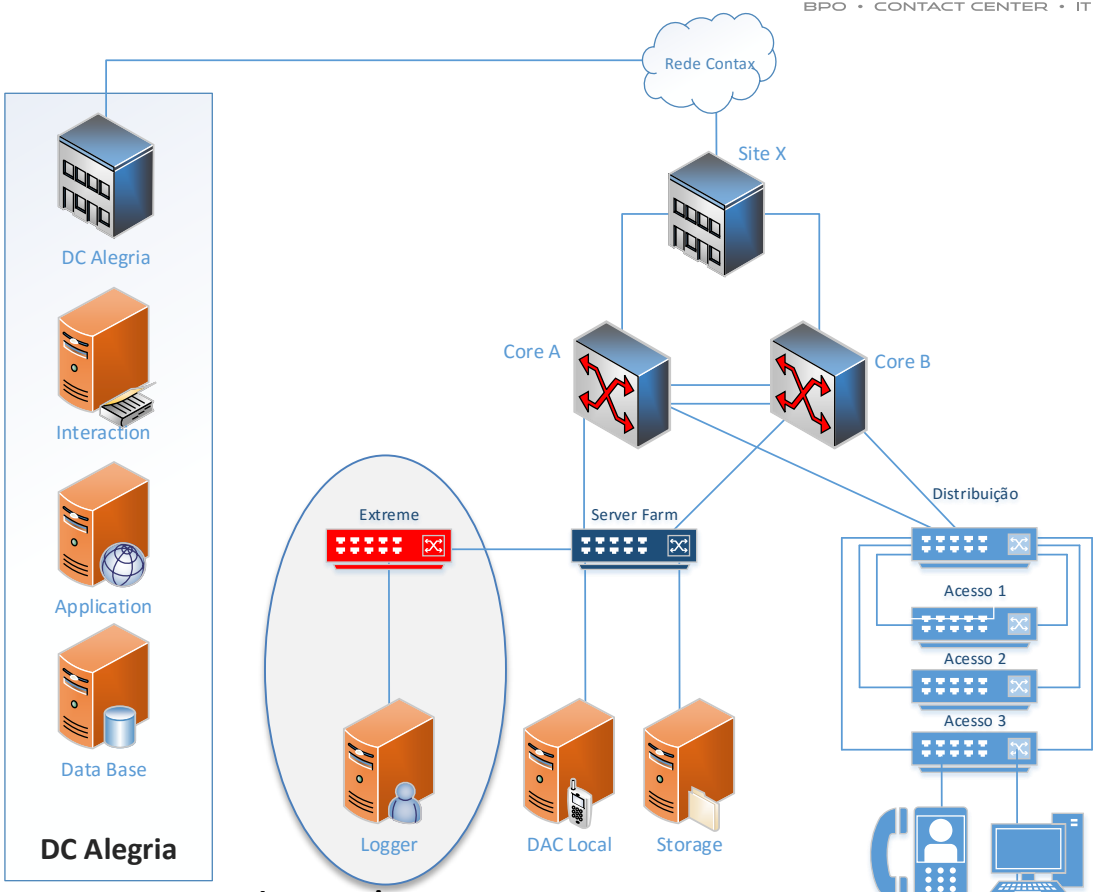


2.2. ASPECT - Aspect Discador | Ligação Muda | Caixa Postal | Número Existente | Queda

Categoria	Tarefa	Prioridade	Data limite	Data efetiva	Responsável	Status	Comentário
Alinhamento	Realizar reunião de entendimento com José Maria	Alta	**140/10**		Daniel Donaire	Planejado	
Tecnologia	Revisar os acessos para equipe Técnica Aspect	Muito Alta	**6/10**		Rogerio Santos	Atrasado	
Processo	Adequar o processo de GMUD de acordo com as necessidades de negócio	Muito Alta	**13/10**		Daniel Donaire	Planejado	Ação a ser estruturada com ajuda da Chacon?
Tecnologia	Garantir entrega de Link´s com a configuração da classificação adequada	Muito Alta	**13/10**		Daniel Donaire	Planejado	Ação a ser estruturada com ajuda da Chacon?
Processo	Estabelecer plano de transição e checklist com evidência de teste	Alta	**13/10**		Daniel Donaire	Planejado	Ação a ser estruturada com ajuda da Chacon?

Implementar Projeto ASPECT 7.3

2.3. Alta volumetria de incidentes classificados como Alto Impacto

Categoria	Tarefa	Prioridade	Data limite	Data efetiva	Responsável	Status	Comentário
Processo	Criação de POP para envio de SMS	Alta	**14/10**		Filipe	Em andamento	
Processo	Aplicar GUT e reclassificar incidentes classificados como Alto Impacto	Alta	**19/10**		Lázaro	Em andamento	Em andamento
Processo	Estruturar catálogo de serviço	Alta	**13/10**		Lázaro	Concluído	Estrutura definida - Ação de catalo andamento
Processo	Apresentar o Busciness case e marcar possivel viagem	Alta	**9/10**		Stuart	Em andamento	
Processo	Adequar regra de envio de SMS	Alta	**14/10**		Filipe	Em andamento	



5% Paradas totais

5% - 15% Indisponibilidade total de ferramentas secundárias

2.3. Alta volumetria de incidentes classificados como Alto Impacto

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Algorítmos - Variáveis e Constantes				GUIA SIMULADOR				
Criticidade do componente	Fator de Peso (X 0,7)			C.C	C.S	N.I	V.C	Prioridade
Crítico	5			5,0	5,0	5,0	1,0	16,5
Muito Alto	4			5,0	5,0	0,2	0,0	7,8
Alto	3			2,0	2,0	5,0	0,0	10,5
Médio	2							0,0
Baixo	1							0,0
								0,0
Criticidade do sintoma	Fator de Peso (X1)							0,0
Crítico	5							0,0
Muito Alto	4							0,0
Alto	3							
Médio	2							
Baixo	1							
Nível de Impacto	Fator de Peso (X1,5)							
Indisponibilidade total - 90 -100%	5							
Indisponibilidade parcial - Muito Alta- 50% a 90%	4							
Indisponibilidade pacrial Alta /Alta -30% a 50%	3							
Indisponibilidade parcial Alta - > 20% e < 30%	2							
Indisponibilidade parcial Média - > 15% e 20%	1							
Indisponibilidade parcial Baixa - >10% e > 15%	0.2							
Indisponibilidade parcial/pontual baixa - <10%	0							
Variável Cliente Impactado (Foco negócio)	Fator de Peso (X 1.5)							
Cliente Alvo - Sim	1.4							
Cliente Alvo - Não	1							

Draft

Microsoft Excel Worksheet

Catálogo de Serviço +
Reunião definição
GUT

2.4. URA - Santander | Não valida CPF | Não atende

Categoria	Tarefa	Prioridade	Data limite	Data efetiva	Responsável	Status	Comentário
Investigação	Identificação das possóveis soluções de contorno e definitiva	Alta	**5/10**		Stuart	Parcial	Pendente auxilio InformationSys
Alinhamento	Solicitar ajuda da information para definição de diagnóstico	Muito Alta	**7/10**	**7/10**	Stuart	Concluído	Information ainda não se reportou sobre convite
Investigação	Reunião de trabalho (técnica) com Information	Urgente	**?**		Felipe Ritter	Pendente	Information ainda não se reportou sobre convite


Internalizar suporte?

3. Problemas – Solução Definitiva

TI-Contax

Problema XYZ : Alto volume de Incidentes de Alto Impacto

Solução definitiva (*OnGoing*): Estruturação de Catálogo de Serviços, visando melhorar a qualidade no endereçamento, priorização e tratamento dos incidentes que impactam as Operações Contax.

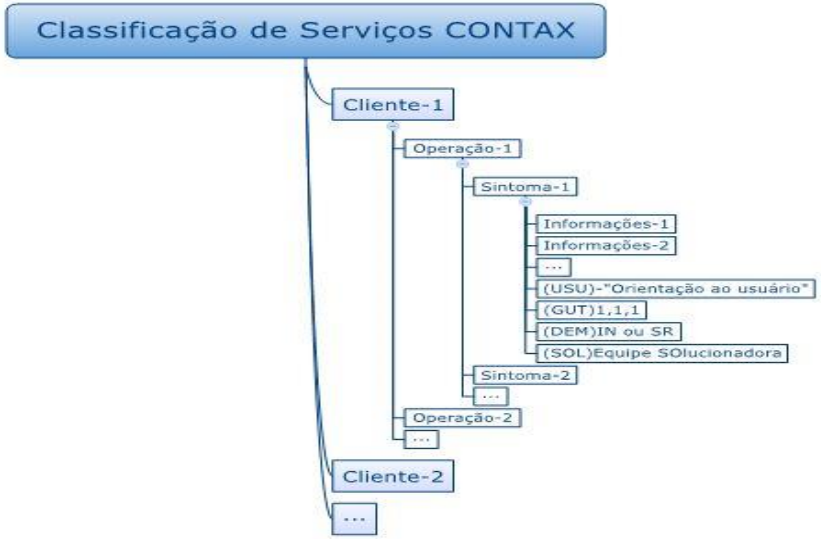

4. Ações previstas

- (CSC) Promover uma reunião até o final do mês com todas as áreas de TI, para apresentar o projeto de “Gerenciamento de Problemas”.

- Próxima semana, o Chacon vai preparar uma apresentação, direcionada para uma proposta de uma nova dinâmica para gestão de mudanças e projetos.

- Definir ritos diferenciados para mudanças.

5. Alinhamento



6. Fichas técnicas

ID	Sintoma	Plataforma	Incidentes associados (mês)	Cliente / Operação	G.U.T	Status	Responsável (Dono. Prb)
2015093001	Gravações > Não grava > Perda de Gravação	NICE	$	OI; Santander; ITAU; Bradesco	125	Em andamento	Thiago Augusto
2015092901	Discador > ligação muda > caixa postal > número inexistente > queda	ASPECT	5	Nextel (P.A. 150) / CredSystem (P.A. 30) /Cielo (P.A. 80) /Sky (P.A. 5)	125	Homologação	Julio Silva
2015092903	Front End > Falha e /ou indisponibilidade do sistema de front end atrelado a discador	ASPECT	15	Nextel (PA. 150)/Cielo (P.A. 80).	125	Em andamento	Lazaro
2015092902	Discador > Não disca	ASPECT	ND	Nextel (PA. 150); Cielo (P.A. 80).	ND	Em andamento	Julio Silva
2015100601	Proxy> Lentidão seguida de indisponibilidade total ao acesso aos sistemas da Internet	Proxy	24 em 2 dias	Reg. SP (Lapa, Antártica, Campinas, João Pessoa)	100	Homologação	Julio Silva, Claudio Lima
2015100701	URA > Santander	URA	7 em (J,A,S,O)	Santander CRC - SAC	125	Em andamento	Claudio Lima
201510081	Alta volumetria de incidentes classificados como Alto Impacto	TI	N/A	Todos Sites	125	Em andamento	Thiago Belico

6.0. Problemas

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

6.1. > NICE - Gravações > Não grava e Perca de Gravação

Sintoma:	Gravações > Falha ao tentar recuperar ligações: áudio inexistente, não gravado ou perdido em mídia.		Data: 30/09/2015
Plataform NICE	**IMPACTO**	Risco de conformidade legal e contratual (SLA / Multa)	
STATUS: Em andamento	**- Cliente :**	**Perca de Gravação**: OI; Santander; ITAU; Bradesco	
Responsáv Thiago Augusto	**- Cliente :**	**Não grava:** Todos os clientes	
Volumetri $ Multa	**- Sites:**		
Incidente: 5	**- Improdutividade:**		
	G.U.T.	125	

Causa - Perca de gravação (Legado DEDIC e Aspect)	Solução de contorno e definitiva
+ Modulo de armazenamento obsoleto.	***Solução definitiva:*** - Estudo de possibilidade de upgrade para plataformas de armazenamento. - Substituir o armazenamento de fita por Storage.
+ Falta de monitorização na plataforma: Servidor; Aplicação; Storage; Fitas	***Solução definitiva:*** Contratação de consultoria ZABBIX para diangóstico e definição do plano de ação. - Monitoração efetiva e proativa
- Falta de testes no restore	***Solução definitiva:*** - Criação do plano de "Disaster plan" para estabelecimento de método de contingência padrão - Melhoria do processo de G. Mudança com evidência de teste de redundância.
- Falta do processamento de gerenciamento de ativos de TI	***Solução definitiva:*** - Estabelecimento do processo de gerenciamento da configuração
- Troca individual de hardphone	***Solução de contorno:*** - Não alterar / mover ramais cadastrados,indevidamente, para layout / IP não gravado

Causa - NGR	Solução de contorno e definitiva
- Falta de configuração da redundancia	***Solução definitiva:*** - Criação do plano de "Disaster plan" para estabelecimento de método de contingência padrão - Melhoria do processo de G. Mudança com evidência de teste de redundância
+ Interchange SBC (controladores de board entre dois servidores)	***Solução de contorno:*** Restart do serviço VRSP - Para quando há existência de falha no SBC
+ Falha da comunicação entre os sites Alphaville e Alegria	***Solução definitiva:*** Contratação de consultoria ZABBIX para diangóstico e definição do plano de ação. - Monitoração efetiva e proativa

6.2. Aspect > Discador > ligação muda / caixa postal / número inexistente / queda

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Sintoma:	Discador > ligação muda / caixa postal / número inexistente / queda	Data: 29/09/2015
Plataforma: ASPECT **STATUS:** Monitorização **Responsável:** Julio Silva **Volumetria:** 3 meses **Incidentes:** 5	**IMPACTO** **- Cliente** : Nextel - 150PA´s /Credsystem - 30 PA´s/Cielo - 80 PA´s/SKY - 5PA´s **- Sites:** Alegria e Antártica **- Improdutividade:** 60% a 70% **G.U.T.** 125	

Causa	Solução
Alteração de Parâmetros - Realizadas pela Aspect/Leleco a pedido do Josê Maria	***Solução de contorno:*** - Correção de três parâmetros. ***Solução Permanente:*** - Realizar alinhamento com as áreas de negócio para divulgação do processo de GMUD e entendimento de necessidades - Adequar o processo de Mudança para atendimento das necessidades de negócio - Revisão dos acessos em produção concedidos para equipe da Aspect
Falha na classificação da Operadora OI	***Solução de contorno:*** - Correções realizadas (OI e OI + Embratel) ***Solução Permanete:*** - Garantir entrega de Link´s com a configuração da classificação adequada - Estabelecer plano de transição e checklist com evidência de teste

6.3. > Front End > Falha no Pop-Up/Explore

Sintoma:	Front End > Falha e /ou indisponibilidade do sistema de front end atrelado a discador	Data: 29/set
Plataforma: ASPECT **STATUS:** Monitorização **Responsável:** Lazaro **Volumetria:** 3 meses **Incidentes:** 5	**IMPACTO** **- Cliente** : : Nextel (PA. 150)/Cielo (P.A. 80). **- Sites:** Alegria **- Improdutividade:** Perda de produtividade causada por indisponibilidade total **G.U.T.** 125	

Causa	Solução
+ Perda de pacote (falha de Link) - Colisão de carro no poste com rompimento de fibra	***Solução de contorno:*** - Alterar roteamento da unidade Alegria para nuvem e para Alphaville ***Solução definitiva:*** - Melhoria no procedimento de controle que evidência a implementação de contingência através da GMUD. - Estabelecer um plano de recuperação de desastre para os ativos de comunicação via teste de contingência - Melhoria no processo de monitoração.
- Alto processamento da Base de Dados - Alto Consumo de memória - Falha de integração no CTI - Elevado I/O de disco - ASPECT versaõ 7.1	***Solução definitiva:*** Melhoria no processo de monitoração

6.4. > Discador > Não disca (baixa qualidade da voz - picotamento do operador para o cliente)

Sintoma:	Discador > Não disca (baixa qualidade da voz - picotamento do operador para o cliente)	Data:	29/set
Plataforma:	ASPECT	**IMPACTO**	
STATUS:	Em andamento	**- Cliente :** Nextel (PA. 150); Cielo (P.A. 80).	
Responsável:	Julio Silva	**- Sites:** Alegria	
Volumetria:	3 meses	**- Improdutividade:** ?	
Incidentes:	15	**G.U.T.** 27	

Causa	Solução
+ Configuração do QOS nas redes. + Configuração do QOS nas estações de trabalho. + No Link, assimetria de comunicação entre Alegria e Alphavile - Processamento local - Falha na operadora publica de telefonia (IDT / OI)	Identificação das possóveis soluções de contorno e definitiva (Julio Silva)

6.5. > Proxy > Lentidão seguida de indisponibilidade total ao acesso aos sistemas da Internet para as operações VIVO SP e PB

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Sintoma:	Proxy > Lentidão seguida de indisponibilidade total ao acesso aos sistemas da Internet para as operações VIVO SP e PB	Data: 06/10/2015
Plataforma: Sistemas **STATUS:** Fechado **Responsável:** Claudio Lima, Julio Silva **Volumetria:** **Incidentes:** 24	**IMPACTO** **- Cliente** : Operações VIVO **- Sites:** Regional SP e PB **- Improdutividade:** **G.U.T.** 100	

Causas	Solução Contorno/Permanente
- Falha no Hardware - Falha do software de vitualização - Falha de configuração do sistema operacional / Serviço	***Solução Contorno:*** - Disponibilizar redundância de serviço de proxy ***Solução Permanente:*** - Adequação do processo de gerenciamento de eventos, afim de garantir ações proativas de monitoração - Disponibilizar redundância de serviço proxy
+ Falha na execução da mudança de desligamento do site BAHAMAS, realizada no final de semana 03 e 04 de Outubro	***Solução Permanente:*** - Adequação do processo de mudança, caso a causa 4 esteja relacionada ao problema
+ Alteração de configuração do i-Node do serviço de proxy	***Solução Contorno:*** Alteração da configuração do i-Node ***Solução Permanente:*** - Adequação do processo de gerenciamento de eventos, afim de garantir ações proativas de monitoração.

6.6. > URA>Santander | Não valida CPF | Não atende

Sintoma:	URA>Santander | Não valida CPF | Não atende	Data: 30/09/2015
Plataforma: Sistemas **STATUS:** **Responsável:** Claudio Lima **Volumetria:** **Incidentes:** 9	**IMPACTO** **- Cliente** : Santander CRC - SAC **- Sites:** Antartica (SP), Mackenzie (RJ) **- Improdutividade:** **G.U.T.** 125	

Causas	Solução Contorno/Permanente
- Falha no acesso a Base de Dados do CCW (Infosys e/ou Produban). + Falha no script da URA Genesys (SW da Information System) ++ Falha no serviço Integração CCW (Infosys e/ou Produban). - Queda no serviço (Atendimento URA). - Quada do Link + Falha na aplicação do CCW (Produban) ++ Perca de sincronismo	***Solução Contorno:*** - Direcionar atendimento para atendimento do operador (em média 10 minutos) - Abertura do chamado no information system - Abertura do chamado Produban ***Solução Permanente:*** Pendente de ações acordadas resultante da reunião (Infosys e/ou Produban). Aguradamos disponibilidade do fornecedor.

6.7. > Alta volumetria de incidentes classificados como Alto Impacto

Sintoma:	Alta volumetria de incidentes classificados como Alto Impacto	Data: 30/09/2015
Plataforma: Sistemas **STATUS:** **Responsável:** Thiago Sousa **Volumetria:** **Incidentes:** 9	**IMPACTO** **- Cliente** : Todos os clientes diretos e indiretos **- Sites:** Todos sites **- Improdutividade:** Aproximadamente 1500 tkts mês **G.U.T.** 125	

Causas	Solução Permanente
+ Classificação subjetiva	- Estruturar catalogo de serviços - Definir metodologia e critério de Alto Impacto
- Ferramenta inadequada	Adequar ferramentas t-Process
- Campos abertos	
- Falta de definição de critério	- Simplificar a forma escrita SMS alinhada com o sintoma
+ Falta de catálogo de serviços	Estruturar catalogo de serviços
- Desorganização das informações no tProcess	- Estruturar catalogo de serviços - Adequar ferramentas t-Process
