contax

BPO • CONTACT CENTER • IT

Estabilidade Operacional

9 Junho de 2016




contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Índice

1. Indicadores totais de Incidentes
2. Gerenciamento de Incidentes – Alto Impacto
3. Tempo médio entre Falhas e de Resolução
4. Incidentes Alto Impacto – Por Clientes
5. Incidentes Alto Impacto – Por Resolvedor
6. Gestão de Mudança
7. Gestão de problemas – Dashboard e Indicadores
8. Business Case para Upgrade do Zabbix
9. Projetos Estruturantes
10. Alinhamento

1. Indicadores: Total de Incidentes

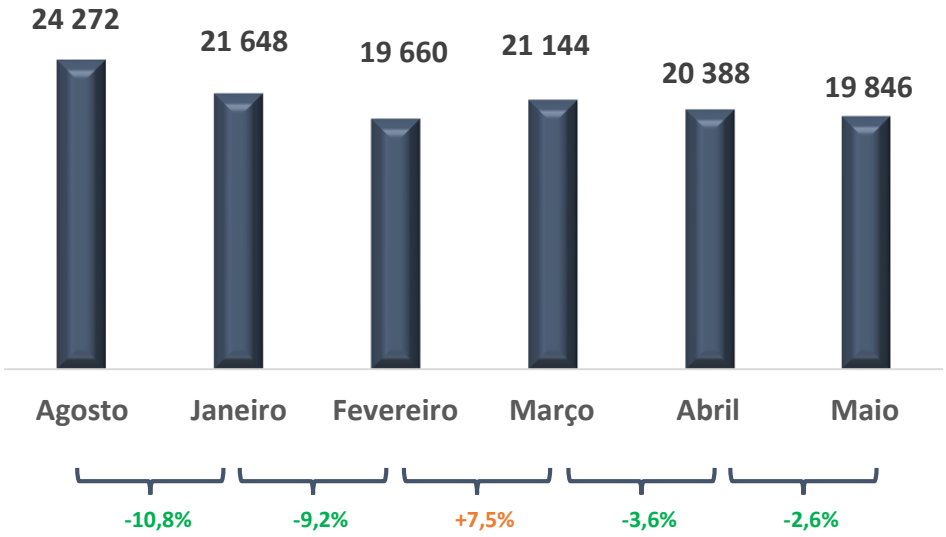


Mai - 31 dias	Real	Meta	Desvio	Farol
Total	**19.846**	**19.122**	**3,8%**	⊗
Alto	183	**180**	**1,7%**	⊗
Médio	10.740	**10.520**	**2,1%**	⊗
Baixo	8.923	**8.422**	**5,9%**	⊗


Tipo	Março	%	Abril	%	Maio	%
Hardware	10.885	51,5%	10.927	53,6%	9.681	48,8%
Aplicativo	6.304	29,8%	6.243	30,6%	7.190	36,2%
Outros	2.342	11,1%	1.728	8,5%	973	4,9%
NOC	1.059	5,0%	873	4,3%	1.034	5,2%
Telefonia	213	1,0%	250	1,2%	602	3,0%
URA	240	1,1%	243	1,2%	163	0,8%
Gravador	101	0,5%	124	0,6%	202	1,0%
Total	21.144		20.388		19.846	

2. Gerenciamento de Incidentes – Alto Impacto

Volume de Incidentes Alto Impacto

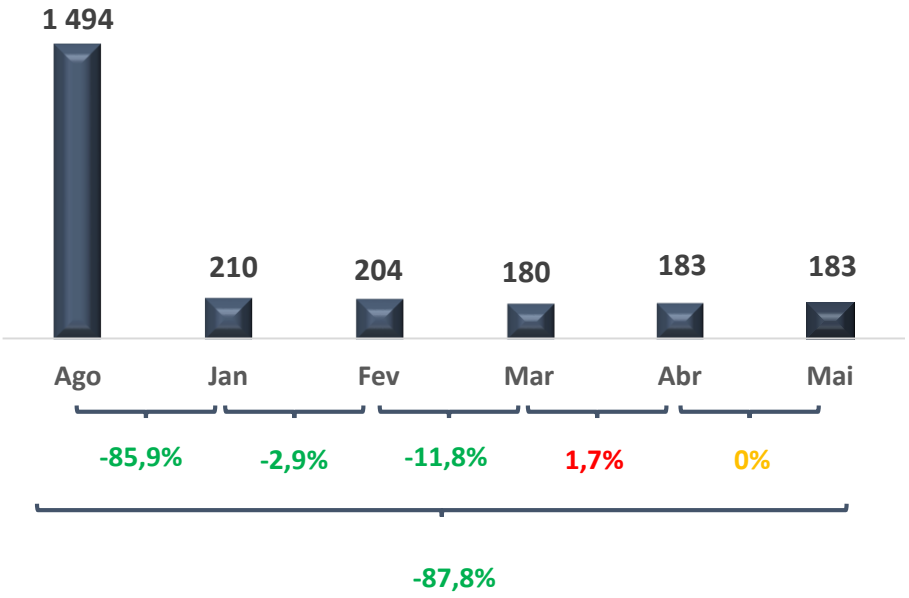


Média diária de Incidentes Alto Impacto

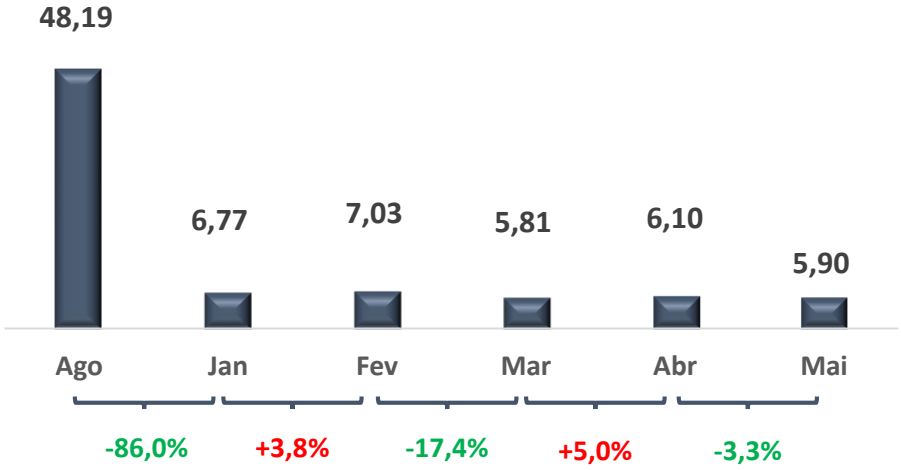


2. Gerenciamento de Incidentes – Alto Impacto
Maio

Incidentes de Alto Impacto (Crítico + Muito Alto) separados por responsabilidade pela resolução

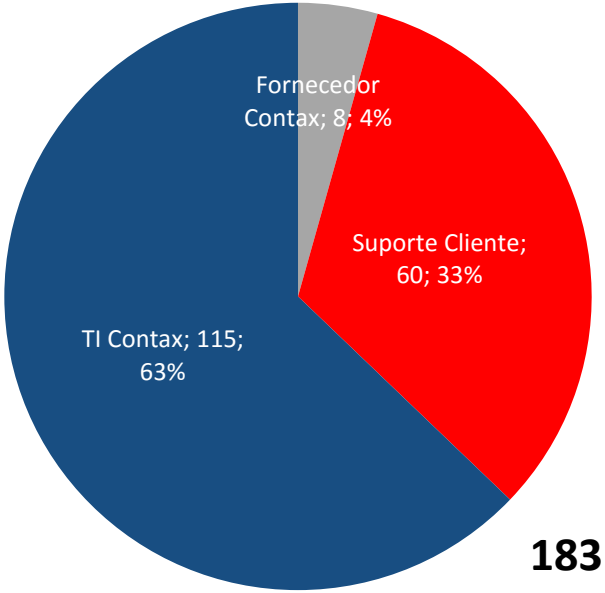

183

Incidentes de Alto Impacto, separados por responsabilidade pela resolução, **sem incidentes de gravação - NICE**

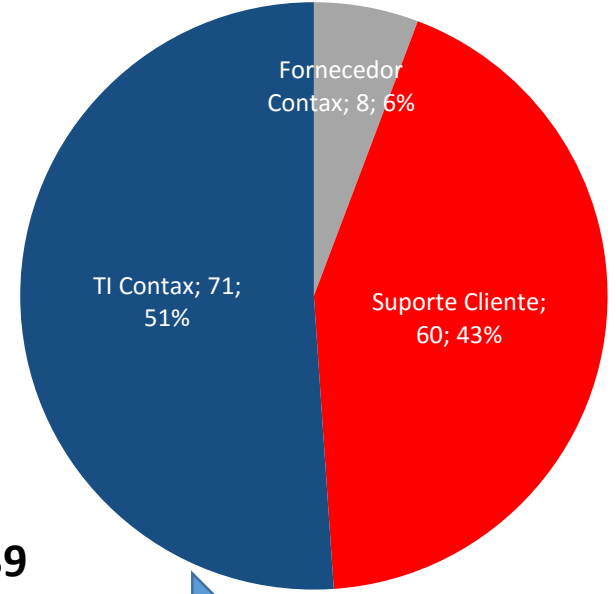


139

Redução sem incidentes de Gravadores

2. Gerenciamento de Incidentes – Alto Impacto Maio

Incidentes de Alto Impacto – Gravadores Nice

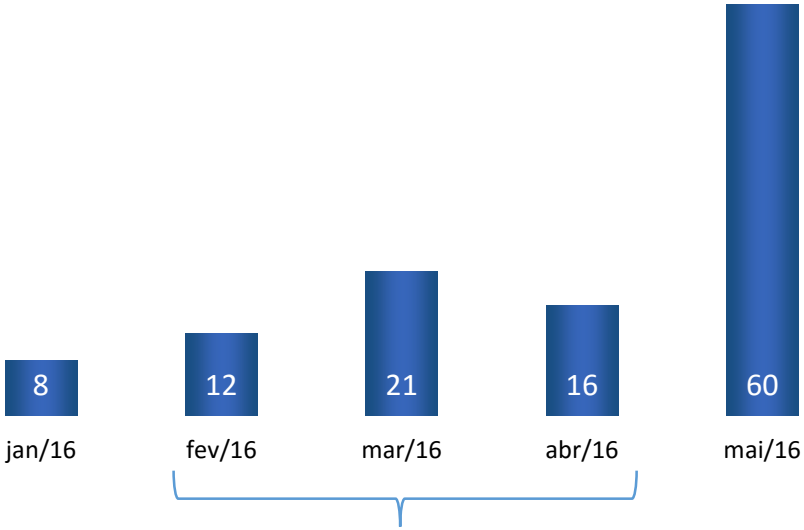

Média mês: 16
Média Dia: 0,53

- Ações do CSE
- Abertura de Problema

Maio = 1,93 Incidentes/dia
Junho = 0,8 Incidentes/dia
Diminuição de 58,6%

2. Gerenciamento de Incidentes – Alto Impacto Maio

Timeline

1 – 12/Mai

Reunião Gestão de Problemas
Chamado CTXMLTREG-7555 - Falha IP Capture
Identificado numero crescente de chamados abertos com evidencia da falha acima.
Definido ações por parte de CSE e NOC.
IMPACTO: Perda de Gravação

2 – 25/Mai

Analise dos chamados associados a Gestão de Problemas
Identificado que a falha ocorre em 07 POP's dos 11, em servidores VRSP, com perda de comunicação dos logger com IC**, gerando falha no RCM erro Exception E12310.**
IMPACTO: Falha no gerenciamento dos canais dos loggers.

3 – 31/Mai

Ações:
Alterada regras de armazenamento nos POP's Arcos, CDS e MG - 31/05
Instalação do servidor para apartar serviço VRSP do Logger – 03/06

4 – 06/Jun


Monitoração a plataforma – HPOV e Painel de Gravação
Aquisição de laminas em todos para desvincular o serviço VRSP do serviço de logger - TBD

2. Gerenciamento de Incidentes – Alto Impacto
Maio

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

TOPOLOGIA – NGR





- Loggers / VRSP

Data Hub II
Data Hub I

Data Hub I
Data Hub II

DC 2 Alphaville

- 1 Application – Cl. Ativo-Stand-by
- 3 Interaction – Cluster Ativo-Ativo
- 19 Storage Center – Réplica CPD
- 2 Data Base – DiscReplication
- 1 Datamart
- 4 NiceScreen
- 1 Sentinel


DC 1 Alegria

- 1 Application – Cl. Ativo-Stand-by
- 3 Interaction – Cluster Ativo-Ativo
- 19 Storage Center – Réplica CPD
- 2 Data Base - DiscReplication
- 1 Datamart
- 4 NiceScreen
- 1 Sentinel


3. Indicadores - Tempo médio entre falhas
Maio

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Incidentes Alto Impacto
Tempo médio entre falhas em h:m:s

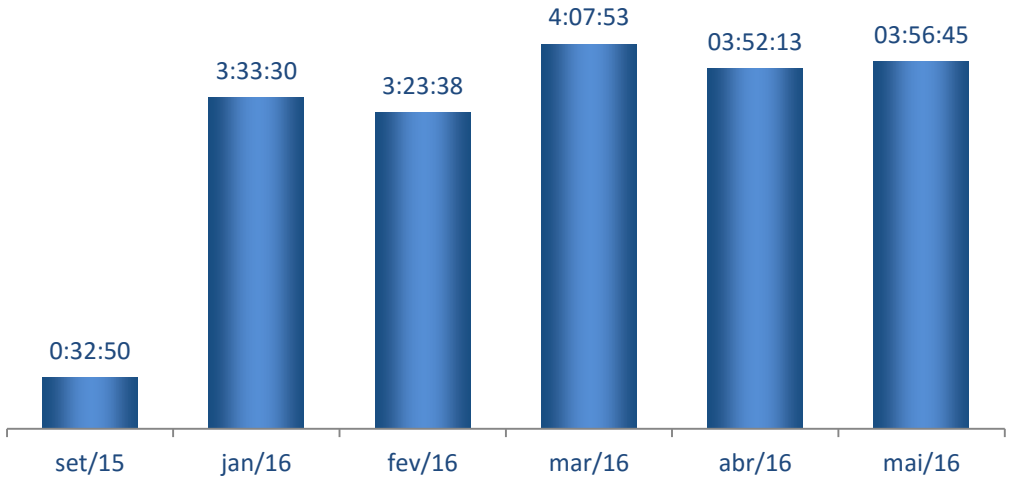


Responsabilidade da TI Contax



Responsabilidade do Suporte do Cliente




Responsabilidade do Fornecedor Contax




3. Indicadores - Tempo médio de resolução Maio


Incidentes Alto Impacto
Tempo médio de resolução em h:m:s

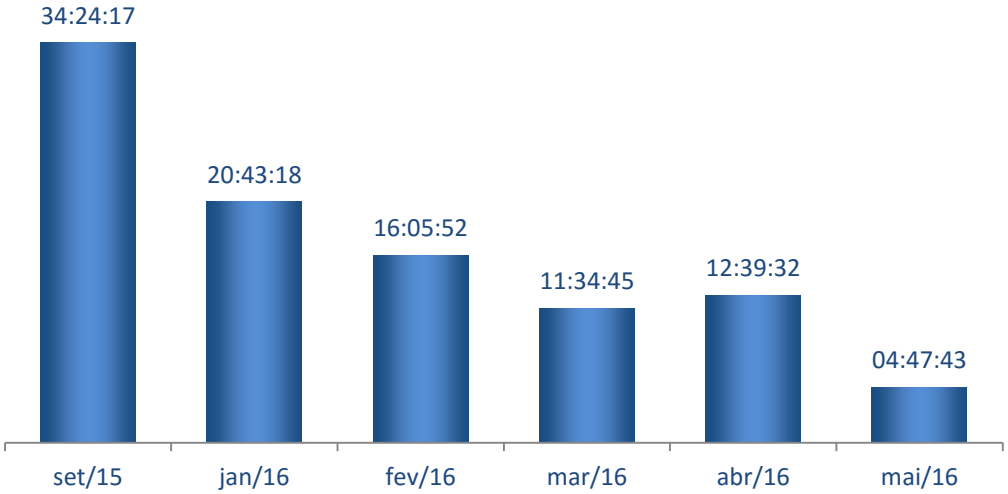


Realizado pela TI Contax



Realizado pelo Suporte Cliente



Realizado pelo Fornecedor



4. Incidentes Alto Impacto – Por Clientes
Maio


Cliente Afetado	Quantidade	%
Oi	109	59,6%
Vivo	17	9,3%
Santander	15	8,2%
Itaú	10	5,5%
Cielo	6	3,3%
Net	5	2,7%
Bradesco	4	2,2%
Volkswagen	4	2,2%
Serasa	3	1,6%
TAM	3	1,6%
BV Financeira	2	1,1%
BB	1	0,5%
BB Mapfre	1	0,5%
Claro	1	0,5%
Rede Globo	1	0,5%
Redecard	1	0,5%
Total	183	

Oi	Quantidade	%
Contax	81	74,3%
Cliente	28	25,7%
Total	109	

Vivo	Quantidade	%
Contax	9	52,9%
Cliente	7	41,2%
Fornecedor	1	5,9%
Total Geral	17	

Santander	Quantidade	%
Cliente	8	53,3%
Contax	5	33,3%
Fornecedor	2	13,3%
Total	15	

5. Incidentes Alto Impacto – Por Resolvedor Maio

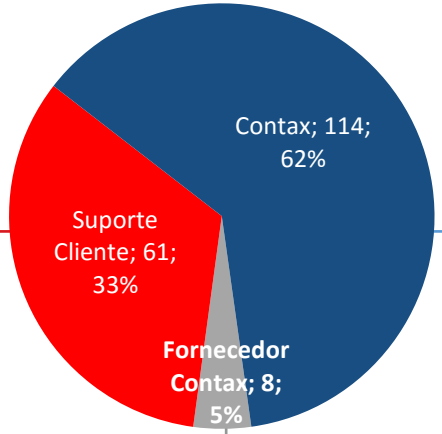

Suporte Cliente		
Tipo	**Quantidade**	**%**
Software	44	72,1%
Rede	9	14,8%
Telecom	4	6,6%
Mudança	3	4,9%
Elétrica	1	1,6%
Total	61	

Fornecedor Contax		
Tipo	**Quantidade**	**%**
Software	5	62,5%
Rede	2	25,0%
URA	1	12,5%
Total	8	

Contax		
Tipo	**Quantidade**	**%**
Software	94	82,5%
Processo	9	7,9%
Hardware	6	5,3%
Rede	2	1,8%
Telecom	2	1,8%
Infraestrutura	1	0,9%
Total	114	

5. Incidentes Alto Impacto – Por Resolvedor
Maio

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Contax

Contax - Software		
Tipo	**Quantidade**	**%**
Gravação - Nice	60	63,8%
Discador	6	6,4%
Sistema Operacional	4	4,3%
tCollect!	4	4,3%
TLV	4	4,3%
URA	3	3,2%
DAC	2	2,1%
Telecom	2	2,1%
Atlys	1	1,1%
Avaya	1	1,1%
Ayty	1	1,1%
BO Anantel	1	1,1%
CCW	1	1,1%
Data Center	1	1,1%
G!Neration	1	1,1%
NBA	1	1,1%
tGuidance	1	1,1%
Total	94	

Contax - Processo		
Tipo	**Quantidade**	**%**
Operacional	3	33,3%
Mudança	3	33,3%
Carga	2	22,2%
Segurança da Informação	1	11,1%
Total	9	

Contax - Hardware		
Tipo	**Quantidade**	**%**
Telecom	2	33,3%
Avaya	1	16,7%
DAC	1	16,7%
DCP 6	1	16,7%
Gravação	1	16,7%
Total	6	

Legendas
Existem Problemas abertos

5. Incidentes Alto Impacto – Por Resolvedor Maio

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Suporte Cliente

Suporte Cliente - Software - Top 10		
Tipo	**Quantidade**	**%**
CCW	7	15,9%
NBA	5	11,4%
Vivo 360	4	9,1%
STC	3	6,8%
CallCenter	2	4,5%
M4U	2	4,5%
Siebel	2	4,5%
Web Chat	2	4,5%
Amadeus	1	2,3%
Atlys	1	2,3%
Total	44	

Suporte Cliente - Rede		
Tipo	**Quantidade**	**%**
Link	9	100%
Total	9	


Fornecedor Contax

Fornecedor - Software		
Tipo	**Quantidade**	**%**
URA	3	60,0%
Ayty	1	20,0%
G!Neration	1	20,0%
Total	5	


Fornecedor - Rede		
Tipo	**Quantidade**	**%**
Link	2	100,0%
Total	2	

Legendas
Existem Problemas abertos

5. Incidentes Alto Impacto – Por Resolvedor Maio

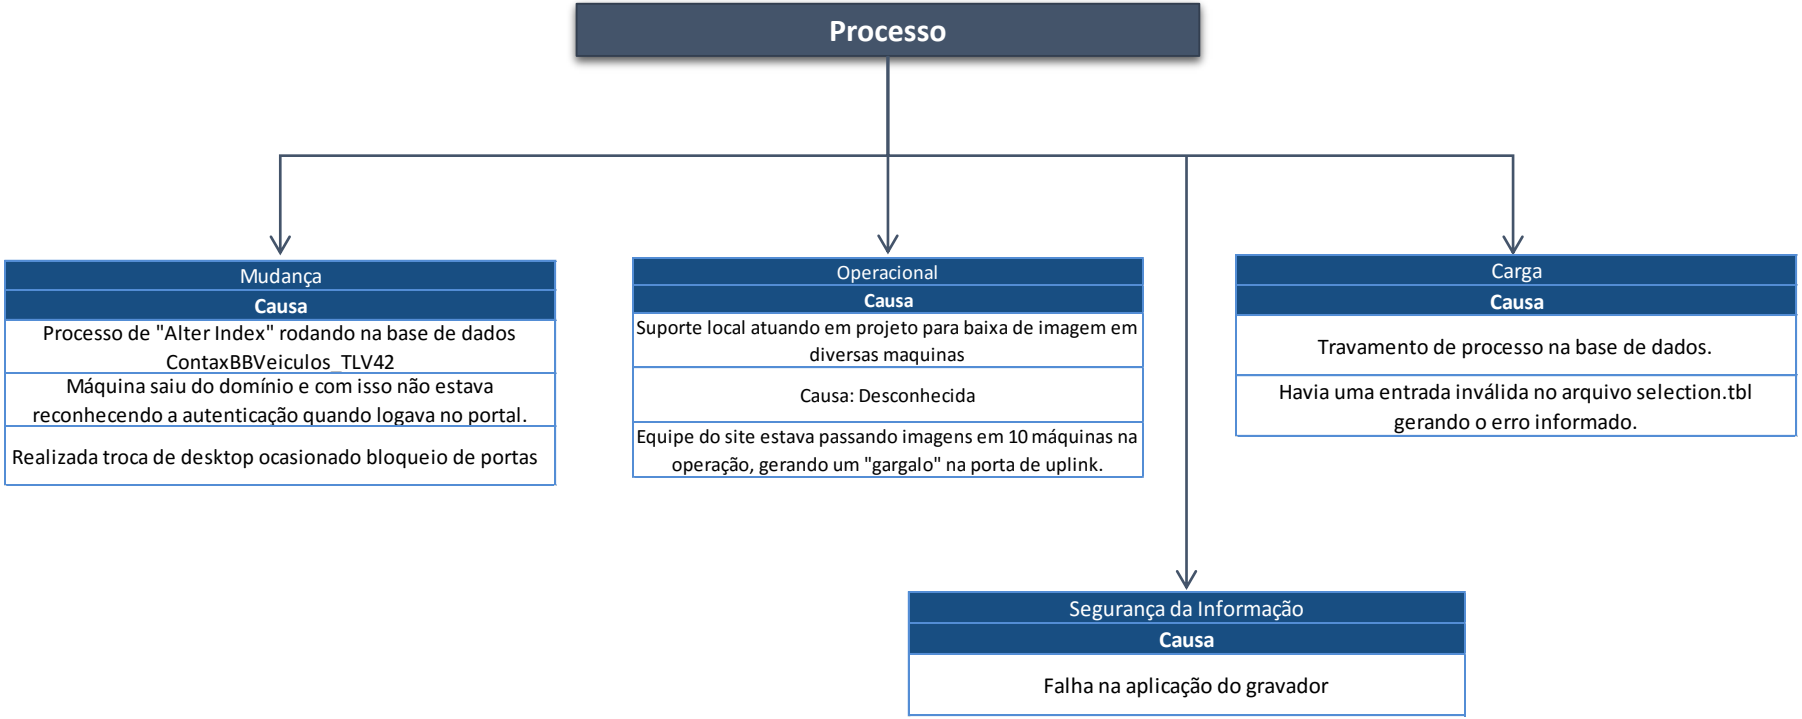


6. Gestão de Mudança - Maio

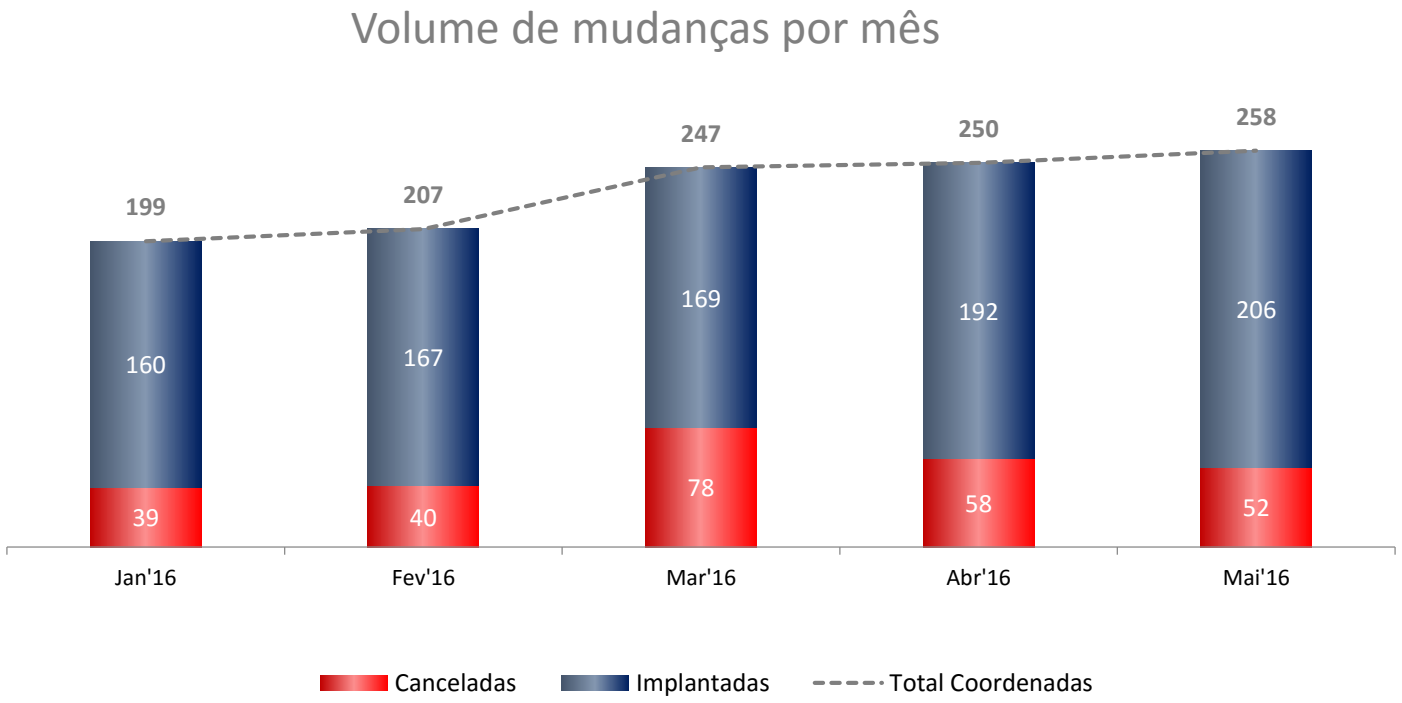


6. Gestão de Mudança - Maio

Volume de mudanças por status

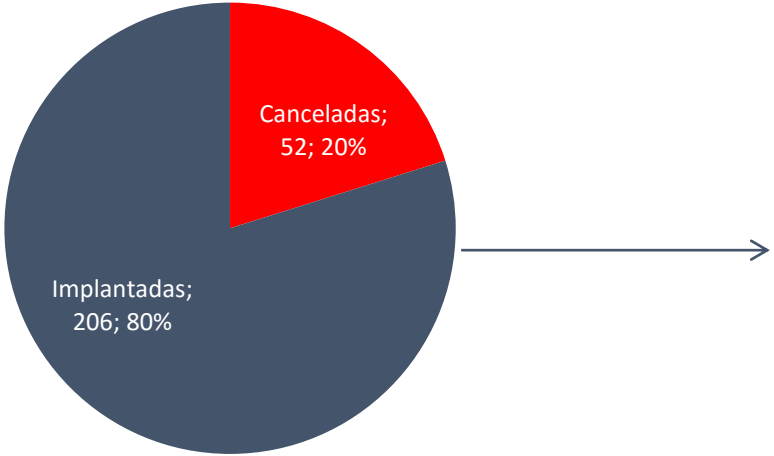


Volume de mudanças por Tipo

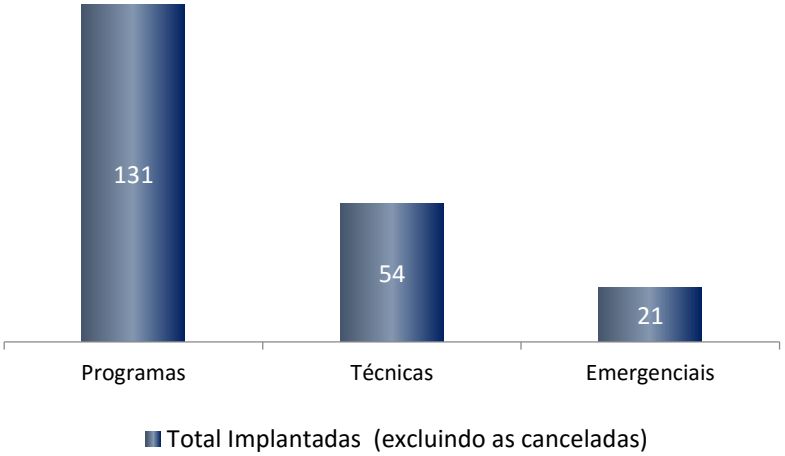

7. Dashboard - Problema

OVERVIEW EXECUTIVO_GESTÃO PROBLEMAS

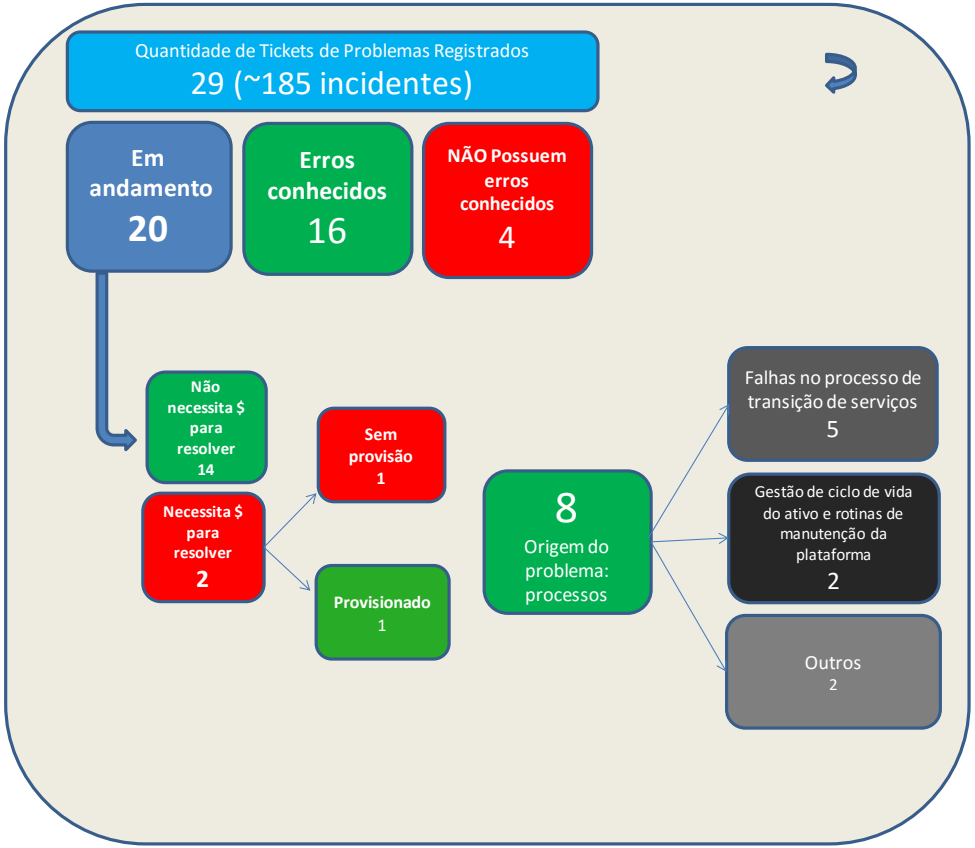

Indicadores de performance

RCA	% médio
8 dd	42%

Resolvidos mês
18

60 tkt
Gravadores NICE

23 tkt
Falhas em MPLS IP

96 DD
Migração rotas Metro para MPLS | Site Alegria | Impacto nível Brasil

ISSUES:

A) JETTRO - Entendimento do processo corporativo.

B) Souza Cruz - Falta de visibilidade gerencial de pilotagem.

8. Business Case para Upgrade do Zabbix

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Situação: **Desativação do site Alameda Santos**, demanda a mudança da solução atual de Zabbix (limitada) para novo local. Aproveitar esta "movimentação" e efetuar o upgrade da solução.

Ferramenta estratégica de TI, para "olhar" o negócio.
A engenharia trabalhou numa solução de upgrade de versionamento do Zabbix atual para a mais recente, V3.0.
A solução de monitoração do Zabbix 3.0 utilizará servidores físicos e serão implementados **nos Data Centers Alegria e Alphaville (redundância).**

Esta versão acresce em relação a anterior novas funcionalidades, e reforçam a abrangência da anterior. Permite detectar e **efetuar ações proativas** em serviços, HW e Redes anulando ou reduzindo o tempo de indisponibilidade, com respetiva **redução no impacto financeiro**.

Custo Cenário 1: MySQL Subscription License - Server 2 0.00
MySQL Enterprise – **38K**
Custo Cenário 2: MySQL Subscription License - Server 2 0.00
MySQL Standard Edition – **15K.**
Custo Cenário 3: POSTGRE free – **5K (5 pessoas)**



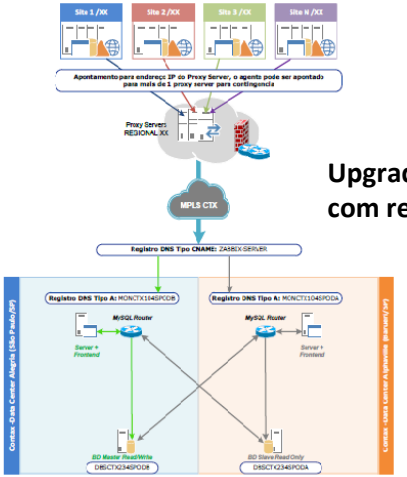

Upgrade Zabbix com redundância



9. Projeto: T2R – Transição de Serviços

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Projeto: T2R – Transição de Serviços
Data Inicio: 22-03-2016
Data Conclusão: 22-07-2016
Progresso: 75%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Integração entre os processos de gerenciamento de Demandas, Projetos e Mudanças, para controle sobre o desenvolvimento e a implantação de Serviços novos ou alterados.

Últimas Realizações

- Definição da integração (“gatilhos”) entre o processo GMUD e os de Demandas e de Projetos.
- Definição de ferramenta para automação dos processos de T2R.
- Identificação de requisitos funcionais para automação integrada de Demandas, Projetos e Mudanças.
- Especificação Funcional para solução de automação integrada dos processos T2R no tProcess! (Demandas, Projetos e Mudanças).

Próximas Ações

- Desenho de Fluxograma, Matriz RACI e SLA`s para Gerenciamento de Projetos. (Em andamento)
- Desenho de Controles para Projetos.
- Acompanhamento da solução de automação integrada no tProcess!
- Conclusão da definição de indicadores e de sua automação.
- Planejamento da implantação dos novos processos e indicadores, considerando automação, treinamento e piloto.

Riscos/Problemas/Observações

- Ferramenta eGmud limita a automação integrada dos processos.
- Prazo para desenvolvimento de solução integrada no tProcess!

9. Projeto: Gravação (Nice)- Elektro, TAM, Vivo e Bradesco

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Projeto: Gravação (NICE)
Data Inicio: 02-05-2016
Data Conclusão:-13-07-2016
Progresso: 13%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Este projeto tem como escopo, adequar infra de HW para instalar 3K licenças de gravação, atualmente sem uso. O escopo são **Elektro, TAM, Vivo e Bradesco**.

Últimas Realizações

- ✓ Migração da Elektro concluída.
- **30 Maio - Solicitação de compra de 5 licenças Win Server 2012 R2 Standard. Sem SC até ao momento.**

- ✓ Instalação e configuração dos servidores que vão atender TAM com licenças provisórias.

Próximas Ações

- Migração dos 3 servdores da TAM para o CPD do site Alegria.
- Continuação da coleta de informação para migração da TAM para Nice. **Data objetivo migração da TAM, final de Junho**.
- Ver contratualmente a vigência de retenção das gravações (5 anos?), e garantir a execução do processo.

Riscos/Problemas/Observações

Observação:

- Esta implantação irá **consumir todas as licenças Nice**, temos que ter muito cuidado e estarmos alinhados no momento de crescer as operações.

Risco:

- **Escopo do projeto esta a ser revisitado pela área de Projetos e Engenharia (“redistribuição” de licenças Nice), que poderá impactar com o cronograma e aumento de exposição ao risco (multa) para as operações no escopo.**

9. Projeto: Redundância links MPLS

Projeto: Redundância links MPLS
Data Inicio: 01-12-2015
Data Conclusão: 30-06-2016
Progresso: 44%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Para dar **resposta imediata** a situações recorrentes de incidentes, relacionados com a perda de **Links** que interligam os sites da Contax, este projeto visa, **Garantir e documentar a funcionalidade da contingência e** validar caminhos possíveis e documentar ações.

Últimas Realizações

- Elaboração de documentação técnica dos sites intervencionados pelo projeto.

Próximas Ações

- Alinhar datas e obter acordo com as operações (Antártica) para realização dos testes.

Total Sites	**23**
Concluídos	8
Pendencias	9
Disponiveis p intervir	6

Riscos/Problemas/Observações

Obs:

- O projeto deverá melhorar o processo de comunicação entre as áreas (RACI).

Risco: A OI não fornece previsões de instalação/intervenção.

7. Projeto: Backups e Restore em Produção

Projeto: Backup & Restore Ambiente de Produção

Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 30-06-2016
Progresso: 81%
PM: Rafael Alves



Descritivo: Providenciar Backup em todos os equipamentos de produção da Contax. Garantir plano de restore do ambiente.

Último Status

- Escopo do projeto ampliado para 30 de junho, devido a falta de insumos (fitas e etiquetas) nos sites assim como equipamentos aguardando reparo
- Liberação de redes em sites pilotos para uso do UDP
- Instalações dos clients junto com as GMUD de WSUS

Objetivos alcançados na última semana

- Instalação do piloto do ArcServe UDP para teste de backup e restore de ambientes Windows e Linux (Virtuais e Físicas) – Ambiente Windows Finalizado e Linux em andamento
- Apoio do CSE para instalações dos clients nos servidores Windows e Linux

Riscos/Problemas/Observações

- Regional SP e RJ com falta de fitas, aguardando compra
- HW de backup (robô) sem garantias e com mais de 5 anos de uso, ocorrendo desgastes por vida útil
- Armazenamento indevido das mídias causando degradação das mesmas.

9. Projeto: OCS Inventory

Projeto: OCS Inventory
Data Inicio: 04-12-2015
Data Conclusão: 10-06-2016
Progresso: 94%
PM: Thiago Augusto



Descritivo: O OCS é uma ferramenta de Inventário de servidores para auxiliar a equipe de Controle de Ativos.

Último Status

- ✓ Servidores cadastrados no OCS: 3.716/3.965
- Microsoft (2.903/3.046) 143
  - Agente Instalado - Pendencia de Rede 87
  - Pendente (Host) 42
  - Pendente (Host) Usuário e Senha 14
- Linux (813/919) 106
  - Agente Instalado - Pendencia de Rede 04
  - Pendente (Host) Usuário e Senha 102

Objetivos alcançados na última semana

- Equipe de controle de ativos esta utilizando a ferramenta.

Riscos/Problemas/Observações

9. Projeto: Ura Internalização

Projeto: Ura Internalização
Data Inicio: 14-4-2016
Data Conclusão: 02-09-2016
Progresso: 28%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Capacitação e treinamento interno.
O objetivo é não depender de terceiros, e obter prestação de serviço interno com maior qualidade e rapidez, gerando "saving" no investimento de treinamento e certificado.

Últimas Realizações

Treinamento concluído:

- ✓ SIP Server Foundation 8.1
- ✓ SIP Server Deployment 8.1
- ✓ Genesys Voice Foundation
- ✓ Composer Voice.

Próximas Ações

- 20 Junho - Genesys Core Applications Solution (Presales)
- 21 Junho - CIM Platform troubleshooting
- Pendentes de data da Genesys:
  - Genesys Routing and Solution Reporting 8.1 Deployment
- Reunião para adequar e realinhar estratégia com a equipe de José Carlos.

Riscos/Problemas/Observações

- A equipe do José Carlos, esta a adequar-se ao escopo traçado pela equipe de quem herdou o legado da "Internalização da URA".
- **Treinamento só para 1 pessoa**. Necessita de mais tempo para passar conhecimneto para os demais elementos.
- Como o modelo de contratação é "spot", será necessário **adequar as demandas ao nosso prazo de execução**, tendo em vista que estes recursos são suportados pelo contrato de outro cliente.

9. Projeto: Qualidade em Gravação

Projeto: Qualidade em Gravação
Data Inicio: 24-02-2016
Data Conclusão: 23-08-2016
Progresso: 72%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Este projeto tem como escopo, executar um **plano de ação para eliminar multas (de gravação)** nos clientes Contax.
Vamos adotar o trabalho baseado em PPT (**Pessoas – Processos – Tecnologia**).

Últimas Realizações

- Entregue para a fabrica de software melhorias na APP de recuperação de gravações.
- Continuação de homologação da ferramenta de recuperação de gravações.

Próximas Ações

- **O Tprocess** foi selecionado como **canal único de entrada** para chamados para recuperação de gravação.
- "Piloto" - Implantar a nova metodologia de recuperação de chamados no Bradesco para avaliar resultados.

Riscos/Problemas/Observações

Obs: A abrangência e aderência na nova metodologia no novo "modus operandi" de recuperação de gravação, poderá ser um desafio para algumas áreas.

9. Projeto: Aspect 7.3 System 1

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Projeto: Proj Aspect 7.3
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: Plataforma: 05-01-2017
Progresso: 4%
PM: Julio Cesar



Descritivo: Este projeto tem como escopo, preparar/adequar toda a infra de HW para instalar a versão 7.3 do Aspect para 2000 PAs. E consequentemente migrar as operações críticas para essa plataforma.

Últimas Realizações

- Estudo de utilização de banda para operações Sites.

Próximas Ações

- Definir plano de migração Santander
- Definição de entrega de links OI.
- Liberar ambiente para desenvolvedores.
- Aprovar custos migração Santander.

Riscos/Problemas/Observações

Risco:

- Entrega da OI (E1´s) Polo Prado não pode ser em SIP. Em negociação.
- **Aspect não cumpriu a data de implantação 24/05**.
- Nova data 13/06.

9. Projeto: Monitoração Dell – Open Manager

Projeto: Monitoração (Dell-Open Manager)
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 22-04-2016
Progresso: 75%
PM: Júlio Cesar



Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware para eliminar a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Últimas Realizações

- Em execução o cadastramento de Vlans de servidores (Total).
- **70% dos servidores Dell com monitorização de HW.**

Próximas Ações

- Homologação do SW.
- Aceitação das regras de liberação por SI.

Freezing

Riscos/Problemas/Observações

- Servidores sem client OMSE.
- **Projeto temporariamente parado**. O recurso que dá andamento a este projeto, esta dedicado totalmente ao projeto OCS e Backup.

10. Alinhamento



