contax

BPO • CONTACT CENTER • IT

GT Priorização

15 Jan 2016

Objetivos


contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Demanda infinita e recursos finitos



Gestão de Demandas – Fluxo operacional

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

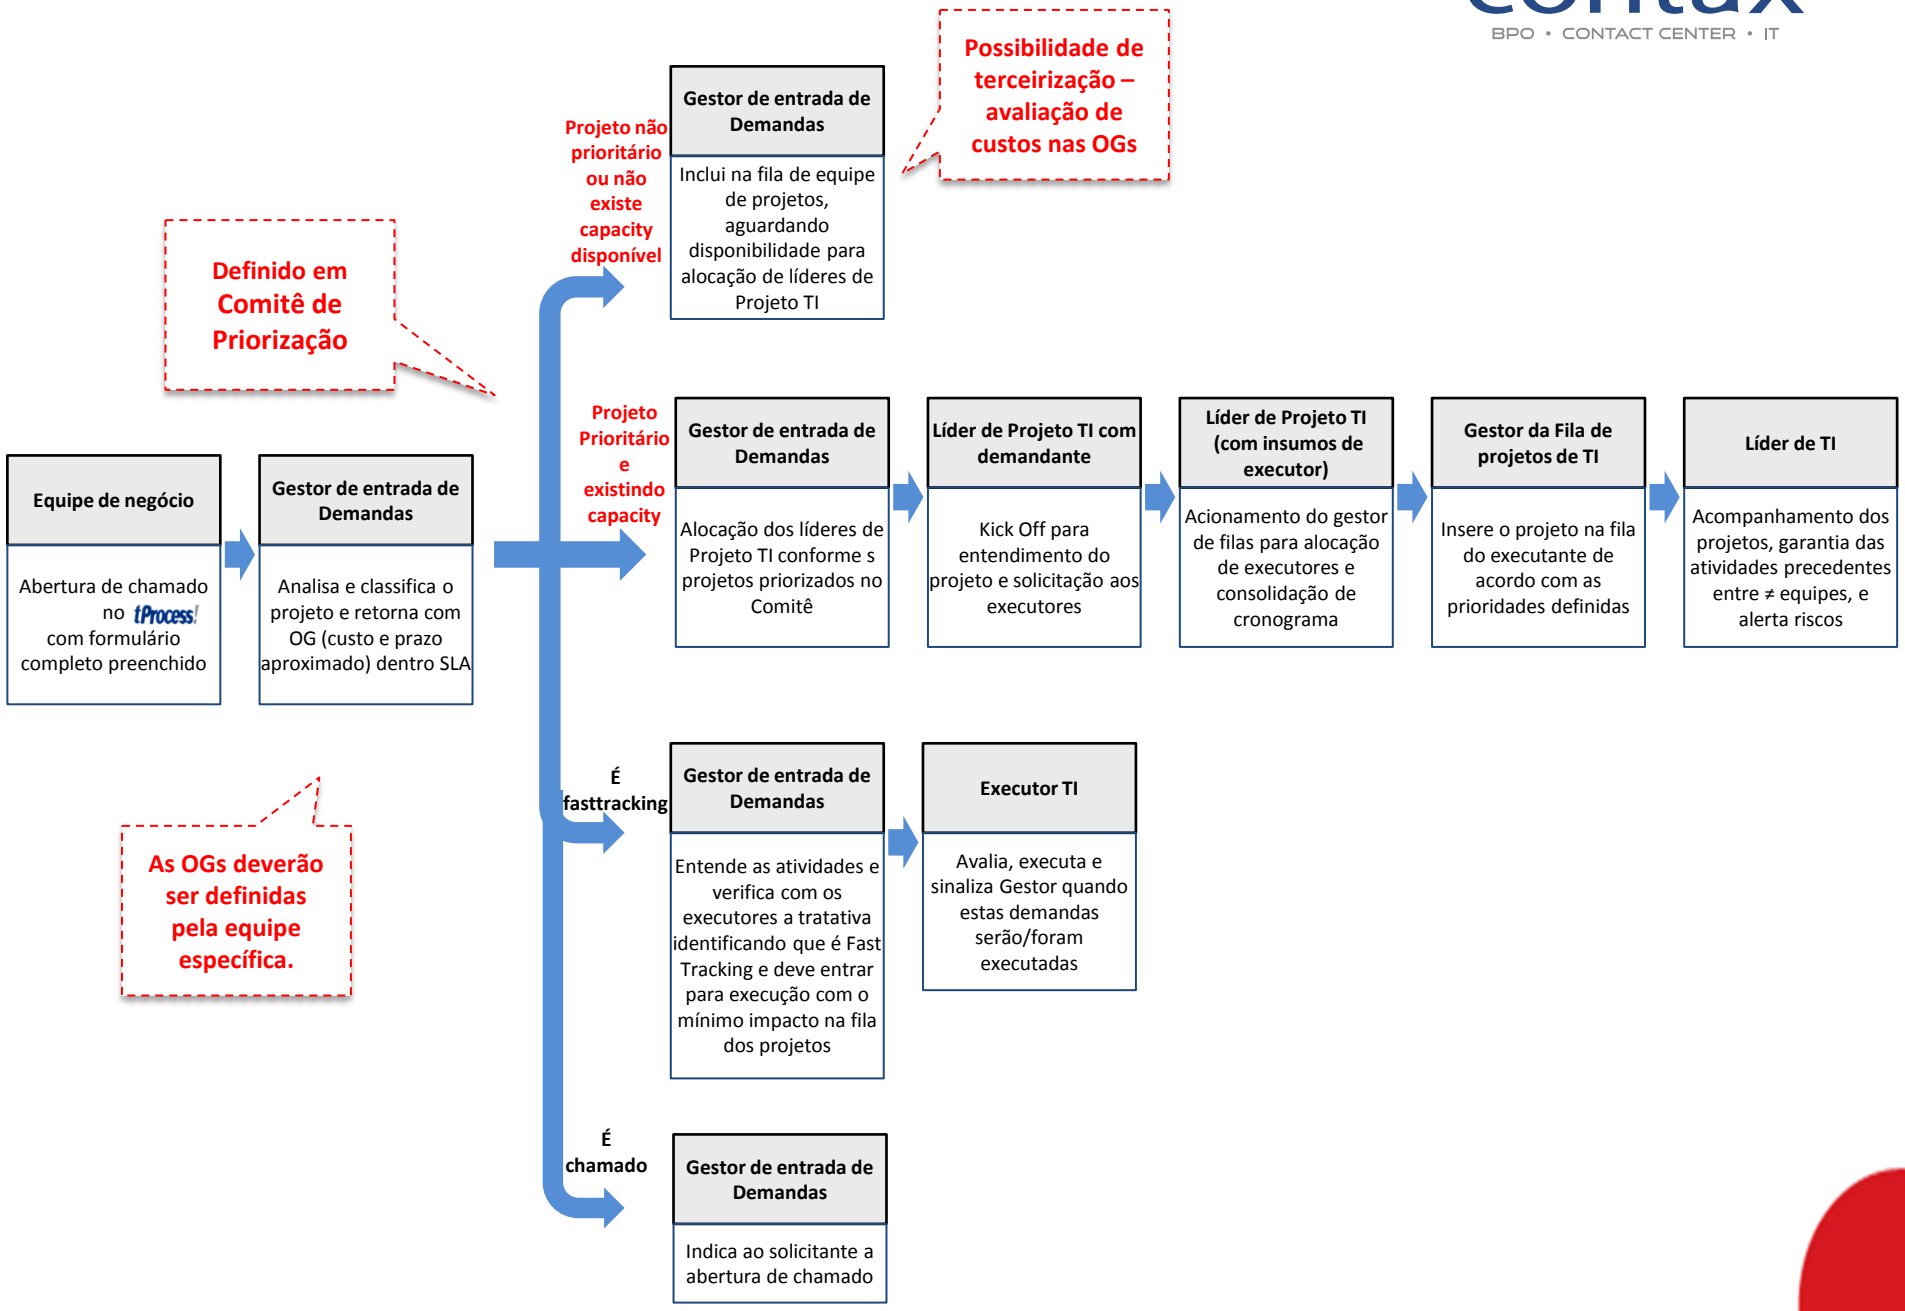

O que é um projeto?

Catálogo detalhado destes conceitos sendo construído.

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

As demandas de *fast tracking* são confundidas com projetos
Só os projetos devem ser acompanhados por líderes de TI
As demandas de *fast tracking* e os chamados *d*evem ser executadas paralelamente com com o mínimo impacto na fila dos projetos

O que é projeto:

- Tudo o que envolva atividades de diferentes equipes de TI
- Crescimento/Migração de Operações
- Desenvolvimento de Aplicativos
- Upgrade de Plataformas (Discagem, Gravação, Aplicações, DAC, etc);
- Implantação de operação
- Pré-Vendas e RFP
- Instalações de software/Hardware (mais de dez máquinas)
- Mudanças no ambiente de TI que demandem acionamento de mais de uma área executora;
- Ou atividade de relevância financeira para a empresa

O que é "fast tracking":

- Configuração **simples** de aplicações existentes;
- Manutenção **simples** de Hardware/Software;
- Instalações de software/Hardware isoladamente sem atuação de outras áreas (**até** dez máquinas);
- Solicitações de serviço (Mudança de ramal/VLAN, Colocar atalhos em telas da operação);
- Troca de **apontamento** de DAC de uma operação (que não envolva migração de licenças).

O que é chamado:

- Solicitações isoladas, sem dependência e de acordo com o catálogo de serviços (tProcess)
- **Exs:** Liberações de acesso para aplicações ou URLs já existentes na Contax; instalação de 5 PAs em operações existentes; Consulta de informações (IPs, Extrações de dados/logs);

Planilha de priorização

Sugestão a ser avaliada por Negócio

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Planilha automatizada que leva em consideração critérios definidos e grau de urgência para os critérios, onde é gerado um número (quanto maior, mais prioritário) e grau de prioridade (Baixa, Média ou Alta)

A decisão é tomada no comitê de priorização

Grau de urgência

5	Necessidade de ação imediata	4	Muito Urgente	3	Urgente
2	Pouco Urgente	1	Pode Esperar		

Critérios

	5	4	3	2	1
Demandante	POP / S&OP	Plano de recuperação	Pré Vendas	Operações - Fora Plano de Recuperação	Outros
Urgência na entrega	Até 7 dias	Entre 8 e 14 dias	Entre 15 e 21 dias	Entre 22 e 29 dias	Mais que 30 dias
Retorno Financeiro	> R$ 300k	Entre R$100k e R$300k	< R$100k / Sem retorno, porém perda de cliente	Sem retorno, porém há redução de custo	Sem risco e sem retorno
Tipo de cliente	N/A	N/A	Novo cliente	Cliente atual e VIP	Cliente atual e Não VIP
Temperatura do cliente	N/A	Muito quente	Quente	Morno	Frio

Comitê de Priorização

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Participantes


Required	Fábio Koreeda / Rivaldo / Giuseppe / Nara / Milene
Opcionais	Operações e Comercial

Agenda

- Apresentação dos novos projetos com ganho financeiro e custo (prazo e $)
- Definição do GO/NGO do projeto
- Definição de prioridades e reorganização das filas
- Apresentação dos projetos cancelados e respectivo custo afundado

Equipe Financeira deve ser envolvida (apuração retorno e avaliação pós projeto)

Milestones

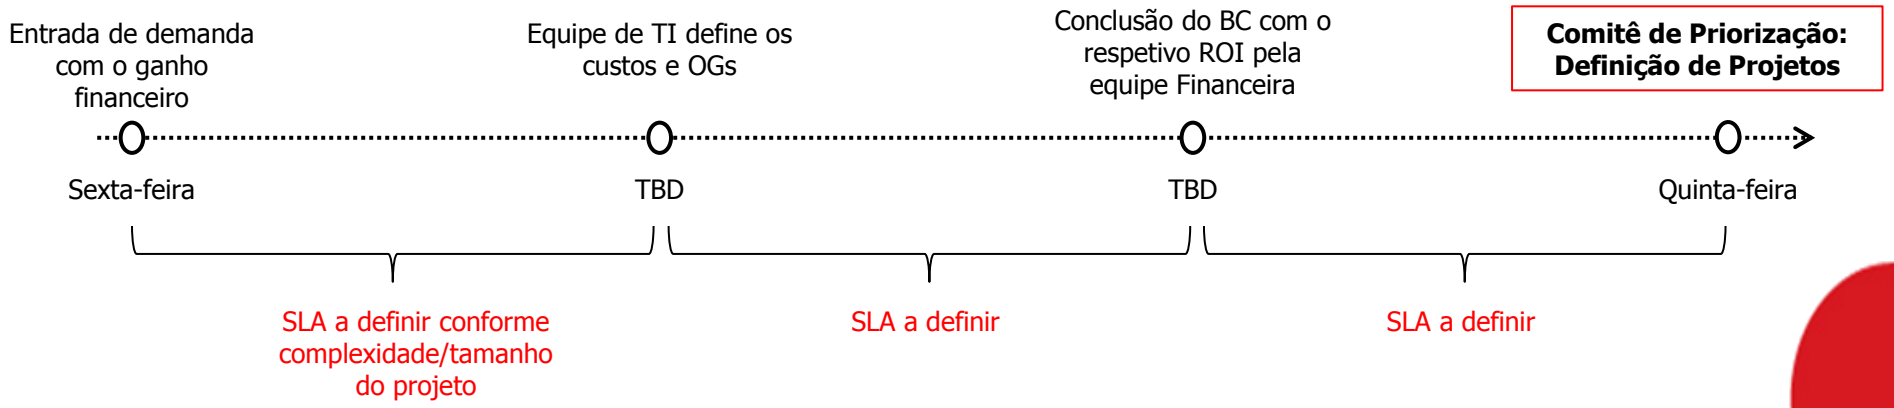

Calendário Semanal (1/2)

Legenda:

- Reuniões conjuntas (TI e áreas)
- Reuniões de TI
- Entrega/Ativ. recorrentes TI
- Entrega/Ativ. recorrentes Negócio

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
Reunião		COMEX Organização Projetos (Pré KickOff novos e revisão de filas) • PMO TI • Executores TI	Reunião Equipe PMO TI Semanal • Equipe PMO TI Prévia da Reunião com Giulio • PMO Negócio • PMO TI	Comitê Priorização • Giuseppe • Koreeda • Nara • Milene • (restantes envolvidos se necessário)	Reunião Projetos com Giulio
TI		Alocação dos PMOs de TI aos novos projetos **Equipe:** PMO TI Entrega da planilha com status de projetos consolidada **De:** PMO TI **Para:** Dir. TI e Executores TI	Entrega dos cronog. de projetos/filas **De:** Executores TI **Para:** PMO TI Resposta aos novos proj. com OG → **2 semanas após** (1) **De:** PMO TI **Para:** PMO Negócio		Entrega das filas/projetos prioritários revistos **De:** PMO TI **Para:** Executores TI
Negócio	Envio dos novos projetos consolidados (1) **De:** PMO Negócio **Para:** PMO TI			Envio do painel de projetos com status **De:** PMO Negócio **Para:** PMO TI	


Pré-vendas

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Operações
Comercial
Financeiro
TI (Pré-vendas)
RH

- Preenchimento do formulário de pré-vendas
- Definição de escopo
- Alinhamento do *dead line* para entrega de RFP

GO / NO GO?



TI (Pré-vendas)
Cliente
Operações
Comercial

- Detalhamento de escopo
- Orçamentação
- Cronograma

Precificação

O formulário de pré-vendas deve ser elaborado

Nota:
A equipe de pré-vendas é a mesma que analisa as várias demandas de outras áreas de define as OGs para Comité de Priorização

Regras gerais de gestão de demandas (1/2)

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Pode	Não pode
Iniciar projetos com ROI ou demandas estratégicas, que tenham o "de acordo" das áreas responsáveis: Giuseppe (BC para demandas operacionais e Pré Vendas) e Koreeda (necessidades de TI) – Comitê de Priorização	Iniciar projetos /demandas sem as devidas aprovações no Comitê de Priorização
Pedir revisão do ROI ou da decisão, durante o projeto, se houver indícios de desvio nos ganhos projetados	Cancelar projeto em desenvolvimento, sem forte motivo e aprovações devidas no Comitê de Caixa e sem divulgação do custo afundado
Respeitar SLA's de atendimento aos orçamentos e projetos de acordo com tabela de SLAs (a definir)	Acordar datas com clientes e/ou com recursos internos fora do SLA combinado, sem as devidas autorizações da Diretoria responsável
Alertar riscos de descumprimento de SLA e renegociar novas datas, com as devidas autorizações	Descumprir os SLAs acordados, sem motivo justo ou negociação devida e autorizações
Alertar a necessidade de compras para Suprimentos, com datas acordadas (conforme tabela de SLAs e Matriz de responsabilidades)	Realizar compras sem a participação da área de Suprimentos e fora das regras da empresa
Área demandante abrirá a SC e defenderá no Comitê de Caixa. Demandas e Projetos são defendidos pela área de negócio responsável	Outra área abrir SC em nome da área demandante e responsabilizar-se indevidamente
Classificar adequadamente as demandas → demanda vs. projeto, conforme regras acordadas	Classificar a demanda de forma inadequada, que dificulte seu gerenciamento

Regras gerais de gestão de demandas (2/2)

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Pode	Não pode
A data de início do projeto / demanda é a data do aceite formal pelo responsável pela entrada do Projeto (após Comitê de Priorização)	Definir data de início do projeto sem o acordo entre as partes envolvidas e Comitê de Priorização
A entrada de novas demandas deve acontecer de forma consolidada 1x por semana conforme calendário proposto, com o respetivo escopo definido em formulário habitual e respetivo ganho financeiro	As novas demandas não devem ser solicitadas de forma apartada em calendário não acordado
A entrada de qualquer demanda de desenvolvimento (RTIs, novas ferramentas, etc.) deve ser acompanhada por uma Especificação Funcional	Uma demanda para novos desenvolvimentos ser considerada um projeto sem existência de uma EF
A nova demanda ficará em stand by até que exista priorização em Comitê e capacity disponível para execução	Entrada de novas demandas sem considerar o capacity de TI ou sem repriorizar a fila
Todas as demandas terão apenas um ponto focal que gerenciará a sua solicitação, atividades e finalização: - Milene em TI - Nara na Operação (não extensivo a todos os projetos)	Ter entradas de demandas por outros canais, que não tenham sido definidas e divulgadas para a empresa

Em discussão quem irá centralizar os restantes projetos de Operação, Comercial, etc.

Próximos passos

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

- Divulgação da metodologia apresentada para as áreas da empresa
- Definição dos canais de comunicação *(em andamento – equipe de Projetos Negócio e TI)*
- Divulgação de um modelo de EF a ser utilizado na solicitação de projetos de Desenvolvimento *(em andamento – equipe de Projetos Negócio)*
