
Id		% concluída	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
1		**50%**	**Projeto Elaboração Book Operação Claro**	**33 dias**	**Seg 21/03/16**	**Qua 04/05/16**	
2	✓	**100%**	**Levantamento Operacional**	**6 dias**	**Seg 21/03/16**	**Seg 28/03/16**	
3	✓	100%	Dados do Site	1 dia	Ter 22/03/16	Ter 22/03/16	
4	✓	100%	Disponibilizar organograma atualizado	4 dias	Ter 22/03/16	Sex 25/03/16	
5	✓	100%	Itens de Controle da Operação	4 dias	Ter 22/03/16	Sex 25/03/16	
6	✓	100%	Disponibilizar lista de Sistemas	1 dia	Ter 22/03/16	Ter 22/03/16	
7	✓	100%	Disponibilizar Manual dos Sistemas	5 dias	Seg 21/03/16	Sex 25/03/16	
8	✓	100%	Disponibilizar a lista / manual para inserção no Book	1 dia	Seg 28/03/16	Seg 28/03/16	3;4;5;6;7
9		**56%**	**Cadastro do Produto / Operação no tPRocess!**	**7 dias**	**Ter 22/03/16**	**Qua 30/03/16**	
10	✓	100%	Identificação das Classificações	2 dias	Ter 22/03/16	Qua 23/03/16	
11	✓	100%	Abertura do chamado	1 dia	Qui 24/03/16	Qui 24/03/16	10
12		30%	Execução do chamado	3 dias	Sex 25/03/16	Ter 29/03/16	11
13		0%	Disponibilizar a lista para inserção no Book	1 dia	Qua 30/03/16	Qua 30/03/16	12
14	✓	**100%**	**Liberação de acesso Sistema de Chamado Claro**	**8 dias**	**Seg 21/03/16**	**Qua 30/03/16**	
15	✓	100%	Enviar procedimento de cadastro Ferramenta SAN - Claro	2 dias	Seg 21/03/16	Ter 22/03/16	
16	✓	100%	Disponibilizar lista dos usuários para criação do acesso	1 dia	Qua 23/03/16	Qua 23/03/16	15
17	✓	100%	Abertura do chamado na Claro	1 dia	Qui 24/03/16	Qui 24/03/16	16
18	✓	100%	Execução do Chamado	3 dias	Sex 25/03/16	Ter 29/03/16	17
19	✓	100%	Disponibilizar a lista para inserção no Book	1 dia	Qua 30/03/16	Qua 30/03/16	18
20	✓	**100%**	**Estrutura Claro**	**5 dias**	**Ter 22/03/16**	**Seg 28/03/16**	
21	✓	100%	Disponibilizar SLA de Chamados (Incidentes e Requisição de Serviços)	5 dias	Ter 22/03/16	Seg 28/03/16	
22	✓	100%	Disponibilizar informação sobre período funcional (Operação Assistida)	5 dias	Ter 22/03/16	Seg 28/03/16	
23	✓	100%	Disponibilizar Matriz de Suporte	5 dias	Ter 22/03/16	Seg 28/03/16	
24		**18%**	**Levantamento Técnico**	**11 dias**	**Seg 28/03/16**	**Seg 11/04/16**	
25		0%	Levantamento Informações de Telecom	7 dias	Seg 28/03/16	Ter 05/04/16	
26		0%	Levantamento Informaçoes de Microsoft	7 dias	Seg 28/03/16	Ter 05/04/16	
27		0%	Levantamento Informações de Aplicações	7 dias	Seg 28/03/16	Ter 05/04/16	
28		0%	Levantamento informações de Rede	7 dias	Seg 28/03/16	Ter 05/04/16	
29		64%	Levantamento da Topologia	11 dias	Seg 28/03/16	Seg 11/04/16	
30		**0%**	**Elaboração do Book Claro**	**15 dias**	**Qui 14/04/16**	**Qua 04/05/16**	
31		0%	Elaboração do Modelo - Book Claro	10 dias	Qui 14/04/16	Qua 27/04/16	
32		0%	Receber as Informações Técnicas e Operacional	1 dia	Qui 28/04/16	Qui 28/04/16	8;13;19;21;22;2
33		0%	Consolidar as Informações no arquivo (Book Claro)	3 dias	Sex 29/04/16	Ter 03/05/16	32
34		0%	Divulgar para áreas interessadas	1 dia	Qua 04/05/16	Qua 04/05/16	33

Projeto: PROJETO ELABORAÇÃO B(
Data: Ter 19/04/16

Tarefa — Etapa — Tarefas externas
Divisão — Resumo — Etapa externa
Andamento — Resumo do projeto — Data limite

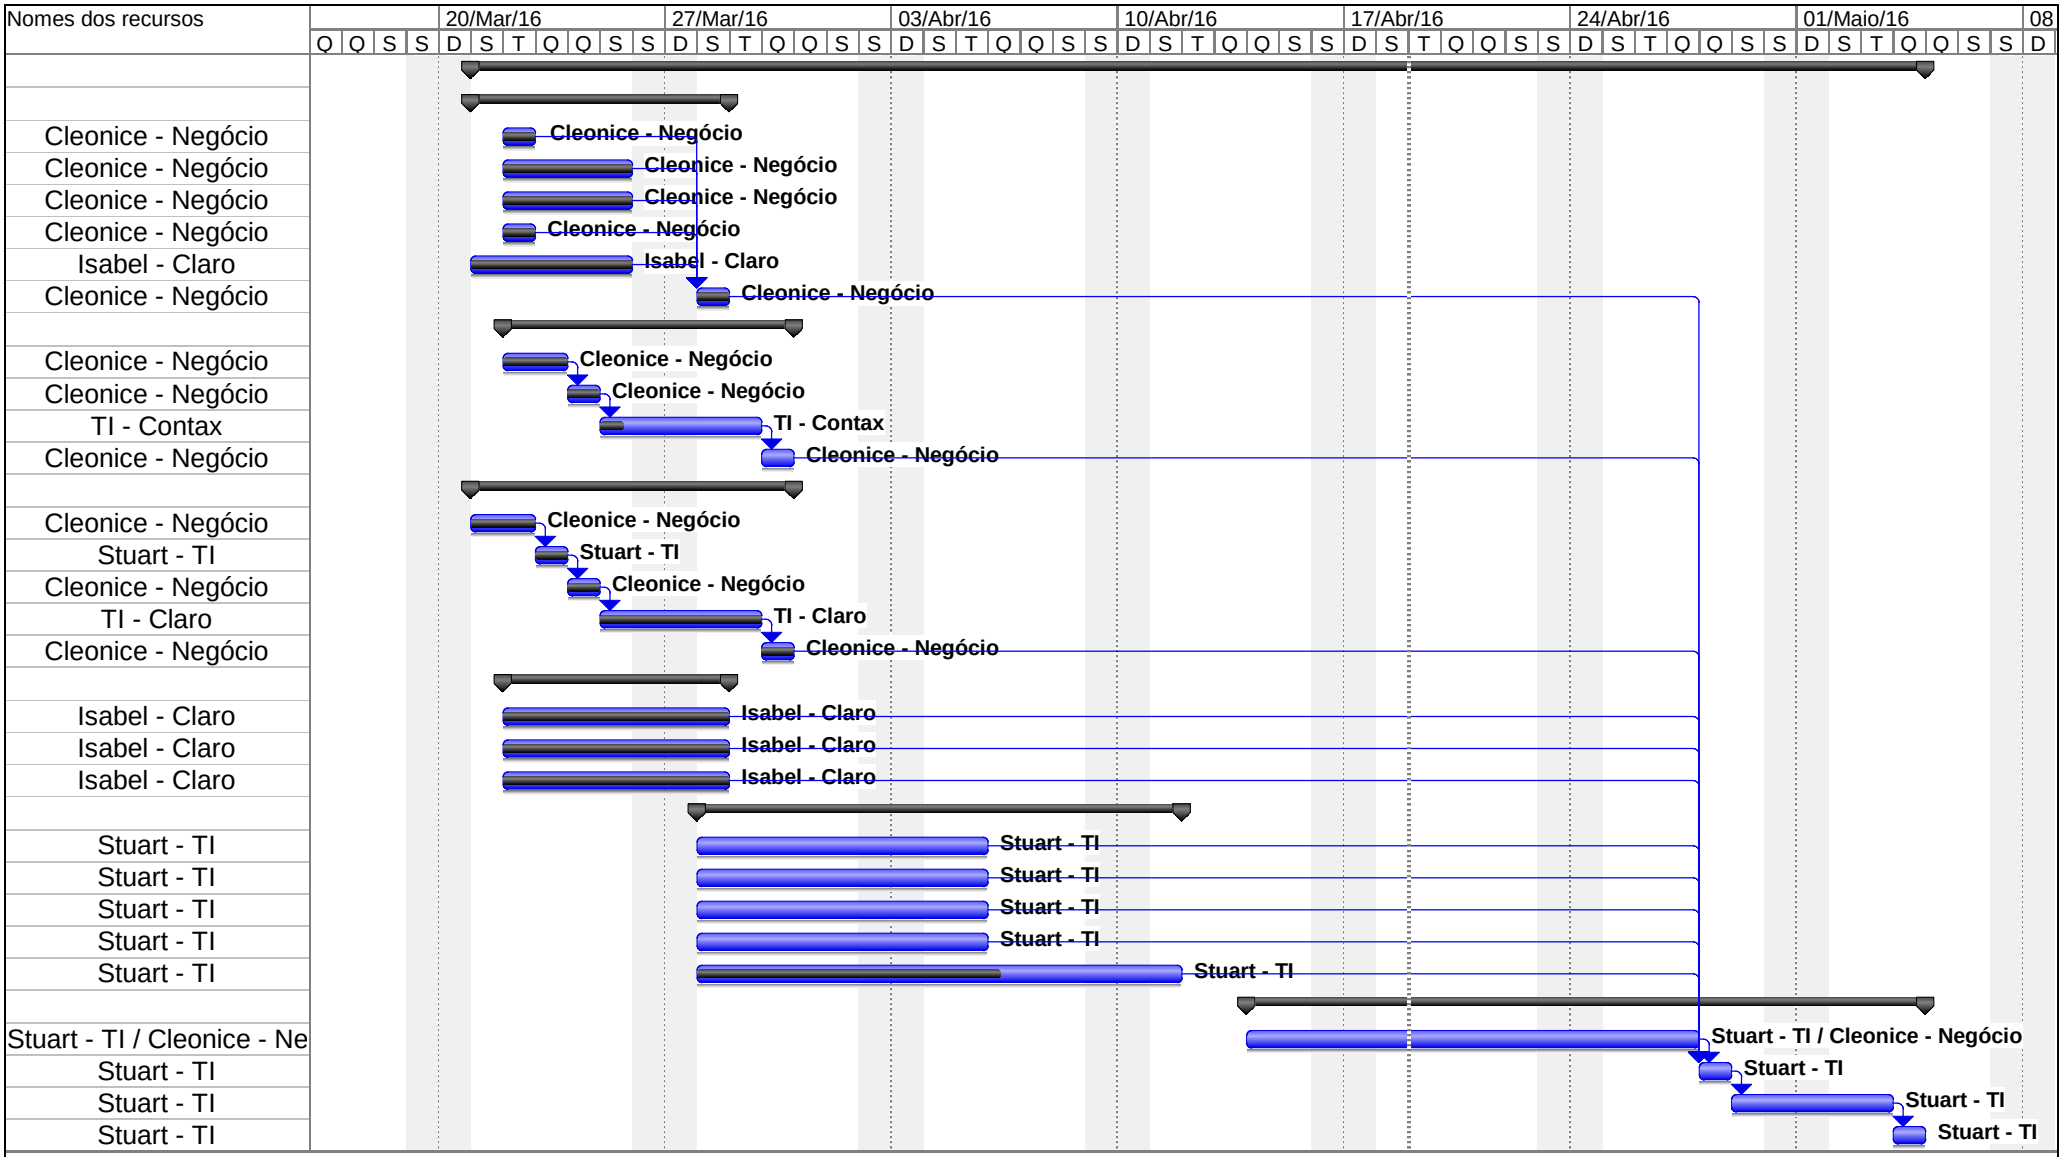

Projeto: PROJETO ELABORAÇÃO B(
Data: Ter 19/04/16

Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa externa	
Andamento		Resumo do projeto		Data limite	
