contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Contact Center

Estabilidade Operacional

25.Fevereiro.2016





contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Índice

1. Indicadores – Incidentes de Alto Impacto e Problemas
2. Indicadores – Total de Incidentes
3. Gestão de problemas
4. Indicadores – Total de Incidentes (Alto, Médio e Baixo)
5. Incidentes resolvidos de Alto Impacto
6. Vulnerabilidades Mapeadas
7. Processo Revisão de Incidentes de Médio Impacto
8. Plano de Comunicação e Escalonamento
9. Projetos Estruturantes e Especiais
10. Alinhamento


1. Indicadores: Incidentes Alto impacto e Problemas

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Volume de Incidentes Alto Impacto

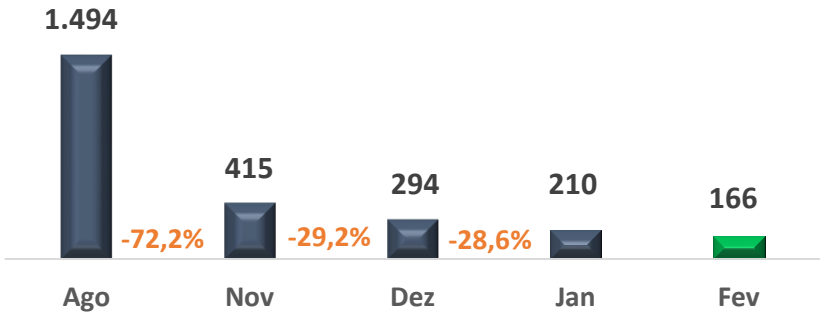

Média diária de Incidentes Alto Impacto

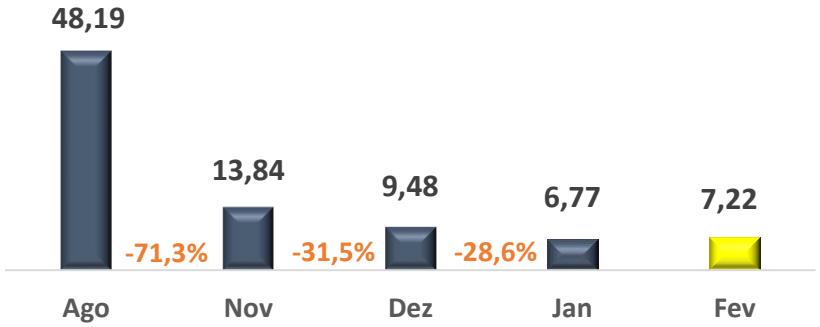


Redução *Consolidada* Ago / Dez -80,32%

Redução *Projetada* Ago / Fev -88,89%

Gestão de Problemas


Total 34

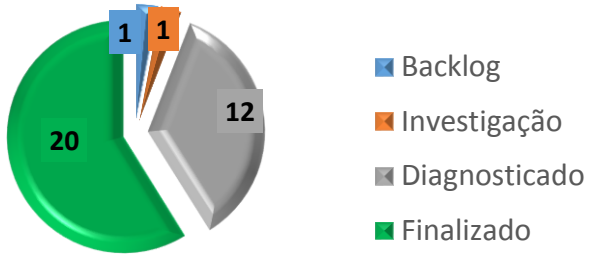

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 23/02.

CHACON | Consultoria Ilimitada

2. Indicadores: Total de Incidentes

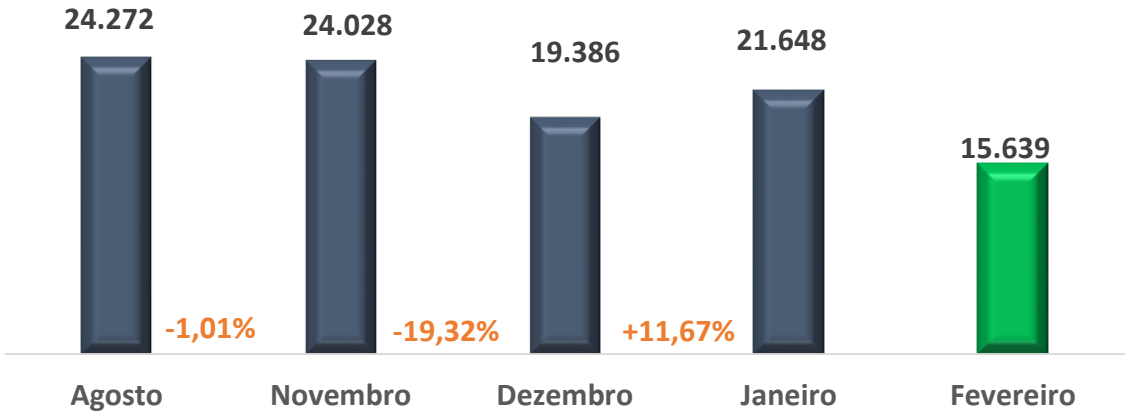

Fev - 29 dias	Real	Projeção	Meta	Desvio	Farol
Total	**15.639**	**19.719**	**21.954**	**-10,2%**	
Alto	166	209	**294**	-28,8%	
Médio	9.603	12.108	**13.076**	-7,4%	
Baixo	5.870	7.401	**8.305**	-10,9%	

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 23/02.

3. Gestão de Problemas

Problem Owner	Descrição do problema Componente | Localidade | Sintoma	Status	Data de registro	Next step	Origem dos problemas: 3 "por quês"- Tecnologia / Processos
Gestão de Problemas - Stuart Faria	Alarmes visuais - Falhas em HWs ambiente CPDs/Datacenters | Alerta de vulnerabilidade de falhas	Risco a ser mitigado	24/02/2016	Apresentar vulnerabilidade e apresentar sugestões	**Processual**: GAP no processo de checklist diário e controle de ambiente (Matriz de responsabilidade e site clean) + Morosidade no processo de aquisição de insumos + Falta de processo de cobertura por garantia **Tecnológica:** Obsolescência do parque + Falta de ferramenta de monitoração remota
CSE Discadores - Vinicius Cruz	ASPECT - Discador | Polo CE- Propenso OCT , TV , Ativo reversão Fixa , Velox -Nascente e Borges de Melo | Ligações Mudas	Andamento	04/12/2015	Viabilidade e data Oi para migração dos CCTOs E1 de R2 para ISDN - Pendente retorno via Simone Lopes	**Tecnológica:** Configuração de "wait time" e performance da plataforma / CCTO E1 **Processual:** Fragilidade do processo de transição de serviço com validação de parâmetros e considerar ISDN preferencialmente para versão discador
CSE Discadores - Alexandre Yukio	Avaya - APC - Discador | Bahia | Operações Oi ativo| Discador não realiza discagens	RCA Pendente	06/02/2016	Receber análise de causa raiz para perda de validação de licença da plataforma	-

3. Gestão de Problemas

Problem Owner	Descrição do problema Componente | Localidade | Sintoma	Status	Data de registro	Next step	Origem dos problemas: 3 "por quês"- Tecnologia / Processos
Não atribuído	Ayty CRM | Pernambuco |Falha no front end	Registrado	04/02/2016	Avaliar aceitação do problema	-
CSC Noc - Katia Lustosa	Ayty Database - DBSCTX121SPODA |Santander Pernambuco | Alta reincidência de alarme em monitoração do NOC	Andamento	12/02/2016	Avaliação dos volumes de armazenamento + Performance servidor (I/O, peaks,etc..)	**Tecnológica**: Alocação de memória para instância SQL e ?Validação de unidade e discos de armazenamento? **Processual**: Falta de documentação default para deploy de servidores +?Falha no desenho?
Gestão de Problemas - Stuart Faria	By Contax| Módulo Financeiro New Age | Vulnerabilidade de suporte especializado	Risco a ser mitigado	24/02/2016	Conversar com Alexandre Morais, pois parece haver histórico anterior para este assunto	**Processual**: Descontinuidade de suporte para ferramenta em produção
Gestão de Problemas - Stuart Faria	GNK URA |Cielo | Fidelidade |Ligação ficando muda/presa durante navegação	Risco a ser mitigado	03/02/2016	Definir estratégia para risco. É possível migrar plataforma?	**Tecnológica:** Aguardando receber parecer do fornecedor + controle de conteúdo - Proxy **Processual:** ?Houve mudança no ambiente? Há GMUD?
CSE Redes - Rogério Santos	MPLS IP | Mauá | Largura de banda de CCTO BKP inconsistente	RCA Pendente	17/02/2016	Análise de ocupação de tráfego MPLS	**Processual:** ? Transição de serviço? Mudança? Contratação de serviços e/ou projeto inadequado?

3. Gestão de Problemas

Problem Owner	Descrição do problema Componente | Localidade | Sintoma	Status	Data de registro	Next step	Origem dos problemas: 3 "por quês"- Tecnologia / Processos
CSC Noc - Mauro Belvedere	NGR - Bilhete ECH | NOC |DAC Mackenzie A - Possivel falha na carga de bilhetes ECH	Homologação	26/01/2016	Sendo homologado pelo NOC para fechamento final do problema	**Processual**: Falta de ferramentas e treinamento da equipe Noc para validação de ambiente antes de registro de tkt com "falso-positivo"
Gestão de Problemas - Stuart Faria	CPD Alegria - Falha SDH Oi - CCTOs Oi Metro multi localidade | Indisponibilidade de comunicação Alegria x Sites Brasil | Crítico	Andamento	23/02/2016	Implementar GMUD interna Contax + Oi finalizar a conexão de nova fonte elétrica ao SDH	**Tecnológica**: Falha em equipamento retificador do SDH Oi, no ambiente CPD Alegria, possivelmente por obsolescência. **Processual:** A ser tratado em outra frente, relacionado a vulnerabilidade dos roteamentos Contax
Produção - Rafael Alves	Projeto Back up |Todos os sites | Falta de backup de servidores críticos |	Andamento	14/10/2015	Criação de system state para recovery + Continuidade da implantação das rotinas de BKP	**Tecnológica:** Insumos (Robôs + Fitas) para determinadas localidades **Processual :** GAPs importantes de documentações nas pontas, falta de report de serviços hospedados e diretórios críticos de BKP + Falta de invetário preciso de ativos + Falhas na transição de serviços e GAPs de comunicação ao time de BKP, falta de plano de recovery + Inesistência de "system state" + Desestruturação das pontas com projeto "site clean", onde se perdeu histórico e matriz de responsabilidade para processo

3. Gestão de Problemas

Problem Owner	Descrição do problema Componente | Localidade | Sintoma	Status	Data de registro	Next step	Origem dos problemas: 3 "por quês"- Tecnologia / Processos
Produção - Rafael Alves	Projeto NICE - Gravador Legado | Multi localidades | Perda de gravações | Não grava	Andamento	09/12/2015	Extenso - Melhor detalhado no projeto	**Tecnológica:** Em avaliação **Processual :** Em avaliação
Produção - Rafael Alves	Projeto NICE - Gravador NGR | Contax 2.0 | Falha em gravação e/ou recuperação de áudio | Multa	Andamento	12/02/2016	Extenso - Melhor detalhado no projeto	**Tecnológica**: Perdas de conexões a determinados serviços + "pendente avaliações mais profundas do forncedor" **Processual**: Falhas no processo de controle proativo do ambiente + Falta de matriz de responsabilidades bem definida + "em andamento"
CSE Redes - Rogério Santos	Projeto Oi Citrix |Santo Amaro | Citrix Web Apresentando travamento para site Santo Amaro	Andamento	21/01/2016	Avaliação da rede (Raio X) e plano de disaster recovery	**Tecnológica:** Configuração adequada de roteamento e alocação de banda para saídas Contax X Oi. + Falta de visibilidade das cargas (Origens -> Destinos) das aplicações Oi e suas rotas + Falta de padronização na rede. **Processual**: Falta de documentação e padronização desta relação.+ Inexistência de "disaster plan" + Falta de topologia detalhada de item crítico para operações Contax

3. Gestão de Problemas

Problem Owner	Descrição do problema Componente | Localidade | Sintoma	Status	Data de registro	Next step	Origem dos problemas: 3 "por quês"- Tecnologia / Processos
Aplicações - Vicente	tClock | Todos os sites | Lentidão da ferramenta e tela branca	Andamento	12/02/2016	Homologação de nova versão do totem, previsto para 25/02	-
Aplicações - Camila Firmiano	tCollect - Televendas Oi - Prado II - Broges de Melo | Lentidão para pop up de tela |	Andamento	09/11/2015	Agendamento de GMUD programado para dia 23/02. **Pendente retorno do Alexandre Morais**	**Tecnológica:** Necessidade de procedimentos de manutenção dos servidores (rotinas de limpeza e defrag de discos, anti vírus, patches e boot,etc) para melhoria de performance e liberação de memórica CACHE, falha em servidor de app do pool que precisou ser reinstalado (incrementava falhas e causa raiz não foi identificada), falha no set up do pool dos servidores cluster - após solução de contorno. **Processual**: Falta de processo adequado para nível de permissionamentos(controles e políticas de acesso) + ? possíveis mudanças invisíveis? + Matriz de responsabilidade de suporte mal definida e acordada (Solução de 4 mãos) + Gap no processo de manutenção dos servidores


3. Gestão de Problemas

Problem Owner	Descrição do problema Componente | Localidade | Sintoma	Status	Data de registro	Next step	Origem dos problemas: 3 "por quês"- Tecnologia / Processos
Sites - Alexandre Pardal	Vivo Sistemas + 360 | Vivo João Pessoa | Lentidão ao logar nos sistemas e desktop	Andamento	27/01/2016	Execução de GMUD 19474 para migração de autenticação em Domain Controllers na estrutura Datacenter	**Tecnológica:** Baixa performance do tunelamento de rede criado anteriormente para saída VIVO, complexidade do roteamento da rede + Alto tempo de resposta para autenticação em DCs em Campinas e Londrina **Processual:** Falha na concepção do projeto, onde não se balizou o modelo "cloud" para sites clean, com autenticação DCs em sites legado + Falha na transição dos serviços com homologação ineficiente
Gestão de Problemas - Stuart Faria	Webchat Genesys |Pernambuco |Site Oi Chat R1 e R2 indisponíveis	Risco a ser mitigado	01/12/2015	Definir estratégia para risco	**Tecnológica**: Não identificada **Processual:** Falta de suporte especializado para solução + Sem contrato externo de manutenção + Sem capacitação de time interno para suporte da ferramenta

4. Indicadores: Total de Incidentes Alto

Meta < 294

Atual 166

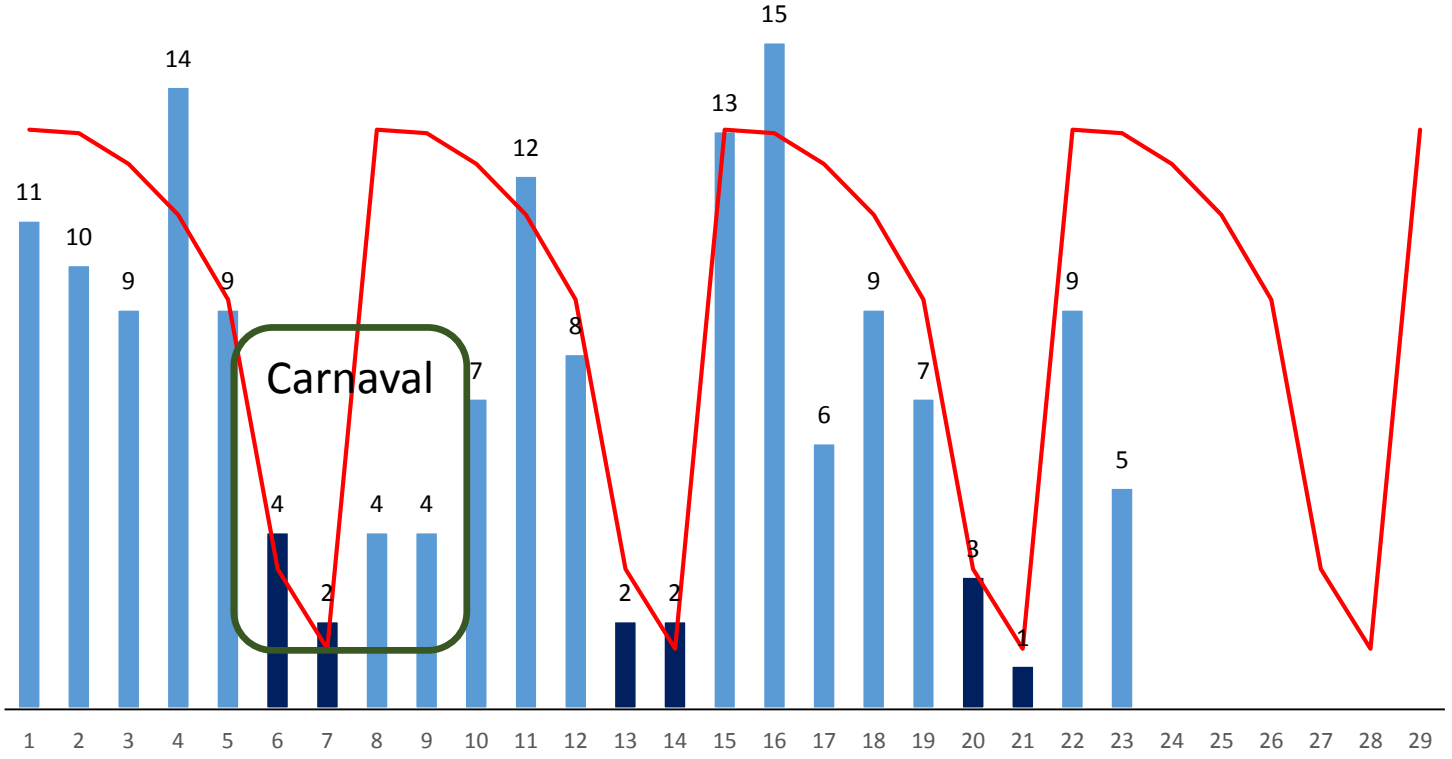

04 - Itaú
11 - TAM, Santander e Souza Cruz.
16 - Oi


Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 23/02.

4. Indicadores: Total de Incidentes Médio

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Meta < 13.076

Atual 9.603

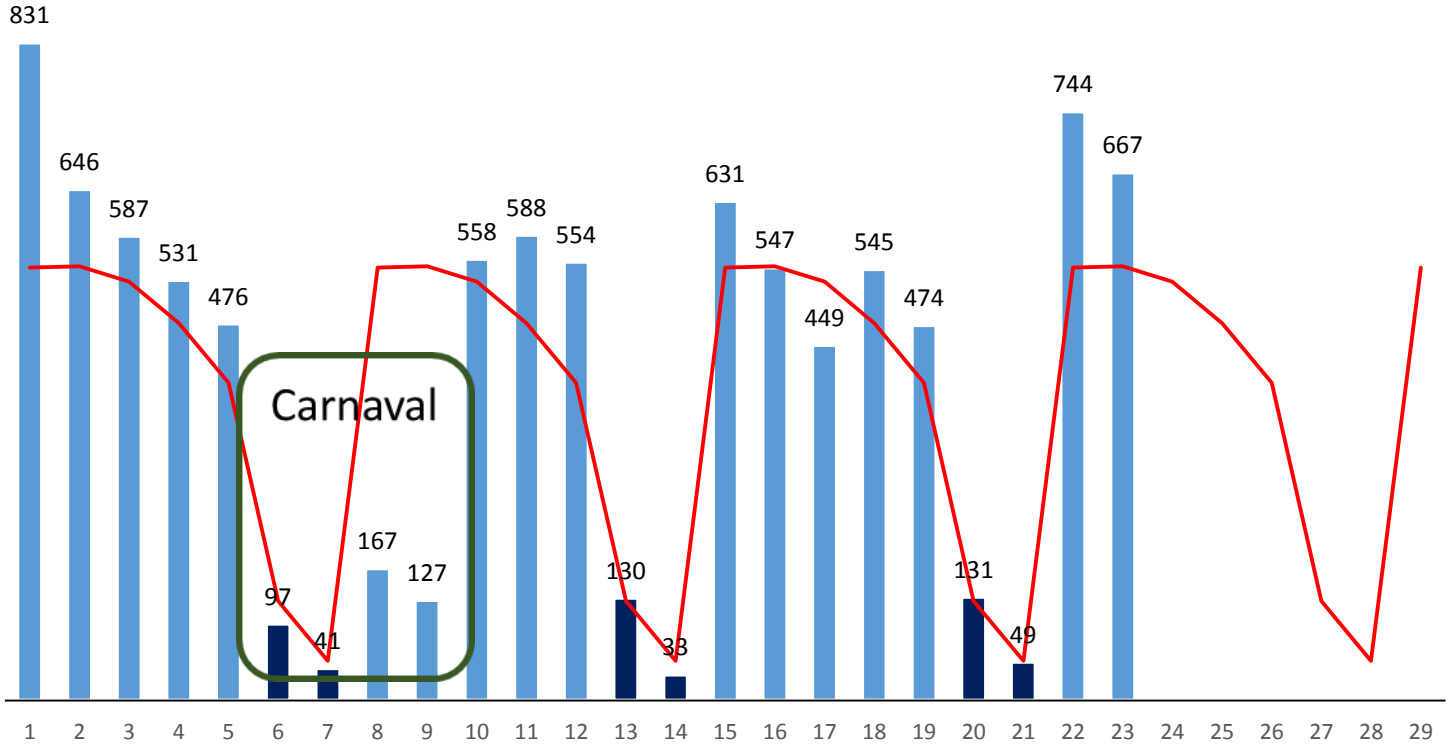

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 23/02.


CHACON | Consultoria Ilimitada

4. Indicadores: Total de Incidentes Baixo

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Meta < 8.305

Atual 5.870

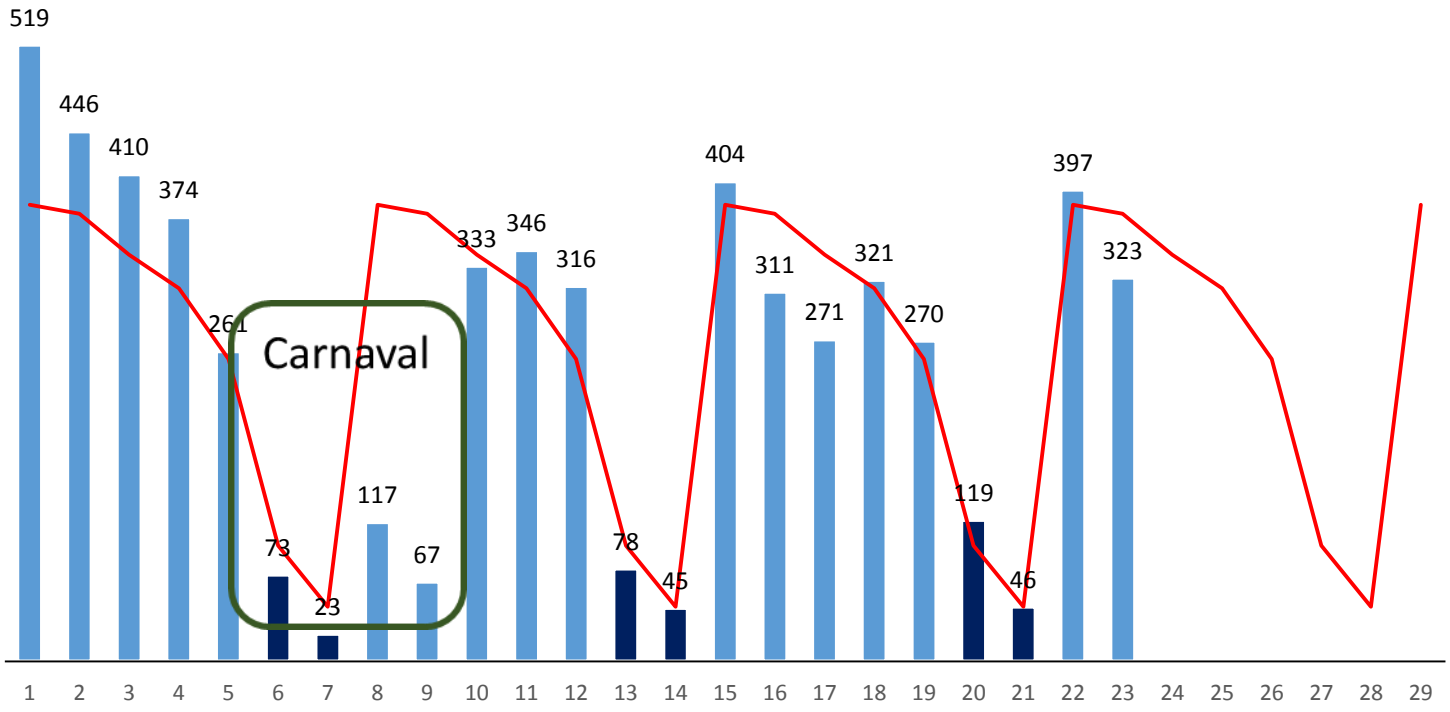


Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 23/02.

CHACON | Consultoria Ilimitada

5. Incidentes Resolvidos de Alto Impacto

De 01 a 23 de Fevereiro de 2016

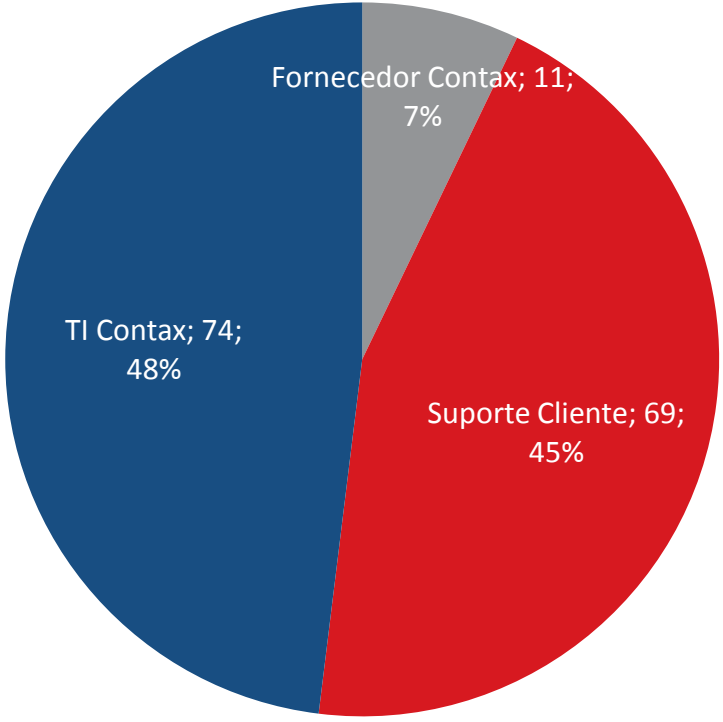

5. Incidentes Resolvidos de Alto Impacto

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Todos os Incidentes	
Tipo	Quantidade
Aplicativo	114
Infra	43
Em análise	9
Total	166

Aplicação	Quantidade
STC	11
ATLYS	8
NICE	8
VIVO 360	7
AYTYCRM	5
ALTITUDE	4
PRC	4
CALLCENTER	3
FRONT END	3
FRONT FACIL	3

Infraestrutura	Quantidade
URA	18
GRAVADORES	15
DAC	3
REDE	2
SERVIDOR	2
BANCO DE DADOS	1
DISCADOR	1
HARDWARE	1

TI Contax	
Tipo	Quantidade
Aplicativo	43
Infra	32
Em análise	2
Total	77

Aplicação	Quantidade	
NICE	8	● ●
ALTITUDE	4	
AYTYCRM	3	●
FRONT END	3	
TCLOCK	3	●
FRONT FACIL	2	
JIRA BO ANATEL	2	
TLV	2	
WEBCHAT	2	●
AMDOCS	1	

Infraestrutura	Quantidade	
GRAVADORES	15	● ●
URA	9	
DAC	2	
REDE	2	●
SERVIDOR	2	
DISCADOR	1	
HARDWARE	1	

● Projeto ● Problema

De 01 a 23 de Fevereiro de 2016

5. Incidentes Resolvidos de Alto Impacto

Todos os Incidentes		
Classificação	Quantidade	%
Cliente	61	37%
Em análise	32	19%
Software	29	17%
Processo	15	9%
Hardware	10	6%
Fornecedor	8	5%
Rede	6	4%
Operacional	2	1%
Fornecedor cliente	1	1%
GMUD	1	1%
GMUD cliente	1	1%

TI Contax		
Classificação	Quantidade	%
Software	25	32%
Em análise	21	27%
Processo	15	19%
Hardware	9	12%
Rede	4	5%
Operacional	2	3%
GMUD	1	1%

De 01 a 23 de Fevereiro de 2016

5. Incidentes Resolvidos de Alto Impacto

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

SOFTWARE		
Aplicativo	**Quantidade**	**%**
ALTITUDE	2	8%
AYTYCRM	2	8%
FRONT FACIL	2	8%
NICE	2	8%
JIRA BO ANATEL	1	4%
SAC	1	4%
TCLOCK	1	4%
VIVO 360	1	4%
WEBCHAT	1	4%
Infra	**Quantidade**	**%**
GRAVADORES	8	32%
URA	3	12%
DISCADOR	1	4%

PROCESSO		
Aplicativo	**Quantidade**	**%**
NICE	3	21%
ALTITUDE	1	7%
CLEARSALE	1	7%
UNIFIC	1	7%
WEBCHAT	1	7%
Infra	**Quantidade**	**%**
GRAVADORES	3	21%
URA	2	14%
HARDWARE	1	7%
REDE	1	7%

HARDWARE		
Aplicativo	**Quantidade**	**%**
FRONT END	2	22%
TCLOCK	1	11%
TLV	1	11%
Infra	**Quantidade**	**%**
GRAVADORES	2	22%
URA	2	22%
SERVIDOR	1	11%

REDE		
Aplicativo	**Quantidade**	**%**
ALTITUDE	1	25%
AYTYCRM	1	25%
CRV	1	25%
Infra	**Quantidade**	**%**
REDE	1	25%

OPERACIONAL		
Aplicativo	**Quantidade**	**%**
GENERATION	1	50%
Infra	**Quantidade**	**%**
GRAVADORES	1	50%

GMUD		
Infra	**Quantidade**	**%**
SERVIDOR	1	100%

De 01 a 23 de Fevereiro de 2016

6. Vulnerabilidades Mapeadas

RISCOS A SEREM EVITADOS	TIPO DE RISCO	Implicação Risco	COMO EVITAR O RISCO
Rompimento de fibras de comunicações do site Alegria com paralização do negócio principal da Contax nível Brasil.Atualmente as fibras estão expostas ao risco de rompimento caso um veículo mais alto passe pela Rua Alegria	Continuidade de negócio	Incidente de TI Grave	Mitigar os riscos iminentes de rompimento das PRINCIPAIS abordagens de dados do site, através de passagem subterrânea e preferencialmente em abordagens distintas. Atividade a ser conduzida por fornecedores com GMUD alinhada com a Contax.
Perda de dados por falhas em HDs.Atualmente temos mais de 200 alarmes críticos já constatados e eminentes de falha que podem indisponibilizar as mais diversas aplicações e tipos de dados	Continuidade de negócio	Danos financeiros e de imagem	Através de um processo urgente de aquisição e correção dos alarmes de discos consolidados por todas as regionais.
Descontinuidade do negócio por falha em circuito de dados BKP. MPLS	Continuidade de negócio	Danos financeiros e de imagem	Realização de testes de continuidade e failover. Garantia de um melhor nível de serviço de nossos fornecedores
(DBA) Ambientes SQL Server com versão 2005 e Service Pack inferior a SP4 (total de 69 instâncias).Sem suporte; Não contempla as últimas correções de segurança e melhorias disponibilizadas pela Microsoft;	Descontinuidade de serviço	Ineficiência operacional	Aplicar último Service Pack (SP4) ou upgrade para versão recente. No caso de upgrade para novas versões, imprescindível envolvimento da equipe de Aplicação/Dev.
(HW) Equipamentos Obsoletos e Sem Garantia	Continuidade de negócio	Incidente de TI Grave	Realizar estudo para troca dos equipamentos obsoletos
(SW) Licenças Emuladores: (-6869) Hostexplorer - US$ 480.830 (-1825) Extra! - US$ 262.343,75	Conformidade contratual	Multa contratual	Adquirir Licenças

Vulnerabilidades Mapeadas

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

RISCOS A SEREM EVITADOS	TIPO DE RISCO	Implicação Risco	COMO EVITAR O RISCO
(SW) (-137) Licenças Oracle (Não renovadas) - US$ 1.575.500	Conformidade contratual	Multa contratual	Migrar bases para Exadata
(RD) Substituição de firewalls PIX	Continuidade de negócio	Incidente de TI Grave	Aquisição ou remanejamento de hardware.
(RD) Ajuste de cabeamento em CPD e telemáticas	Continuidade de negócio	Incidente de TI Grave	Auditoria e adequação de todos os sites. Talvez seja necessário contratar um empresa.
Servidores, Storage sem contrato de manutenção e suporte	Obsolescência	Ineficiência operacional	Renovar os contratos de suporte e manutenção com os fabricantes
Problemas de replicação no storage de gravações X9000	Perda de dados	Perda financeira / Inaderência SLA	A solução não funciona de maneira satisfatoria, deve ser substituida.
Voicer- ITIN	Conformidade contratual	Perda de nível de serviço	Garantir o contrato com o fornecedor
PRGSOFT	Conformidade contratual	Oportunidade de saving	Através de contrato com o fornecedor ou cancelando e buscando solução da cia
Aplicações sem contrato com Fornecedor	Conformidade contratual	Perda financeira / Inaderência SLA	1. Efetuar mapeamento de todas as aplicações sem contrato.2. Analisar sistema por sistema em busca de viabilizar a renovação do contrato e ou substituição do mesmo. 3. Em ultimo caso internalizar. Ex: Modudo Financeiro utilizado da URC Oi; Sistemas da PRGSoft
Processo de compra	Processo	Ineficiência operacional	Melhorando o processo de solicitação e aprovação das solicitações e pagamentos aos fornecedores.

Vulnerabilidades Mapeadas

Queima de Servidores ou Switches Core's - Indisponibilidades de serviços e comunicações - Possibilidade de acidentes com funcionários.	Ambiente de TI - Infra	Incidente de TI Grave	Adequar, instalar ar condicionado afim de remover os ventiladores do CPD.
Inaderência ao SLA de recuperação de gravações por obsolescência do parque e inadequação da tecnologia atual ao modelo de processos e pessoas definidas pelo projeto inacabado:"site clean"	Operacional / Financeiro	Perda financeira e de imagem	Modernização do ambiente de gravação em conjunto com um processo de levantamento de dados para garantia do processo de gravação.
Consciliar a concorrencia do dia a dia com projetos, demandas e mudanças	Capacity Plan	Super-alocação de recursos humanos	limitar quantidade maxima de recursos envolvidos com projetos e demandas ou dimensionar a equipe conforme necessidades do negocio
Falta de Redundâcia de Links MPLS em Sites	Continuidade de negócio	Incidente de TI Grave	Instalar o segundo link MPLS nos sites que estão faltando, acertar o BGP, e garantir que os links MPLS de um mesmo site possua as mesmas bandas.
Falta de Contrato de Suporte de Equipamentos de Rede dos sites	Conformidade contratual	Ineficiência operacional	Contratar suporte adequando ao SLA do Site.
Equipamentos de Rede EoS e EoL	Obsolescência	Incidente de TI Grave	Efetuar um refresh dos equipamentos de rede dos Sites.
Falta de redundância do Ambiente de Clientes no DC Alegria (Sky, Claro, Nextel, etc).	Continuidade de negócio	Perda de nível de serviço	Comprar firewalls que suportem HA para as funcionalidades necessárias.
Indisponibilidade de Rede nos sites	Continuidade de negócio	Incidente de TI Grave	Colocar switches core/distribuição redundantes, colocar uplinks para estes switches também redundantes.

Vulnerabilidades Mapeadas

RISCOS A SEREM EVITADOS	TIPO DE RISCO	Implicação Risco	COMO EVITAR O RISCO
Bugs na Plataforma Avaya	Continuidade de negócio	Incidente de TI Grave	Atualização da Plataforma Avaya
Conflito e restrições de recursos humanos especializados (CSE) para o atendimento de demandas de : Projetos, Sustentação, Gestão de Problemas, Engenharia,etc...	Capacity Plan	Super-alocação de recursos humanos	Estruturação da área, conforme proposta enviada

7. Processo revisão de Incidentes de Médio Impacto

- **Identificar**, pela manhã ou ao final do dia, **todos os incidentes que afetam operações** de clientes que **já superaram ou superarão** mais de 24 horas desde o registro.

- Alertar os responsáveis pelos incidentes para que **reavaliem os atributos (categoria, impacto...) e decidam se deve haver escalada hierárquica**, de modo a não permitir que nenhum incidente que afete a operação de clientes permaneça sem acompanhamento apenas por ter sido categorizado na origem com baixo ou médio impacto.

Dinâmica proposta sob análise de viabilidade.

8. Plano de Comunicação e Escalonamento

Incidentes Críticos e Muito Alto

Comunicação



Escalonamento



9. Projetos Estruturantes e Especiais

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Status do Projeto					Status das SCs			
Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos	Valor	Descritivo	Status das SCs
Portfólio de projetos Estabelização	45%	169 dias	Qua 14/10/15	Seg 06/06/16				
Projetos Estruturantes	48%	135 dias	Qua 14/10/15	Ter 19/04/16				
Proj Aspect 7.3 (infra)	75%	135 dias	Qua 14/10/15	Sex 04/03/16	Luiz Washington	N/A	N/A	N/A
Proj Gravacao (NICE) TAM e VIVO	25%	106 dias	Qua 14/10/15	Qua 09/03/16	Thiago Sousa	R$ 30.000,00	Aquisição de 12 HDs	SC 775 - A equipe de suprimentos/Aquanima esta alinhando a entrega dos equipamentos com o fornecedor em 12 dias.
Proj Monitoração	54%	99 dias	Qua 14/10/15	Seg 29/02/16		N/A	N/A	N/A
Proj Monitoração (Dell-Open Manager)	61%	95 dias	Qua 14/10/15	Ter 23/02/16	Julio Cesar	N/A	N/A	N/A
Proj Monitoração (Zabbix)	49%	96 dias	Seg 19/10/15	Sex 22/04/16	Julio Cesar	R$ 19.000,00	Consultoria e certificação ZABBIX	SC 750 - pedido emitido 2678
Proj Redundância links MPLS	20%	65 dias	Ter 01/12/15	Seg 11/04/16	Luis Marçal	N/A	N/A	N/A
Proj Backups e Restore em Produção	52%	122 dias	Qua 14/10/15	Qui 31/03/16	Rafael Alves	N/A	N/A	N/A
Proj Qualidade em Gravação	4%	66 dias	Qua 24/02/15	Seg 23/05/16	Luis Marçal	N/A	N/A	N/A
Projetos Especiais	60%	42 dias	Sex 04/12/15	Seg 01/02/16		N/A	N/A	N/A
Proj OCS Inventory	64%	91 dias	Sex 04/12/15	Seg 08/04/16	Thiago Sousa	N/A	N/A	N/A
Projetos Novos	5%	59 dias	Ter 01/03/16	Sex 15/04/16		N/A	N/A	N/A
Proj Automação de Infra	0%	34 dias	Ter 01/03/16	Sex 15/04/16	Luis Marçal	N/A	N/A	N/A
Proj Migração Polo Aspect BH	5%	59 dias	Ter 19/02/16	Sex 20/05/16	Leonardo Marques	N/A	N/A	N/A
Projetos temporariamente suspensos	20%	165 dias	Ter 20/10/15	Seg 06/06/16				
Proj Ura Internalização	20%	165 dias	Ter 20/10/15	Seg 06/06/16	Luis Marçal	R$ 75.000,00	Capacitação equipes de suporte e certificação	SC 784 e 785 - Processo Concluído

9. Projeto: Proj Aspect 7.3 (infra) System 1

Projeto: Proj Aspect 7.3 (infra)
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 04-03-2016
Progresso: 75%
PM: Luiz Washington



Descritivo: Este projeto tem como escopo, preparar/adequar toda a infra de HW para instalar a versão 7.3 do Aspect para 2000 PAs.

Último Status

- Configuração dos UMS.

Objetivos alcançados na última semana

- Realizada a validação da Plataforma (APEA) – identificado ajustes que devem ser feitos. Conclusão dos ajustes previsto para 26/02

Riscos/Problemas/Observações

Observação

- Mesmo com a conclusão dos ajustes da plataforma, **não poderemos colocar o ambiente em produção devido a limitações de memória e disco,** está agendada uma reunião entre Engenharia e CSE para definirmos quais ações deverão ser tomadas para resolver estas limitações.
- Versão 8.1 x Versão 8.0

9. Projeto: Migração Polo Aspect BH

Projeto: Migração Polo BH
Data Inicio: 19-02-2016
Data Conclusão: 20-05-2016
Progresso: 5%
PM: Leonardo Marques



Descritivo: Migrar as Operações que estão no Polo Aspect de BH para o Polo Aspect 7.3 (Datacenter)

Último Status

- ✓ Elaborado cronograma preliminar que será submetido a Operação, Planejamento e Equipe de Aplicações.

Objetivos alcançados na última semana

- Definido a data objetivo.
- Efetuado mapeamento de necessidades com as operações, planejamento e a fabrica.
- Contatado os fornecedores para receber propostas.

Riscos/Problemas/Observações

- Pontos de Atenção
  - Definição das datas de migração das Operações.
  - Contratação de troncos.
- Risco
  - Prazo para aprovação de treinamento (estimativa 160K).

9. Projeto: Gravação (Nice) TAM e VIVO

Projeto: Gravacao (NICE) TAM e VIVO
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 25-03-2016
Progresso: 26%
PM: Thiago Augusto



Descritivo: Este projeto tem como escopo, adequar infra de HW para instalar 3K licenças de gravação , atualmente sem uso.

Último Status

- Aguardamos a entrega dos 12 HDs

Objetivos alcançados na última semana

- Recebemos o numero do pedido de Suprimentos.

Riscos/Problemas/Observações

- Processo de compras demorado.
- SC 775 - A equipe de suprimentos/Aquanima esta alinhando a entrega dos equipamentos com o fornecedor em 30 dias.

9. Projeto: Monitoração Dell – Open Manager

Projeto: Monitoração (Dell-Open Manager)
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 23-04-2016
Progresso: 61%
PM: Júlio Cesar



Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware para eliminar a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Último Status

- Submetido o chamado de "abertura" de Vlans, para permitir o cadastro de equipamentos.
- A área de segurança detectou necessidade de homologar SW da Dell.

Objetivos alcançados na última semana

- Documentação SW submetida para parecer da área de segurança. Data....

Riscos/Problemas/Observações

- Demora ou recusa na homologação.

9. Projeto: Monitoração Zabbix

Projeto: Monitoração Zabbix
Data Inicio: 19-10-2015
Data Conclusão: 22-04-2016
Progresso: 49%
PM: Júlio Cesar



Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware e elimina a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Último Status

- ✓ SC 750 - pedido emitido 2678
- ✓ Nova data de conclusão do projeto 22 de Abril

Objetivos alcançados na última semana

- Continuação de cadastro pontual de equipamentos.

Riscos/Problemas/Observações

- Risco: Perda de proficiência na ferramenta for falta de treinamento.

9. Projeto: Redundância links MPLS

Projeto: Redundância links MPLS
Data Inicio: 01-12-2015
Data Conclusão: 11-04-2016
Progresso: 21%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Para dar **resposta imediata** a situações recorrentes de incidentes, relacionados com a perda de **Links** que interligam os sites da Contax, este projeto visa, **Garantir e documentar a funcionalidade da contingência e** validar caminhos possíveis e documentar ações.

Último Status

- ✓ Foi realizado com sucesso o teste de redundância de MPLS no site Navegantes (GMUD 19350)

Objetivos alcançados na última semana

- No site Navegantes no dia 18 de Fevereiro vai ser efetuada a correção /configuração nos equipamentos da VIVO para 400MB (GMUD 19412)

Riscos/Problemas/Observações

- Foi detectado que a banda contratada (25-06-2015) para o link MPLS VIVO no Site Navegante é de 400MB. Atualmente os equipamentos estão configurados para 100MB.

9. Projeto: Backups e Restore em Produção

Projeto: Backup & Restore Ambiente de Produção

Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 30-04-2016
Progresso: 52%
PM: Rafael Alves



Descritivo: Providenciar Backup em todos os equipamentos de produção da Contax. Garantir plano de restore do ambiente.

Último Status

- ✓ Instalação do piloto do ArcServe UDP para teste de backup e restore de ambientes Windows e Linux (Virtuais e Físicas) – Em andamento
- ✓ Escopo do projeto ampliado com restore para 30 de Abril
- ✓ Plano de restore iniciado

Objetivos alcançados na última semana

- Apoio da Regional NE e MG para suporte e discovery dos servidores nos sites
- Licença da feature ArcServe UDP recebida

Riscos/Problemas/Observações


- Queda na aderência de backup devido as desmobilizações de sites sem nossa ciência.
- Baixo índice de aderência no plano de restore devido a falta de infra.
- Armazenamento indevido das mídias causando degradação das mesmas.

Visão Macro - Cenário Atual

4285
Servidores inventariados

1970
servidores com backup

2315
servidores em processo de inserção

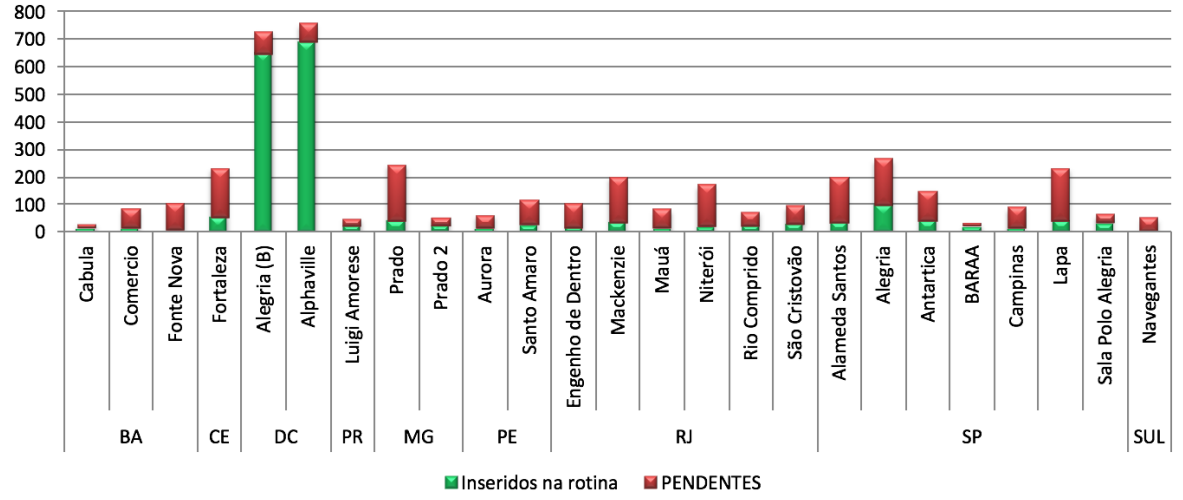

Detalhamento - Ofensores


Ofensores
• SUL o Aguardando transporte do robô pela Avantec para o site Navegantes (previsão 25/02/2016) • RJ o SC 246 foi aberta para transporte do robô de Alegria para Engenho de dentro; o SC 245 foi aberta para aquisição de fitas para backup da regional; o Reparo de três robôs da Mackenzie parados; • SP o Falta de fita na regional SP; o Reparo de robô no site Alegria, enviado o orçamento ao site para aprovação do custo. • Engenharia o Sem prioridade nas criações de rede de backup nos Data Centers. • CSE o Sem acesso a instalação dos agentes, retardando o serviço de inclusão de servidores até o atendimento do chamado; o 20 chamados aguardando instalação. • CONTAX o Equipamentos sem garantia; o Sem local adequado para a armazenar as fitas; o Apenas o site Mackenzie possui rede de backup apartada sem onerar o site.

Report - Site a Site

Regional	Site	TOTAL	Inseridos na rotina	PENDENTES	% faltante
BA	Cabula	27	14	13	48,15 %
	Comercio	81	11	70	86,42 %
	Fonte Nova	103	6	97	94,17 %
CE	Fortaleza	229	54	175	76,42 %
DC	Alegria (B)	727	647	80	11,00 %
	Alphaville	756	688	67	8,86 %
PR	Luigi Amorese	48	22	26	54,17 %
MG	Prado	242	42	200	82,64 %
	Prado 2	50	23	27	54,00 %
PE	Aurora	59	14	45	76,27 %
	Santo Amaro	114	26	88	77,19 %
RJ	Engenho de Dentro	102	16	86	84,31 %
	Mackenzie	199	34	165	82,91 %
	Mauá	82	14	68	82,93 %
	Niterói	171	18	153	89,47 %
	Rio Comprido	73	23	50	68,49 %
	São Cristovão	94	29	65	69,15 %
SP	Alameda Santos	200	36	164	82,00 %
	Alegria	264	98	166	62,88 %
	Antartica	147	40	107	72,79 %
	BARAA	30	20	10	33,33 %
	Campinas	89	12	77	86,52 %
	Lapa	229	42	187	81,66 %
	Sala Polo Alegria	62	31	31	50,00 %
SUL	Navegantes	50	0	50	100,00 %

Regional	Site	Visão **anterior**	Visão atual	Evolução
BA	Cabula	13	14	1
	Comercio	11	11	0
	Fonte Nova	6	6	0
CE	Fortaleza	54	54	0
DC	Alegria (B)	647	647	0
	Alphaville	688	688	0
PR	Luigi Amorese	22	22	0
MG	Prado	42	42	0
	Prado 2	23	23	0
PE	Aurora	14	14	0
	Santo Amaro	26	26	0
RJ	Engenho de Dentro	16	16	0
	Mackenzie	32	34	2
	Mauá	14	14	0
	Niterói	18	18	0
	Rio Comprido	23	23	0
	São Cristovão	29	29	0
SP	Alameda Santos	36	36	0
	Alegria	98	98	0
	Antartica	39	40	1
	BARAA	20	20	0
	Campinas	8	12	4
	Lapa	37	42	5
	Sala Polo Alegria	23	31	8
SUL	Navegantes	0	0	0

Time Line

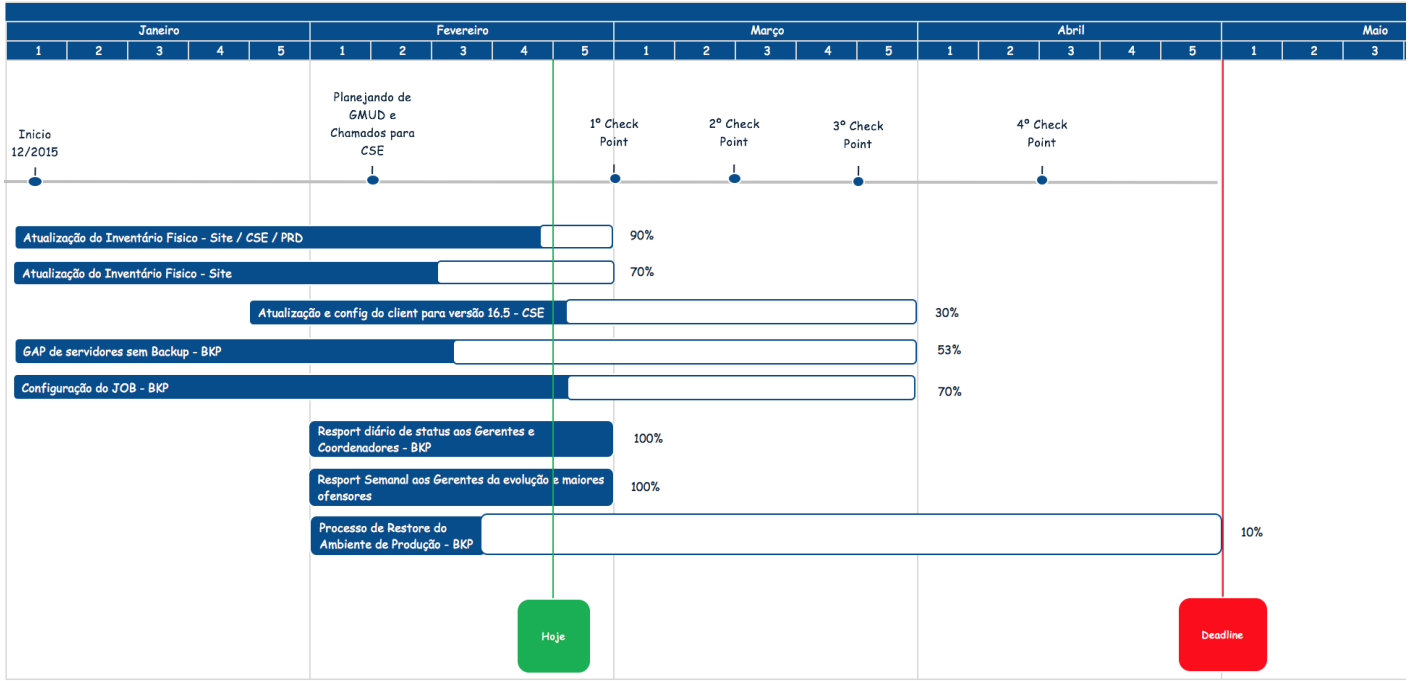
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
Inicio 12/2015
Planejando de GMUD e Chamados para CSE
1º Check Point
2º Check Point
3º Check Point
4º Check Point
Atualização do Inventário Fisico - Site / CSE / PRD
90%
Atualização do Inventário Fisico - Site
70%
Atualização e config do client para versão 16.5 - CSE
30%
GAP de servidores sem Backup - BKP
53%
Configuração do JOB - BKP
70%
Resport diário de status aos Gerentes e Coordenadores - BKP
100%
Resport Semanal aos Gerentes da evolução e maiores ofensores
100%
Processo de Restore do Ambiente de Produção - BKP
10%
Hoje
Deadline

7. Projeto: OCS Inventory

Projeto: OCS Inventory
Data Inicio: 04-12-2015
Data Conclusão: ~~22-02-2016~~ 14-04-2016
Progresso: 64%
PM: Thiago Augusto



Descritivo: O OCS é uma ferramenta de Inventário de servidores para auxiliar a equipe de Controle de Ativos.

Último Status

- ~~✓ Ativos cadastrados no OCS: 3.576/6.476 (18/02/2016).~~
- ✓ Ativos cadastrados no OCS: 3.781/6.476.
- ✓ Evolução de 205 = 34 por dia (Considerando 6 dias de trabalho).
- ✓ Projeção de 34 dias uteis para completarmos os 2.695 servidores restantes, media de 80 Servidores por dia.

Objetivos alcançados na última semana

- Iniciado a analise pela equipe do Rogerio Veloso, na Automatização da instalação nos restantes dos elementos.
- Alinhado a execução e enviado lista com 727 servidores para equipe CSE.
- Direcionado lista de 1.968 servidores para o Recurso dedicado.

Riscos/Problemas/Observações

- Velocidade de evolução da instalação é afetada de acordo com instabilidade do ambiente.
- Conflitos entre prioridades do gestor de projetos (pré-vendas Contact Center/IT e Estabilidade operacional).
- Tivemos incidentes de alto impacto que nos afetou a produtividade em 2 dias de trabalho (CSE).
- Tivemos a ausência por 02 dias do recurso que está dedicado ao projeto, (problemas de força maior).

9. Projeto: Ura Internalização

Projeto: Ura Internalização
Data Inicio: 20-10-2015
Data Conclusão: 06-06-2016
Progresso: 20%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware e elimina a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Último Status

- Aguardando definição da estrutura que será responsável por assumir os serviços de suporte dessa Internalização. Pendente de uma definição do Rivaldo e Koreeda.

Objetivos alcançados na última semana

- ✓ Confirmado dia 16 o recebimento da Genesys do pedido para treinamento.
- ✓ SC 784 e 785 - Processo Concluído.

Riscos/Problemas/Observações

- Risco: Prazo de treinamento vencido esta semana.
- Existe ainda a pendência de definição de qual equipe será treinada. Depende de uma conversa do Rivaldo com o Koreeda.

9. Projeto: Qualidade em Gravação

Projeto: Ura Internalização
Data Inicio: 24-02-2016
Data Conclusão: 23-05-2016
Progresso: 4%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Este projeto tem como escopo, executar um plano de ação para eliminar multas (de gravação) nos clientes Contax.

Último Status

- Fase de levantamentos de dados, e alinhamentos com todas as áreas integrantes.

Objetivos alcançados na última semana

- ✓ Realização do Kick off.

Riscos/Problemas/Observações

- Nos próximos meses ficou definido pela equipe do financeiro (do Marcos Barbosa) que o **item multa não vai ser mais detalhado no faturamento** de alguns clientes (e demais clientes nos meses seguintes). Ou seja, **não teremos a visão de quanto de multa por gravação estamos sendo penalizados.**
- Ocorrem também negociações entre o cliente e operações onde a **Multa é "abonada" e repassada para os valores contratuais** (um abatimento no pagamento full sem detalhar que é multa).

10. Alinhamento







