contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Contact Center

Estabilidade Operacional

10.Março.2016





contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Índice

1. Indicadores – Incidentes de Alto Impacto e Problemas
2. Indicadores – Total de Incidentes
3. Indicadores – Total de Incidentes (Alto, Médio e Baixo)
4. Gestão de problemas
5. Incidentes resolvidos de Alto Impacto
6. 2ª Fase – T2R – Objetivos
7. Projetos Estruturantes e Especiais
8. Alinhamento


1. Indicadores: Incidentes Alto Impacto e Problemas

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Volume de Incidentes Alto Impacto

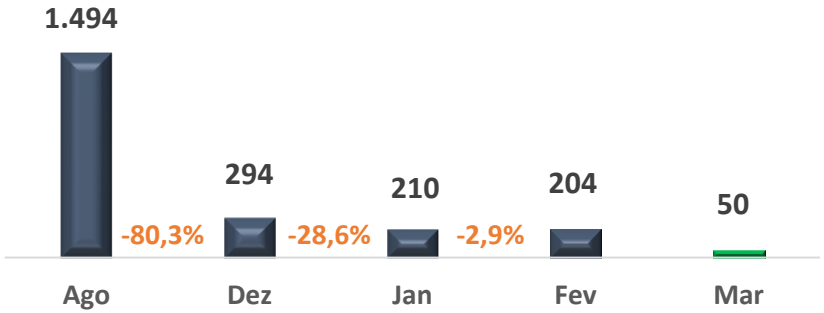

Média diária de Incidentes Alto Impacto

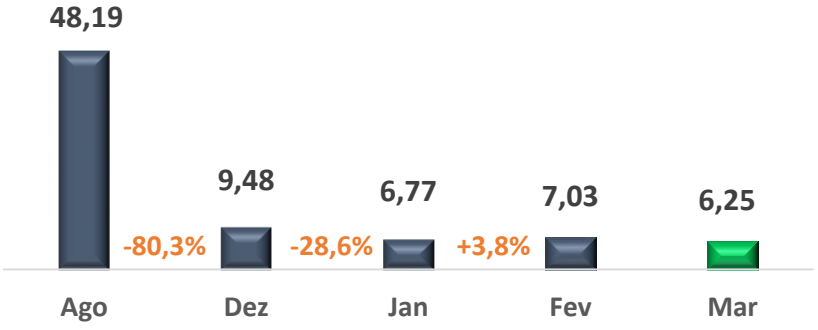


Redução Consolidada Agosto-15 a Fevereiro-16 **- 86,35%**

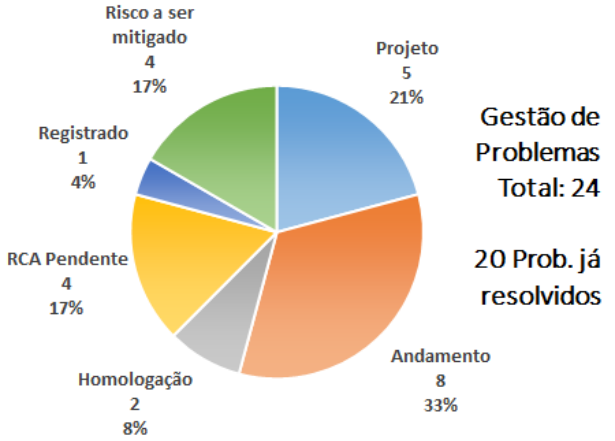

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01/03 a 08/03.

CHACON | Consultoria Ilimitada

2. Indicadores: Total de Incidentes

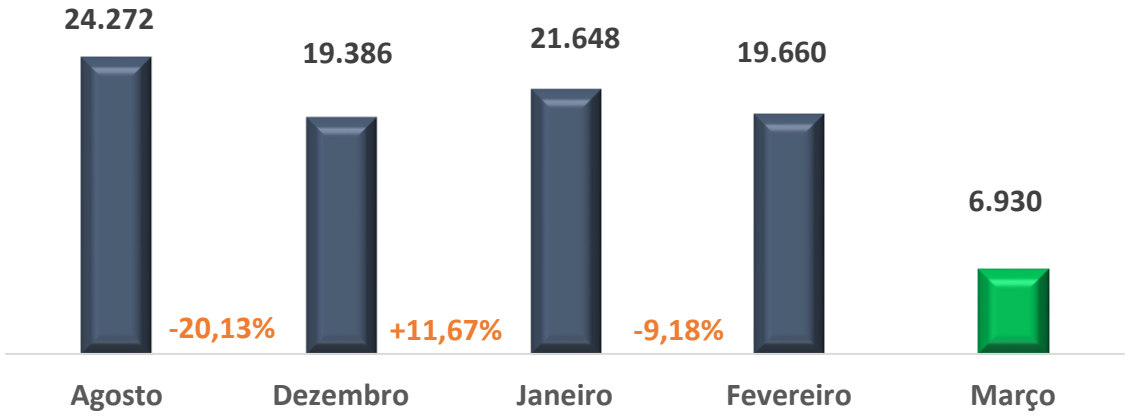

Mar - 31 dias	Real	Projeção	Meta	Desvio	Farol
Total	**6.930**	**21.174**	**19.246**	**9,7%**	✗
Alto	50	226	**250**	-9,5%	✓
Médio	4.003	12.479	**11.402**	9,1%	✗
Baixo	2.877	8.469	**7.594**	11,3%	✗

Ações

- Catálogo de Serviços;
- Ação de Investigação dos Ofensores junto aos Sites;
- Gestão de Problemas;
- Projetos de Estabilização;
- GEROT Diária de Incidentes;
- Gestão de Vulnerabilidades;
- Política de Mudanças (Mudança Técnica).

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01/03 a 08/03.

4. Gestão de Problemas


Alinhamento em 04/03
As atividades estruturantes relacionadas a MPLS - Villa

Gestão de Problemas - Stuart Faria	Vulnerabilidade - MPLS - Migração rotas Metro para MPLS | Site Alegria | Impacto nível Brasil	Andamento	29/02/2016	10
CSE Redes - Rogério Santos	MPLS IP | Mauá | Largura de banda de CCTO BKP inconsistente	RCA Pendente	17/02/2016	22
Gestão de Problemas - Stuart Faria	MPLS Contax - CCTO VIVO | Site Comércio | Todas as operações | Falha de Conexões | Lentidão extrema Internet	RCA Pendente	29/02/2016	10
Projetos - Thiago Ferreira	MPLS IPCC - Site Comércio | Pendência de instalação | NGR 400Mb	Andamento	29/02/2016	10

Oportunidades de redução a serem avaliadas:


- **Site Comério – Exclusão do MPLS Contax**
- **Site Navegantes –Downgrade de banda**

4. Gestão de Problemas

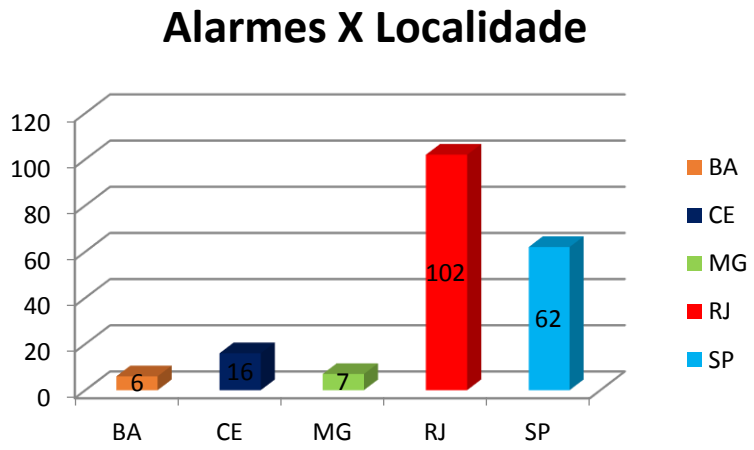


Cotação OTG
~550K

Contrato 'Guarda-chuva'

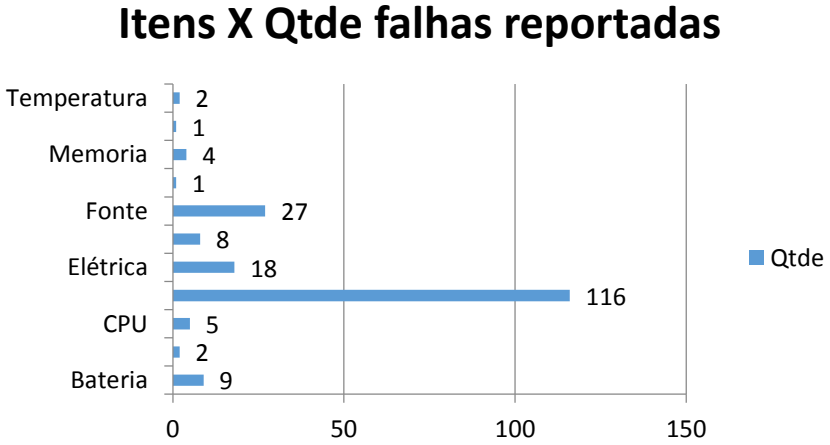

5. Incidentes Resolvidos de Alto Impacto

De 01 a 08 de Março de 2016

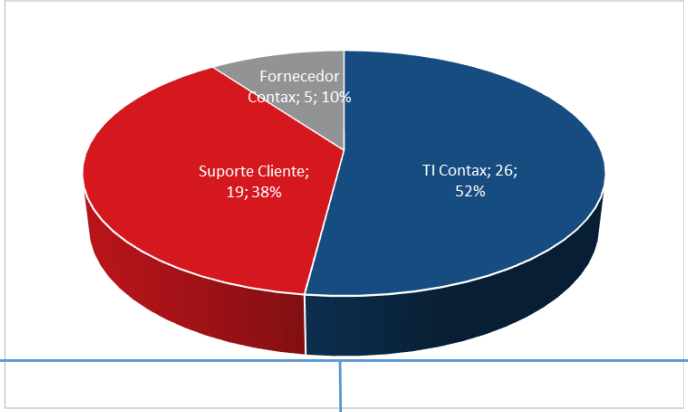


TI Contax		
Tipo	Quantidade	%
Software	13	50,0%
Hardware	5	19,2%
Processo	5	19,2%
Em análise	2	7,7%
GMUD	1	3,8%
Total	26	

Suporte Cliente		
Tipo	Quantidade	%
Software	13	68,4%
Rede	2	10,5%
Gravador	1	5,3%
Infra	1	5,3%
Link	1	5,3%
Processo	1	5,3%
Total	19	

Fornecedor Contax		
Tipo	Quantidade	%
Rede	3	60,0%
Link	1	20,0%
Software	1	20,0%
Total	5	

5. Incidentes Resolvidos de Alto Impacto

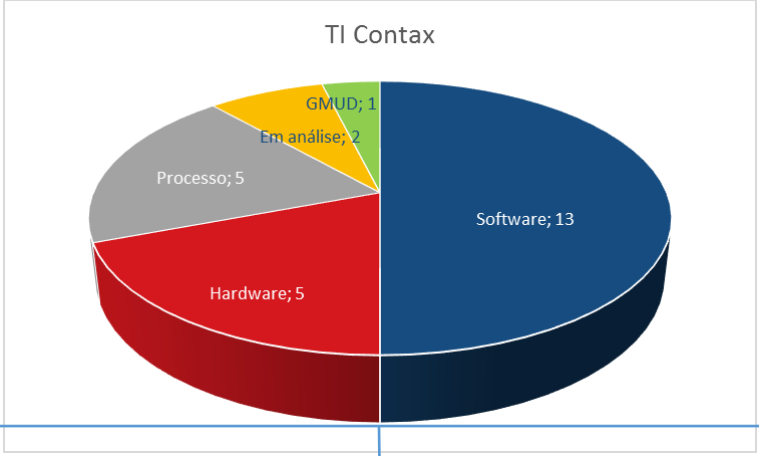


TI Contax - Software		
Tipo	Quantidade	%
Gravador	6	46,2%
AES	1	7,7%
Carga	1	7,7%
Discador	1	7,7%
Em análise	1	7,7%
Rede	1	7,7%
Telefonia	1	7,7%
URA	1	7,7%
Total	13	

TI Contax - Hardware		
Tipo	Quantidade	%
Rede	2	40,0%
Cabo	1	20,0%
Discador	1	20,0%
Telefonia	1	20,0%
Total	5	


TI Contax - Processo		
Tipo	Quantidade	%
Operacional	3	60,0%
Planejamento	2	40,0%
Total	5	

6. 2ª Fase – T2R – Objetivos

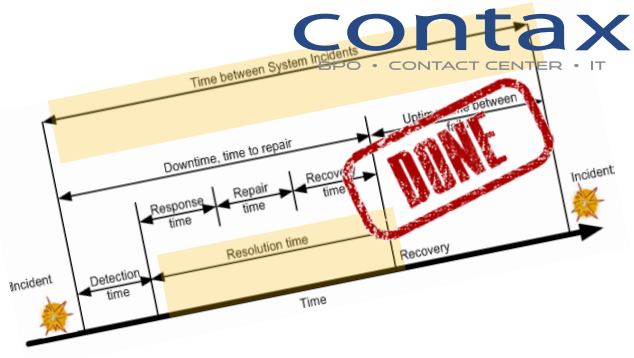

Para consolidar a Estabilidade Operacional é preciso agora **manter o ímpeto** e melhorar as práticas relacionadas a ***Transition to Run*** **– T2R**.

Os processos de **T2R** devem considerar todo o ciclo da mudança, desde a **demanda por serviços novos ou alterados** por parte das unidades de negócio até as atualizações tecnológicas efetuadas pelas equipes de TI até sua **estabilização em ambiente de produção**.

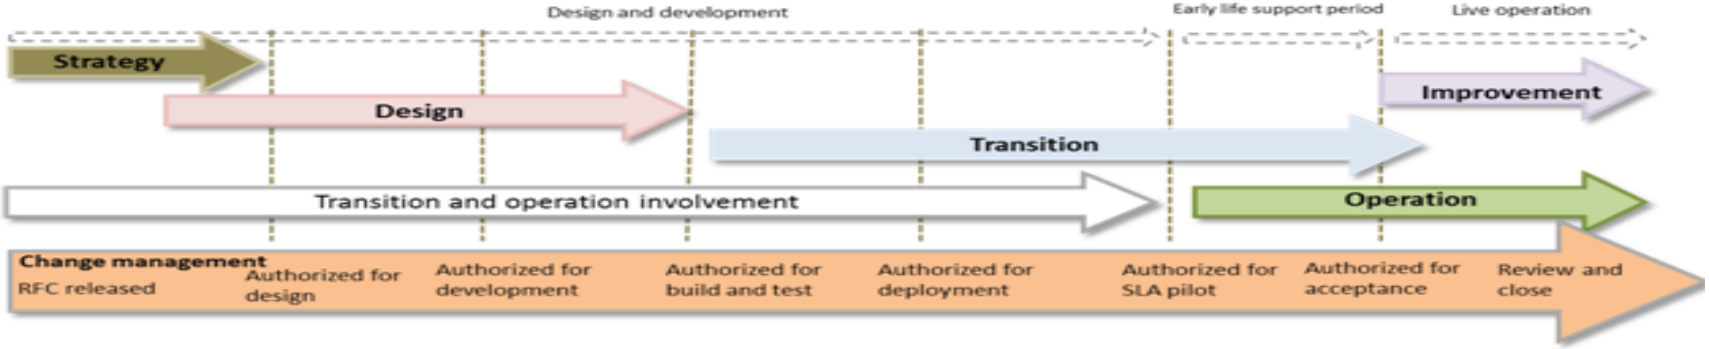


6. 2ª Fase – T2R – Ações

As ações para consolidar a melhoria da estabilidade operacional são as seguintes:

0. **Manter o ímpeto** das conquistas da Gestão de Problemas e Incidentes;

1. Identificar e documentar **Canais e Serviços de TI**;

2. Identificar os **Ativos dos Serviços** e sua **Configuração;**




3. Revisar e melhorar o processo e os **ritos de Gestão de Mudanças**;

4. Vincular Gestão de **Demandas, Projetos e Mudanças**;

5. Aumentar o **compromisso com a qualidade** nas implantações e Mudanças.

6. T2R – Interfaces Atuais

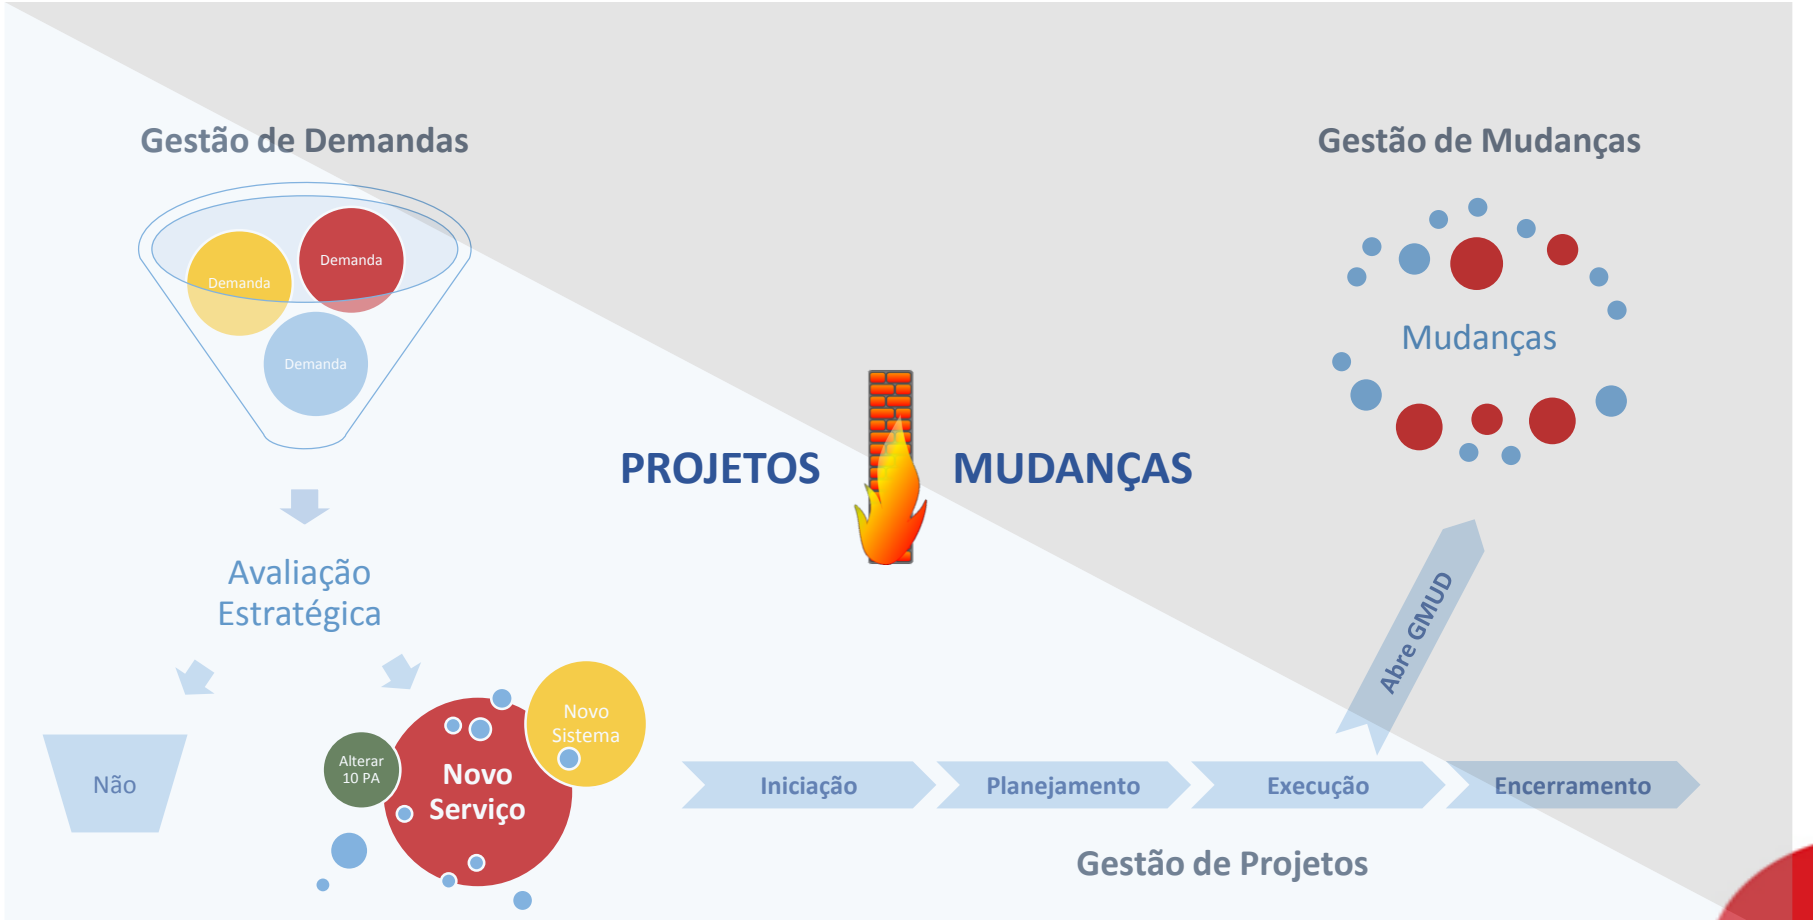

7. Projetos Estruturantes e Especiais

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Status do Projeto					Status das SCs			
Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos	Valor	Descritivo	Status das SCs
Portfólio de projetos Estabelização	46%	169 dias	Qua 14/10/15	Seg 06/06/16				
Projetos Estruturantes	45%	135 dias	Qua 14/10/15	Ter 19/04/16				
Proj Aspect 7.3 (infra)	75%	135 dias	Qua 14/10/15	Sex 04/03/16	Luiz Washington	N/A	N/A	N/A
Proj Gravacao (NICE) TAM e VIVO	25%	106 dias	Qua 14/10/15	Qua 09/03/16	Thiago Sousa	R$ 30.000,00	Aquisição de 12 HDs	SC 775 - A equipe de suprimentos/Aquanima, nova entrega estimada para a 1° semana de Abril.
Proj Monitoração (Dell-Open Manager)	61%	95 dias	Qua 14/10/15	Sex 22/04/16	Julio Cesar	N/A	N/A	N/A
Proj Monitoração (Zabbix)	49%	96 dias	Seg 19/10/15	Sex 22/04/16	Julio Cesar	R$ 19.000,00	Consultoria e certificação ZABBIX	SC 750 - pedido emitido 2678
Proj Redundância links MPLS	21%	65 dias	Ter 01/12/15	Seg 11/04/16	Luis Marçal	N/A	N/A	N/A
Proj Backups e Restore em Produção	70%	122 dias	Qua 14/10/15	Qui 31/03/16	Rafael Alves	N/A	N/A	N/A
Proj Ura Internalização	20%	165 dias	Ter 20/10/15	Seg 06/06/16	Luis Marçal	R$ 75.000,00	Capacitação equipes de suporte e certificação	SC 784 e 785 - Processo Concluído
Proj Qualidade em Gravação	31%	66 dias	Qua 24/02/15	Seg 23/05/16	Luis Marçal	N/A	N/A	N/A
Projetos Especiais	64%	42 dias	Sex 04/12/15	Seg 01/02/16		N/A	N/A	N/A
Proj OCS Inventory	64%	91 dias	Sex 04/12/15	Seg 08/04/16	Thiago Sousa	N/A	N/A	N/A

7. Projeto: Proj Aspect 7.3 (infra) System 1

Projeto: Proj Aspect 7.3 (infra)
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: ~~04-03-2016~~ 31-03-2016
Progresso: 75%

PM: Luiz Washington

Descritivo: Este projeto tem como escopo, preparar/adequar toda a infra de HW para instalar a versão 7.3 do Aspect para 2000 PAs.

Último Status

- Finalização Validação da Plataforma pela Aspect.

Objetivos alcançados na última semana

- Efetuado os ajustes solicitados pela Aspect – 08/03.
- Definida solução de contorno para limitações de memória.
- Definida a versão do AQM a ser utilizada – será a 8.0.


Riscos/Problemas/Observações

Observação

- Utilização de 80 horas mensais para passagem de conhecimento da nova plataforma.
- Negociar com José Maria

4. Cronograma Aspect

Nome da tarefa	Duração	Início	Conclusão	Pr
Plataforma Aspect	**57 dias**	**Qui 10/03/16**	**Sex 27/05/16**	
Disponibilização da Plataforma	12 dias	Qui 10/03/16	Sex 25/03/16	
Integração com Front End - TLV, tCollect! e Ay	15 dias	Seg 21/03/16	Sex 08/04/16	
Entrega de Link migração do Polo	5 dias	Seg 28/03/16	Sex 01/04/16	
Migração do Polo BH	35 dias	Seg 11/04/16	Sex 27/05/16	
Novas Operações	**5 dias**	**Seg 04/04/16**	**Sex 08/04/16**	
Disponibilização de troncos	5 dias	Seg 04/04/16	Sex 08/04/16	

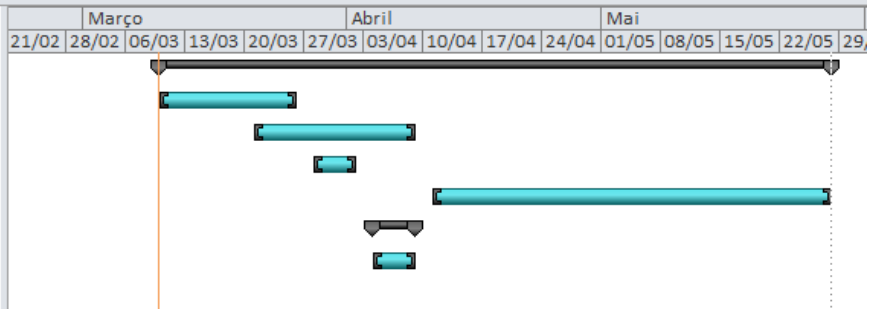

Disponibilização da Plataforma:

- Hardware para até 2.000 licenças
- Licenças: 1.536
- Capacidade para 128 troncos TDM (64 em cada site) e 6 mil troncos SIP

Polo BH

- Irá consumir 37 troncos TDM de Alegria e 450 licenças

Operações Previstas:

- BO Anatel – 250 Licenças – 25 troncos TDM – Previsão abril/2016
- Itaú – 50 Posições – tipo de troncos a definir

Novas Operações:

- A partir da segunda semana de abril – pré-requisitos: Troncos SIPs

7. Projeto: Gravação (Nice) TAM e VIVO

Projeto: Gravacao (NICE) TAM e VIVO
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: ~~25-03-2016~~ 25-04-2016
Progresso: 26%
PM: Thiago Augusto



Descritivo: Este projeto tem como escopo, adequar infra de HW para instalar 3K licenças de gravação , atualmente sem uso.

Último Status

- Aguardamos a entrega dos 12 HDs

Objetivos alcançados na última semana

- Recebemos o numero do pedido de Suprimentos.

✓ Roberto Elias acordou com a TAM a entrega para a 3° semana de Abril

Riscos/Problemas/Observações

- Processo de compras demorado.
- SC 775 - A equipe de suprimentos/Aquanima nova entrega estimada para a 1° semana de Abril.

7. Projeto: Monitoração Dell – Open Manager

Projeto: Monitoração (Dell-Open Manager)
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 22-04-2016
Progresso: 61%
PM: Júlio Cesar



Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware para eliminar a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Último Status

- Em execução o cadastramento de vlans de servidores (Total).

Objetivos alcançados nas últimas duas semanas

- Homologação do SW.
- **Aceitação das regras de liberação por SI.**

Riscos/Problemas/Observações

- Servidores sem client OMSE.

7. Projeto: Monitoração Zabbix

Projeto: Monitoração Zabbix
Data Inicio: 19-10-2015
Data Conclusão: 23-04-2016
Progresso: 49%
PM: Júlio Cesar



Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware e elimina a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Último Status

- ✓ Agendado o treinamento e a Consultoria:
  - Treinamento: 11 a 15/04
  - Consultoria: 18 a 23/04

Objetivos alcançados na última semana

- Geração de pedido

Riscos/Problemas/Observações

- N/A.

7. Projeto: Redundância links MPLS

Projeto: Redundância links MPLS
Data Inicio: 01-12-2015
Data Conclusão: 11-04-2016
Progresso: 21%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Para dar **resposta imediata** a situações recorrentes de incidentes, relacionados com a perda de **Links** que interligam os sites da Contax, este projeto visa, **Garantir e documentar a funcionalidade da contingência e** validar caminhos possíveis e documentar ações.

Último Status

- ✓ Agendada a **GMUD 19612** para realização do teste de redundância de MPLS no site Aurora (16 de Março).

Objetivos alcançados na última semana

- No site Navegantes no dia 18 de Fevereiro vai ser efetuada a correção /configuração nos equipamentos da VIVO para 400MB (GMUD 19412)

Riscos/Problemas/Observações

- Foi detectado que a banda contratada (25-06-2015) para o link MPLS VIVO no Site Navegante é de 400MB. Atualmente os equipamentos estão configurados para 100MB.

7. Projeto: Backups e Restore em Produção

Projeto: Backup & Restore Ambiente de Produção

Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 30-04-2016
Progresso: 52%
PM: Rafael Alves



Descritivo: Providenciar Backup em todos os equipamentos de produção da Contax. Garantir plano de restore do ambiente.

Último Status

- ✓ Instalação do piloto do ArcServe UDP para teste de backup e restore de ambientes Windows e Linux (Virtuais e Físicas) – Em andamento
- ✓ Escopo do projeto ampliado com restore para 30 de Abril
- ✓ Plano de restore iniciado

Objetivos alcançados na última semana


- Apoio da Regional NE e MG para suporte e discovery dos servidores nos sites
- Licença da feature ArcServe UDP recebida

Riscos/Problemas/Observações

- Queda na aderência de backup devido as desmobilizações de sites sem nossa ciência.
- Baixo índice de aderência no plano de restore devido a falta de infra.
- Armazenamento indevido das mídias causando degradação das mesmas.

7. Projeto: Backups e Restore em Produção

Visão Macro - Cenário Atual

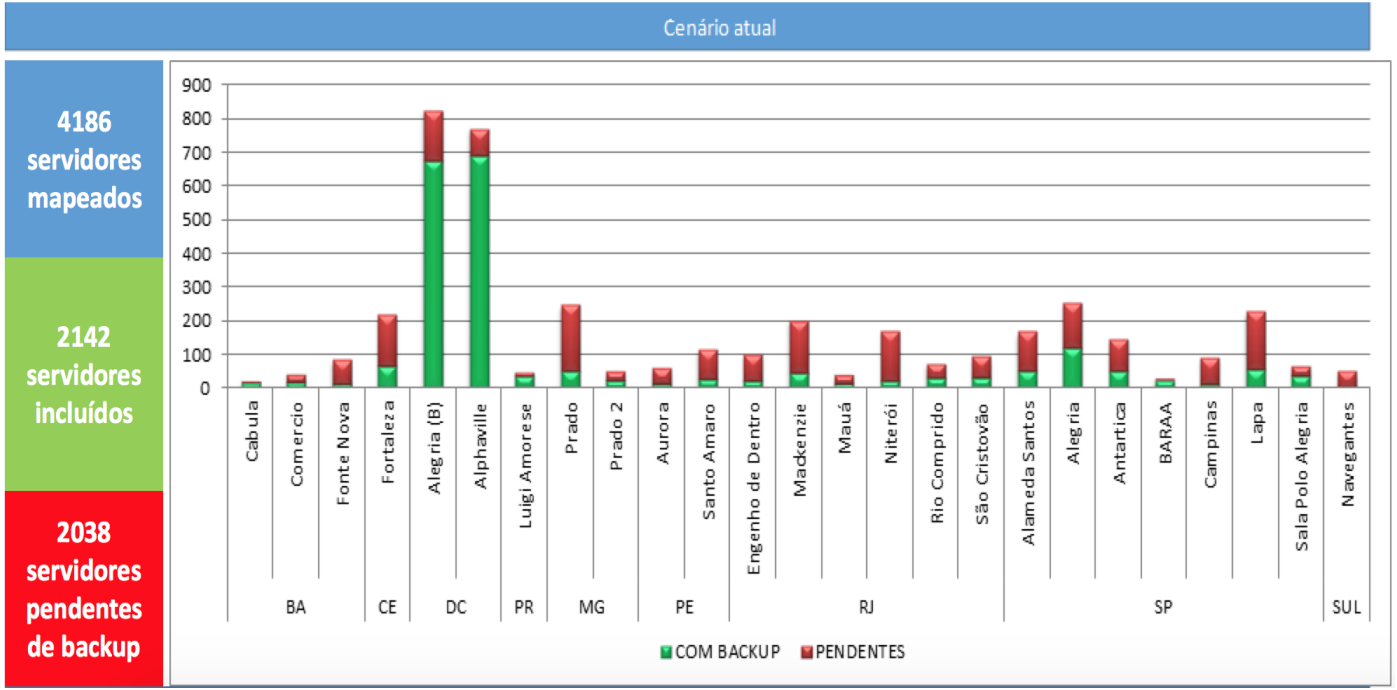

Detalhamento - Ofensores


Ofensores

- SUL
  - Robô instalado, parque de servidores sendo atualizado com a nova versão do ArcServe e renovação do catálogo de mídias.
- RJ
  - SC 246 foi aberta para transporte do robô de Alegria para Engenho de dentro
  - SC 245 foi aberta para aquisição de fitas para backup da regional
  - Reparo de três robôs da Mackenzie parados
- SP
  - Falta de fita na regional SP
  - Reparo de robô no site Alegria, enviado o orçamento ao site para aprovação do custo
- Engenharia
  - Sem prioridade nas criações de rede de backup nos Data Centers
  - Sem licença do Data Protector para inclusões de novos backups.
    - Solicitado o orçamento para aumento de GAP e outro para mudança de plano por volumetria e não qtd de agente
- CSE
  - Sem acesso a instalação dos agentes, retardando o serviço de inclusão de servidores até o atendimento do chamado.
- CONTAX
  - Equipamentos sem garantia
  - Sem local adequado para a armazenar as fitas
  - Apenas Mackenzie e São Cristóvão possuem rede de backup apartada sem onerar o site;

Report - Site a Site

REGIONAL	SITE	TOTAL	COM BACKUP	PENDENTES	ADERENCIA	EVOLUÇÃO SEMANAL
BA	Cabula	17	16	1	94,12%	0
	Comercio	42	19	23	45,24%	8
	Fonte Nova	85	14	71	16,47%	5
CE	Fortaleza	223	66	152	29,60%	0
DC	Alegria (B)	824	674	150	81,80%	23
	Alphaville	770	691	78	89,74%	0
PR	Luigi Amorese	48	35	13	72,92%	11
MG	Prado	246	50	196	20,33%	8
	Prado 2	50	23	27	46,00%	0
PE	Aurora	59	14	45	23,73%	0
	Santo Amaro	114	26	88	22,81%	0
RJ	Engenho de Dentro	100	23	77	23,00%	1
	Mackenzie	199	44	155	22,11%	0
	Mauá	39	14	25	35,90%	0
	Niterói	171	24	147	14,04%	3
	Rio Comprido	73	29	44	39,73%	1
	São Cristovão	94	30	64	31,91%	0
SP	Alameda Santos	169	52	117	30,77%	13
	Alegria	255	120	135	47,06%	21
	Antartica	146	50	96	34,25%	0
	BARAA	29	24	5	82,76%	2
	Campinas	89	12	77	13,48%	0
	Lapa	228	55	173	24,12%	2
	Sala Polo Alegria	66	37	29	56,06%	4
SUL	Navegantes	50	0	50	0,00%	0

Time Line

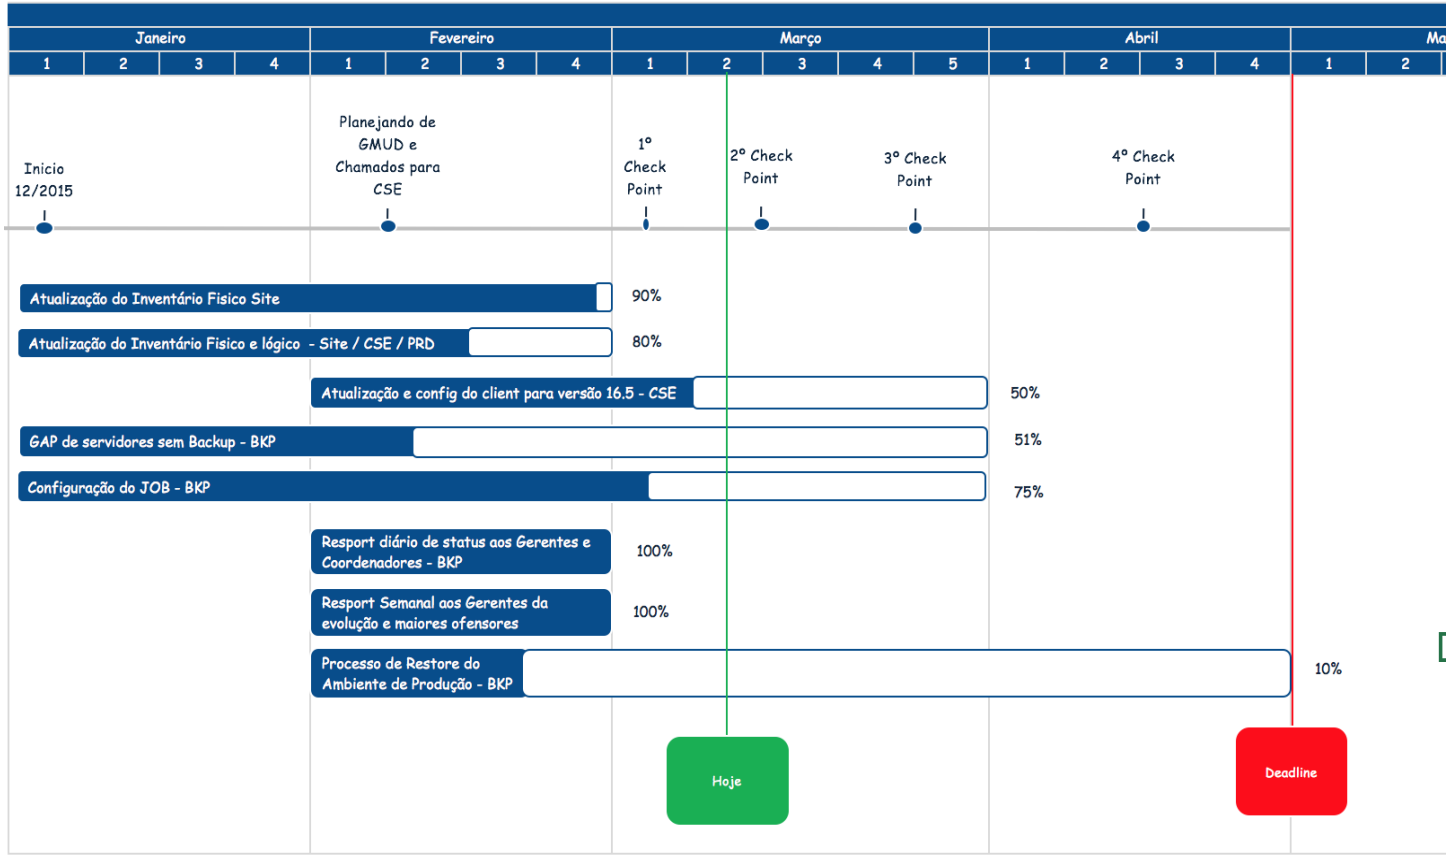
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2
Inicio 12/2015
Planejando de GMUD e Chamados para CSE
1° Check Point
2° Check Point
3° Check Point
4° Check Point
Atualização do Inventário Fisico Site
90%
Atualização do Inventário Fisico e lógico - Site / CSE / PRD
80%
Atualização e config do client para versão 16.5 - CSE
50%
GAP de servidores sem Backup - BKP
51%
Configuração do JOB - BKP
75%
Resport diário de status aos Gerentes e Coordenadores - BKP
100%
Resport Semanal aos Gerentes da evolução e maiores ofensores
100%
Processo de Restore do Ambiente de Produção - BKP
10%
Hoje
Deadline

7. Projeto: OCS Inventory

Projeto: OCS Inventory
Data Inicio: 04-12-2015
Data Conclusão: 14-04-2016
Progresso: 68%
PM: Thiago Augusto



Descritivo: O OCS é uma ferramenta de Inventário de servidores para auxiliar a equipe de Controle de Ativos.

Último Status

- ~~✓ Ativos cadastrados no OCS: 3.781/6.476 (24/02/2016).~~
- ✓ Ativos cadastrados no OCS: 4.001/6.476 (08/03/2016).
- ✓ Evolução de (~~205~~) 220 media de 22 por dia.

Objetivos alcançados na última semana

- Customização para alocar informações dos contratos de manutenção dos servidores.
- Customização para alocar a certidão de nascimento dos equipamentos.

Riscos/Problemas/Observações

- Velocidade de evolução da instalação é afetada de acordo com instabilidade do ambiente.
- Conflitos entre prioridades do gestor de projetos (pré-vendas Contact Center/IT e Estabilidade operacional).
- Tivemos incidentes de alto impacto que nos afetou a produtividade em 3 dias de trabalho (CSE).
- Tivemos a ausência por 02 dias do recurso que está dedicado ao projeto, (problemas de força maior).

7. Projeto: Ura Internalização

Projeto: Ura Internalização
Data Inicio: 20-10-2015
Data Conclusão: 06-06-2016
Progresso: 20%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware e elimina a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Último Status

- A equipe do José Carlos será responsável pelo suporte deste ambiente.

Objetivos alcançados na última semana

- ✓ SC 784 e 785 - Processo Concluído.

Riscos/Problemas/Observações

- Obs: Aguardando data de próximo treinamento da Genesys.

7. Projeto: Qualidade em Gravação

Projeto: Qualidade em Gravação
Data Inicio: 24-02-2016
Data Conclusão: 23-05-2016
Progresso: 31%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Este projeto tem como escopo, executar um plano de ação para eliminar multas (de gravação) nos clientes Contax.

Último Status

- ✓ Definir ordem de prioridade das operações.
- ✓ Janela de funcionamento das operações
- ✓ Avaliar a necessidade de treinamento das equipes envolvidas no retrieval

Objetivos alcançados na última semana

- ➢ Realizamos reunião semanal com a equipe de projeto.
- ➢ Foram retomados os checklists dos sites (exceção SP).
- ➢ Definição da RACI esta em fase de conclusão.

Riscos/Problemas/Observações

Obs: Entendimento de todos os contratos poderá ser mais “complicado” que o esperado..

8. Alinhamento





