contax

BPO • CONTACT CENTER • IT

Estabilidade Operacional

28 Abril de 2016



contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Índice

1. Indicadores – Incidentes de Alto Impacto
2. Indicadores – Total de Incidentes
3. Gestão de problemas – Dashboard e Indicadores
4. Tempo médio entre falhas
5. Incidentes resolvidos de Alto Impacto
6. Projetos Estruturantes e Especiais
7. Alinhamento


1. Indicadores: Incidentes Alto Impacto

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Volume de Incidentes Alto Impacto

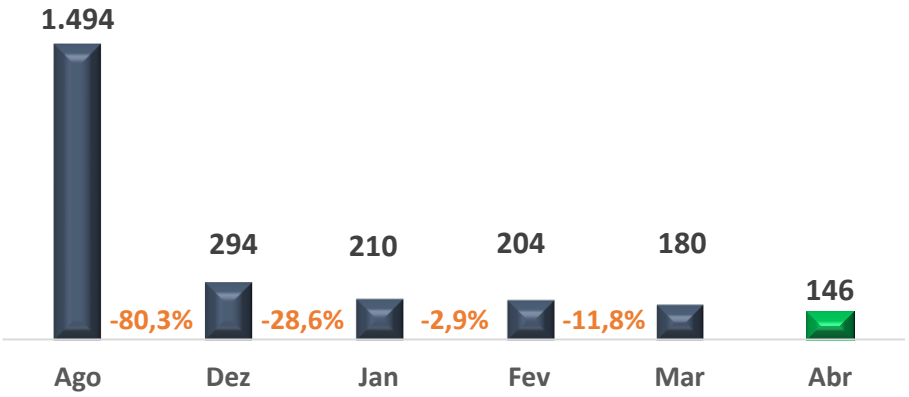

Média diária de Incidentes Alto Impacto

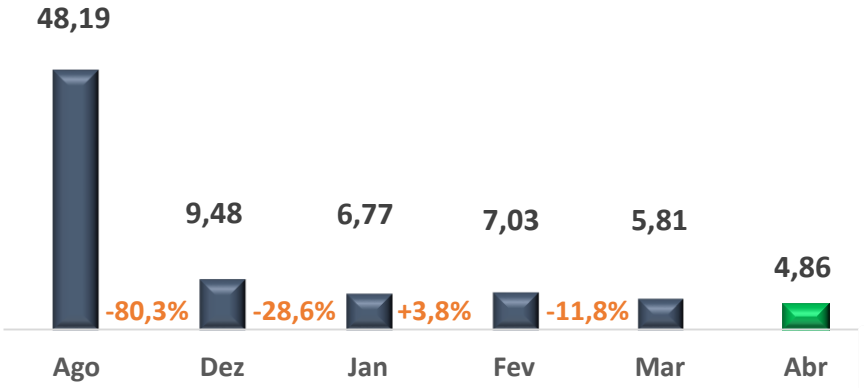


Redução Consolidada Agosto-15 a 25/Abr/16 **- 90,23%**

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01/04 a 25/04.

CHACON | Consultoria Ilimitada

2. Indicadores: Total de Incidentes

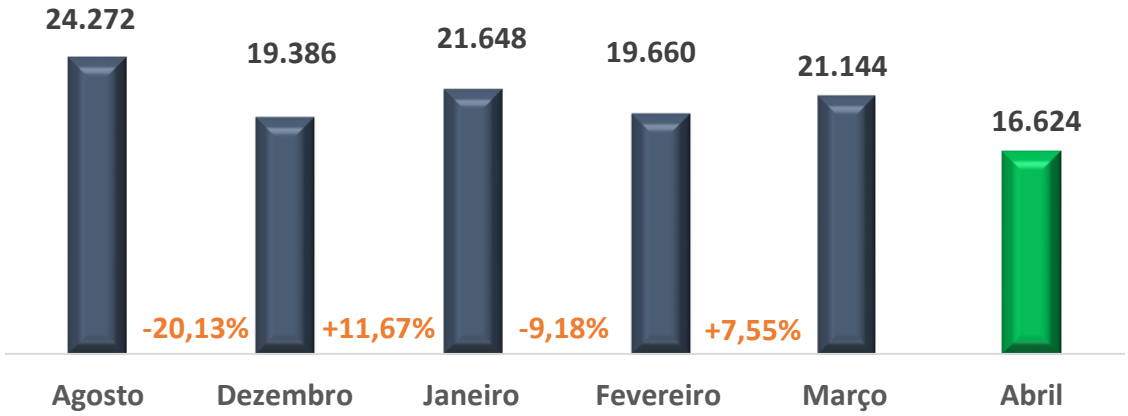

Abr - 30 dias	Real	Projeção	Meta	Desvio	Farol
Total	**16.624**	**19.807**	**18.666**	**6,1%**	✗
Alto	146	182	**188**	-3,1%	✓
Médio	8.664	10.597	**11.006**	-3,7%	✓
Baixo	7.814	9.028	**7.472**	20,8%	✗

Ações

- Catálogo de Serviços;
- Ação de Investigação dos Ofensores junto aos Sites;
- Gestão de Problemas;
- Projetos de Estabilização;
- GEROT Diária de Incidentes;
- Gestão de Vulnerabilidades;
- Política de Mudanças (Mudança Técnica).
- GEROT sites para médio e baixo impacto (Implantação)


Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01/04 a 25/04.

2. Indicadores: Total de Incidentes Alto

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Meta 188

Atual 146

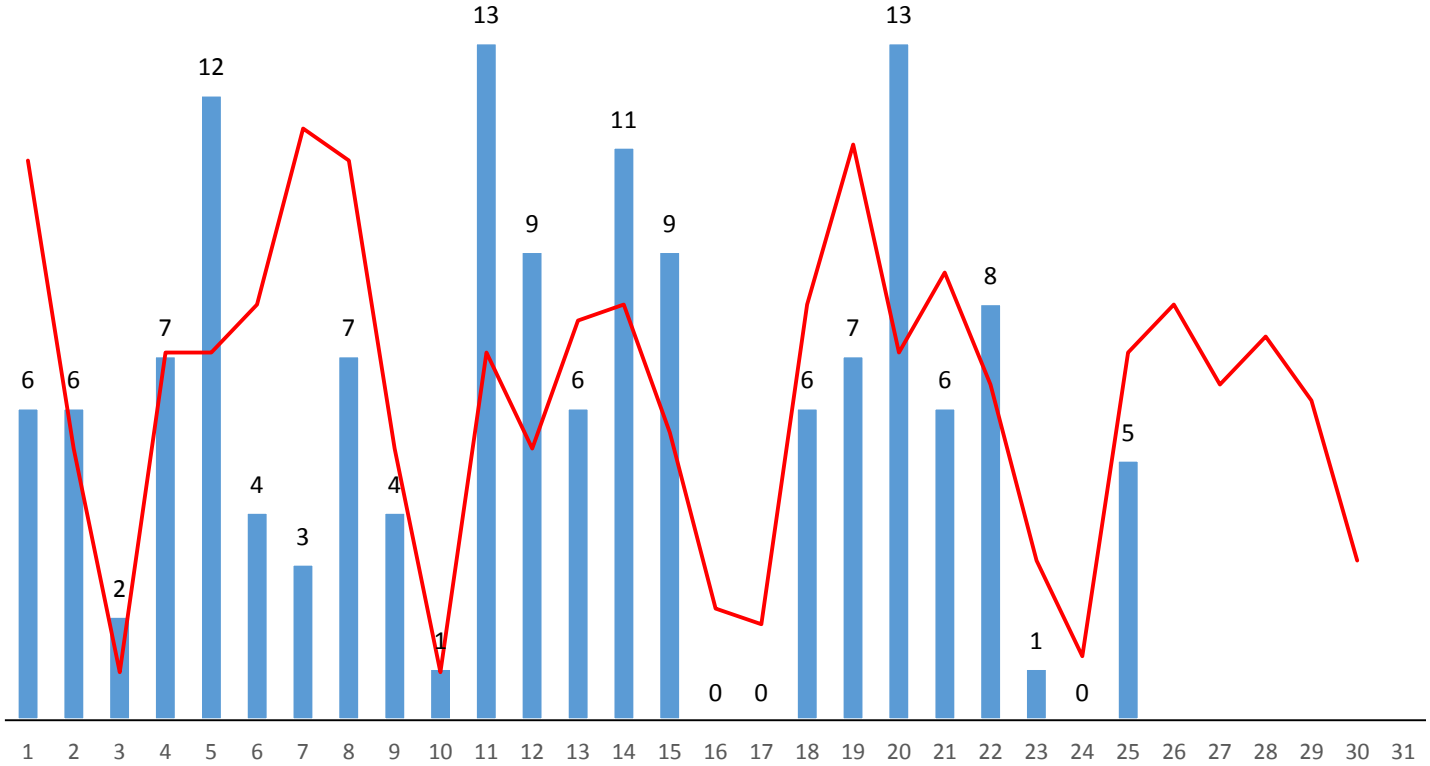

Voltar


CHACON | Consultoria Ilimitada

2. Indicadores: Total de Incidentes Médio

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Meta 11.006

Atual 8.664

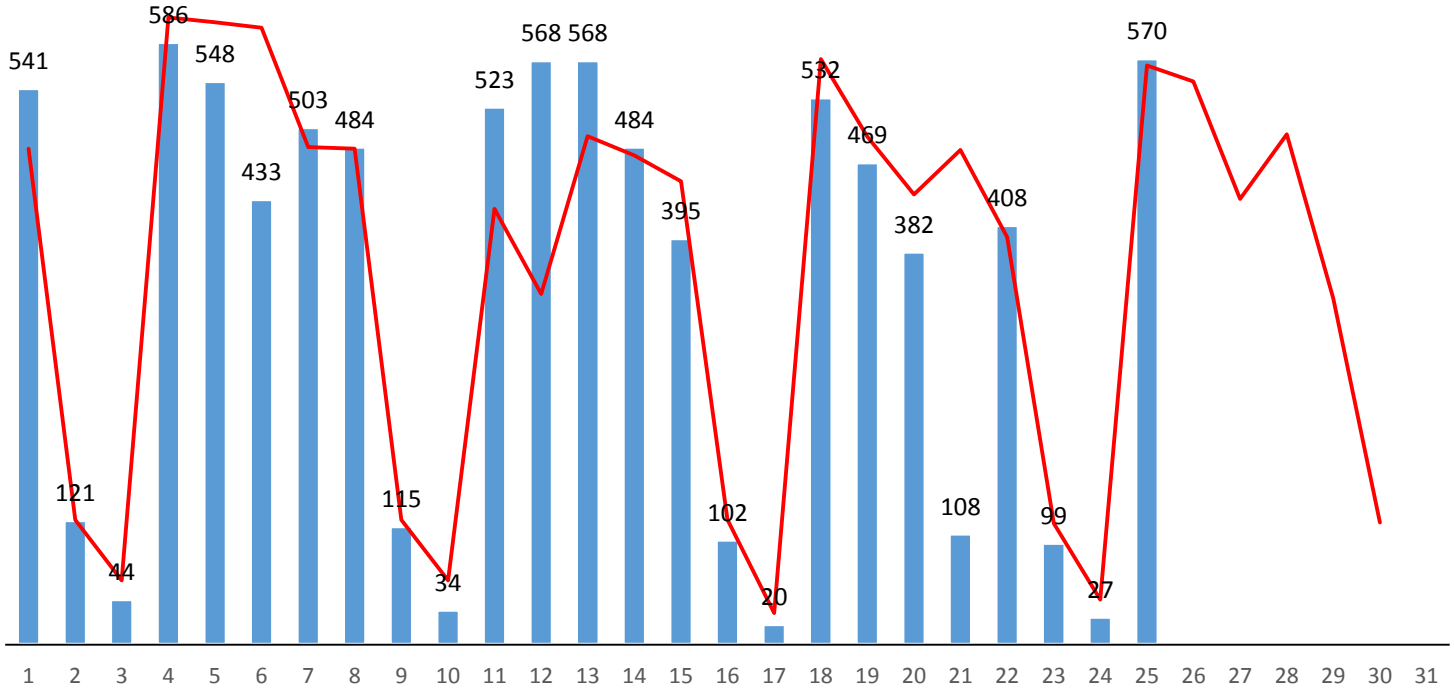

Voltar


CHACON | Consultoria Ilimitada

2. Indicadores: Total de Incidentes Baixo

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Meta 7.472


Atual 7.814

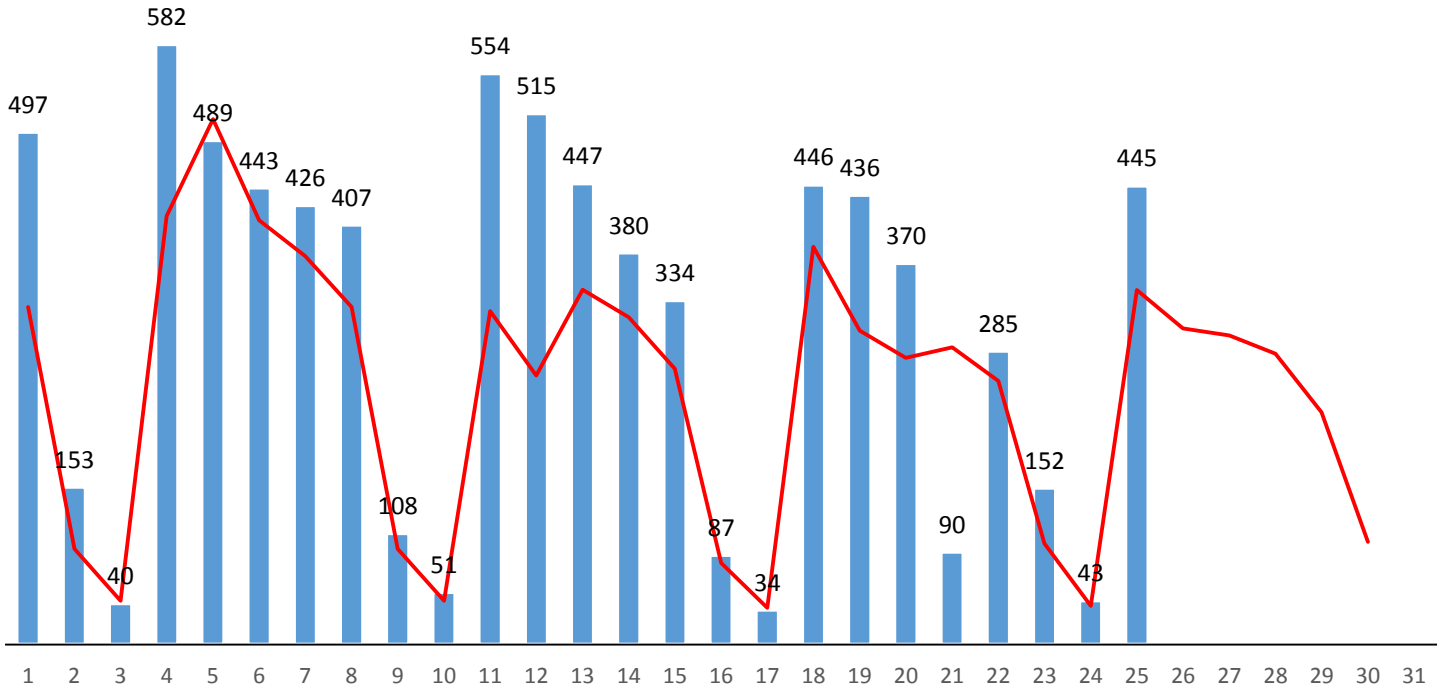

Voltar


CHACON | Consultoria Ilimitada

Dashboard - Problema

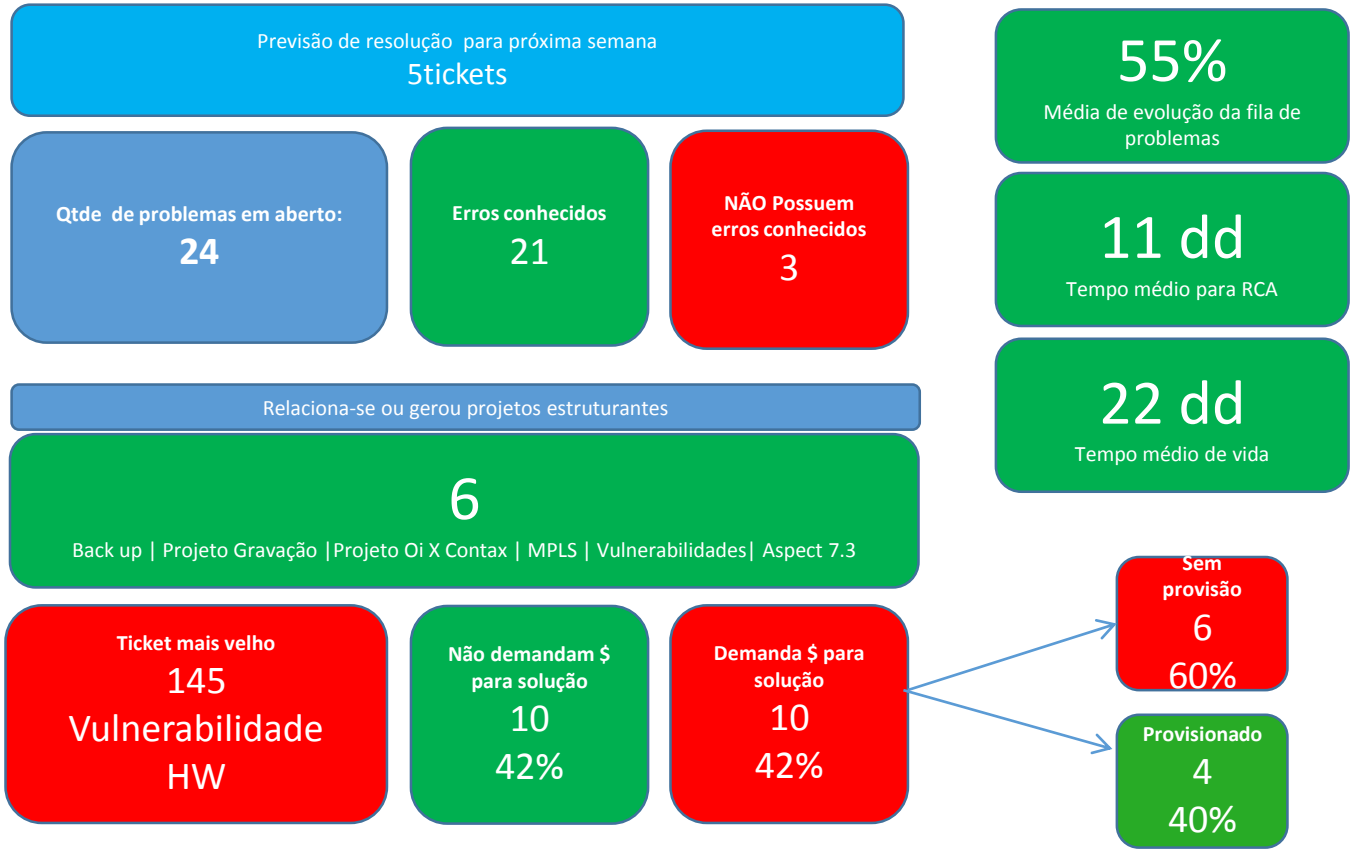


4. Tempo médio entre falhas e resolução

Incidentes Alto Impacto
Tempo médio entre falhas em h:m:s

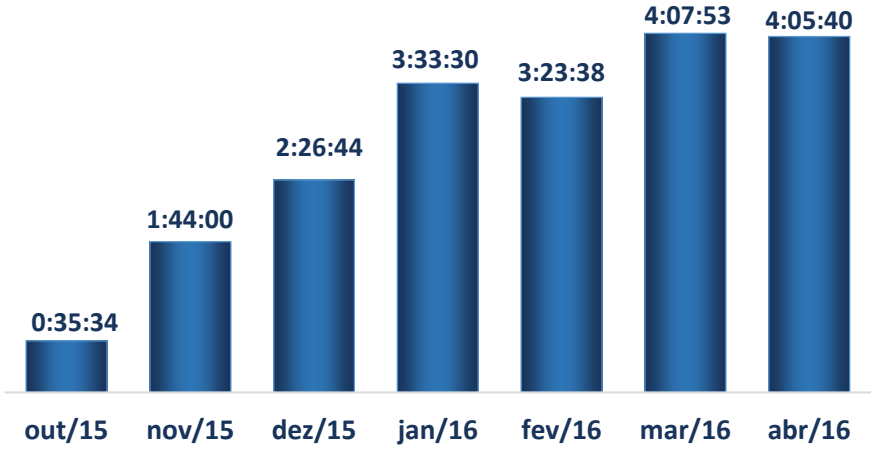


Incidentes Alto Impacto
Tempo médio de resolução em h:m:s

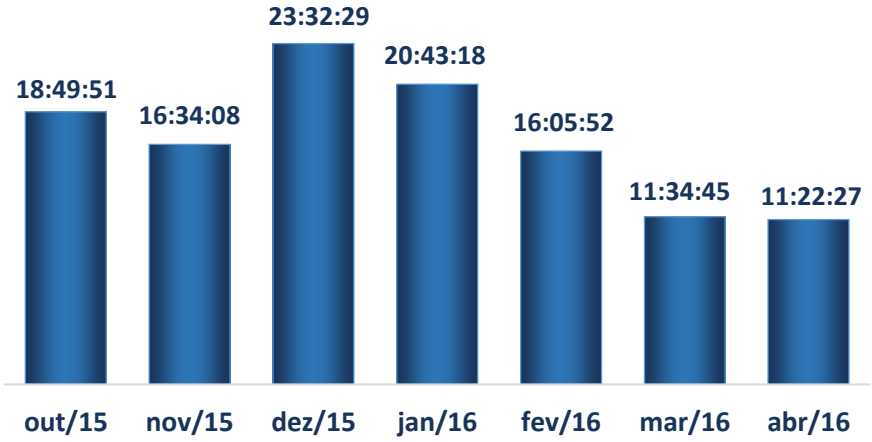

O cálculo foi realizado considerando **todos** os chamados de Incidentes Alto Impacto (Críticos + Muito Alto)

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01/04 a 25/04.

4. Tempo médio de resolução

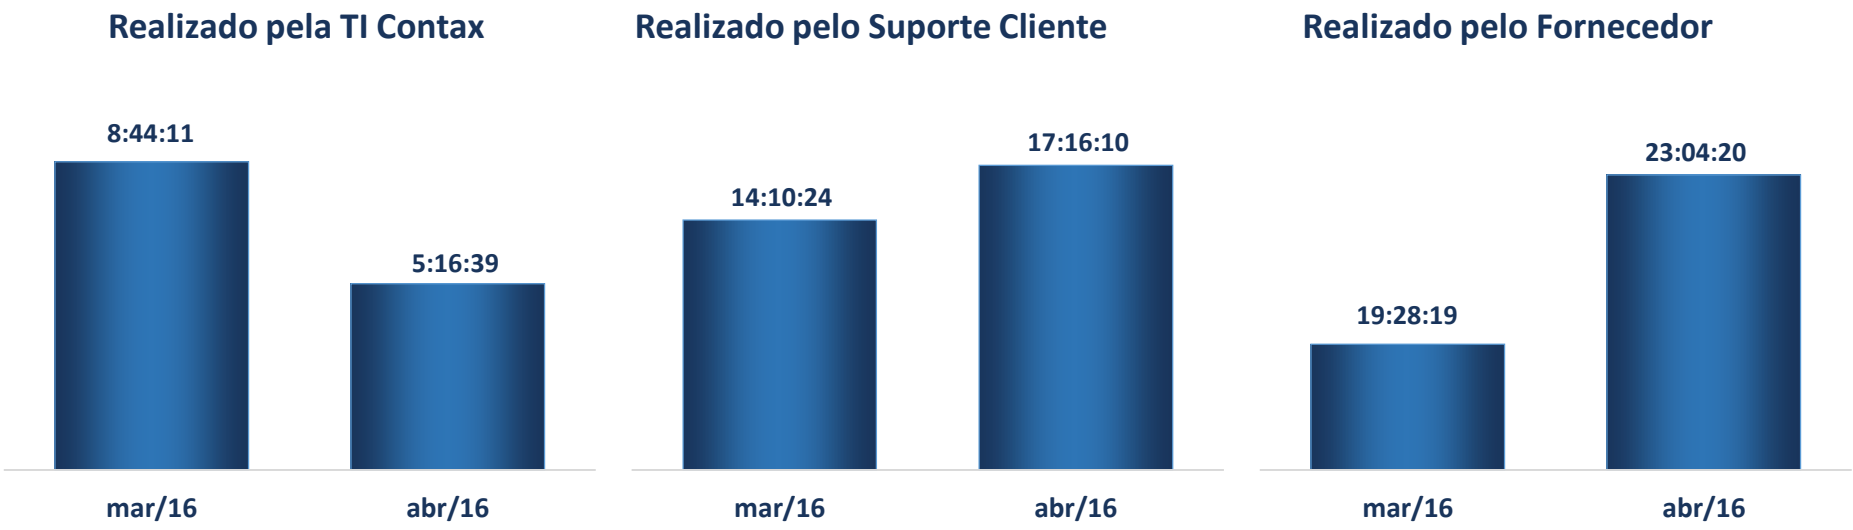


O cálculo foi realizado considerando **todos** os chamados de Incidentes Alto Impacto (Críticos + Muito Alto)

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01/04 a 25/04.

5. Incidentes de Alto Impacto

01 a 25 de Abril de 2016

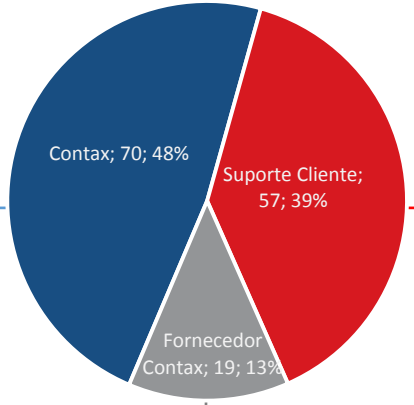

Contax		
Tipo	**Quantidade**	**%**
Software	44	62,9%
Processo	9	12,9%
Rede	6	8,6%
Hardware	5	7,1%
Telefonia	3	4,3%
Mudança	2	2,9%
Infra Predial	1	1,4%
Total	70	

Fornecedor Contax		
Tipo	**Quantidade**	**%**
Software	12	63,2%
Rede	6	31,6%
Telefonia	1	5,3%
Total	19	

Suporte Cliente		
Tipo	**Quantidade**	**%**
Software	54	94,7%
Mudança	1	1,8%
Processo	1	1,8%
Rede	1	1,8%
Total	57	


Março

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01/04 a 25/04.

5. Incidentes de Alto Impacto

01 a 25 de Abril de 2016

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

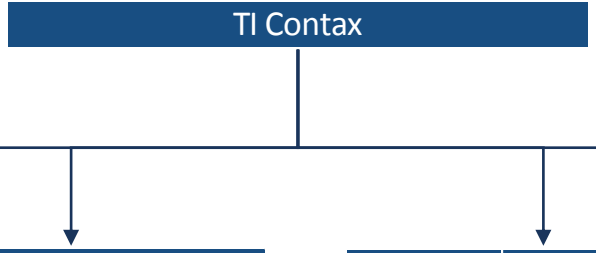

Software	Quantidade	%
Nice	16	36,4%
URA	7	15,9%
TLV	4	9,1%
AES	3	6,8%
Front Fácil	3	6,8%
Discador	2	4,5%
Altitude	1	2,3%
Aspect	1	2,3%
Avaya	1	2,3%
Chat	1	2,3%
G!neration	1	2,3%
Sip Phone	1	2,3%
STC	1	2,3%
Switch	1	2,3%
tClock	1	2,3%
Total	44	

Processo	Quantidade	%
Operacional	6	66,7%
DAC	1	11,1%
Mudança	1	11,1%
Planejamento	1	11,1%
Total	9	

Rede	Quantidade	%
Link	4	66,7%
Roteamento	2	33,3%
Total Geral	6	

Hardware	Quantidade	%
Discador	2	40,0%
Telecom	2	40,0%
URA	1	20,0%
Total	5	

Março

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01/04 a 25/04.

6. Projeto: Aspect 7.3 System 1

Projeto: Proj Aspect 7.3
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: Plataforma: 01-05-2017
Progresso: 4%
PM: Julio Cesar



Descritivo: Este projeto tem como escopo, preparar/adequar toda a infra de HW para instalar a versão 7.3 do Aspect para 2000 PAs. E consequentemente migrar as operãções críticas para essa plataforma.

Últimas Realizações

- Desenho da arquitetura de utilização de link de dados pela Plataforma.
- Definida a ordem de prioridade de migração das operações.

Próximas Ações

- Estudo de utilização de banda para operações Sites.
- Definição da arquitetura operação BO Anatel.
- Definir plano de migração Santander
- Definição de entrega de links OI.

Riscos/Problemas/Observações

Risco:

- Entrega da OI (E1´s) Polo Prado não pode ser em SIP. Em negociação.
- OI não entrega links do BO Anatel em SP.
- Data de entrega dos links da Oi para implantação da Operação BO Anatel ainda não confirmada pela Oi.

6. Projeto: Gravação (Nice) TAM e VIVO

Projeto: Gravacao (NICE) TAM e VIVO
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: ~~25-04-2016~~ 13-05-2016
Progresso: 26%
PM: Thiago Augusto



Descritivo: Este projeto tem como escopo, adequar infra de HW para instalar 3K licenças de gravação, atualmente sem uso.

Último Status

- Entrega agendada P/ 29/04/2016

Objetivos alcançados na última semana

Riscos/Problemas/Observações

Risco:

- O fornecedor não confirma entrega dos 12 HDs para esta semana.

Observação:

- SC 775 - A equipe de suprimentos/Aquanima nova entrega estimada para a 1° semana de Abril.

6. Projeto: Monitoração Dell – Open Manager

Projeto: Monitoração (Dell-Open Manager)
Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 22-04-2016
Progresso: 75%
PM: Júlio Cesar



Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware para eliminar a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Últimas Realizações

- Em execução o cadastramento de Vlans de servidores (Total).
- **70% dos servidores Dell com monitorização de HW.**

Próximas Ações

- Homologação do SW.
- Aceitação das regras de liberação por SI.

Riscos/Problemas/Observações

- Servidores sem client OMSE.
- **Projeto temporariamente parado**. O recurso que dá andamento a este projeto, esta dedicado totalmente ao projeto Zabbix.

6. Projeto: Monitoração Zabbix

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Projeto: Monitoração Zabbix
Data Inicio: 19-10-2015
Data Conclusão: 23-04-2016
Progresso: 100%
PM: Júlio Cesar

Descritivo: Monitoração pró ativa, que elimina a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Últimas Realizações	Próximas Ações	Riscos/Problemas/Observações
✓ Treinamento Concluído.	✓ As atividades da equipe de gerenciamento da ferramenta entraram no processo de Ongoing.	• N/A.

Projeto concluído com sucesso!

6. Projeto: Redundância links MPLS

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Projeto: Redundância links MPLS
Data Inicio: 01-12-2015
Data Conclusão: 31-06-2016
Progresso: 40%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Para dar **resposta imediata** a situações recorrentes de incidentes, relacionados com a perda de **Links** que interligam os sites da Contax, este projeto visa, **Garantir e documentar a funcionalidade da contingência e** validar caminhos possíveis e documentar ações.

Últimas Realizações

- No site de **João Pessoa** a OI informou que corrigiu a inconsistência no roteamento no acesso do Site com o Site Niterói.
- No planejamento, foram detectadas **pendencias que impedem intervenção**: Cabúla e Rio Branco.
- **Sites com pendencias detectadas e resolvidas e** em planejamento para intervenção: São Cristóvão (sem autorização), João Pessoa.

Próximas Ações

- Alinhar datas e obter acordo com as operações para realização dos testes.
- Planejamento de teste **João Pessoa e Luigi Amoresi (**3-Maio), **Engenho de Dentro** (5 Maio).

Total Sites	**23**
Concluídos	4
Pendencias	9
Disponiveis p intervir	10

Riscos/Problemas/Observações

Obs:

- Foi detectado que a banda contratada (25-06-2015) para o link MPLS VIVO no Site Navegante é de 400MB. Atualmente os equipamentos estão configurados para 100MB.
- O projeto deverá melhorar o processo de comunicação entre as áreas (RACI).

Risco: A OI não fornece previsões de instalação/intervenção.

7. Projeto: Backups e Restore em Produção

Projeto: Backup & Restore Ambiente de Produção

Data Inicio: 14-10-2015
Data Conclusão: 30-05-2016
Progresso: 62%
PM: Rafael Alves



Descritivo: Providenciar Backup em todos os equipamentos de produção da Contax. Garantir plano de restore do ambiente.

Último Status

- Escopo do projeto ampliado com restore para 30 de maio, devido a falta de insumos (fitas e etiquetas) nos sites assim como equipamentos aguardando reparo
- Liberação de redes em sites pilotos para uso do UDP

Objetivos alcançados na última semana

- Instalação do piloto do ArcServe UDP para teste de backup e restore de ambientes Windows e Linux (Virtuais e Físicas) – Ambiente Windows Finalizado e Linux em andamento
- Apoio do CSE para instalações dos clients nos servidores Windows e Linux

Riscos/Problemas/Observações

- Regional SP e RJ com falta de fitas, aguardando compra
- HW de backup (robô) sem garantias e com mais de 5 anos de uso, ocorrendo desgastes por vida útil
- Armazenamento indevido das mídias causando degradação das mesmas.

6. Projeto: OCS Inventory

Projeto: OCS Inventory
Data Inicio: 04-12-2015
Data Conclusão: ~~14-04-2016~~ 24-05-2016
Progresso: 87%
PM: Thiago Augusto



Descritivo: O OCS é uma ferramenta de Inventário de servidores para auxiliar a equipe de Controle de Ativos.

Último Status

- ✓ Servidores cadastrados no OCS: 2.891/3.920 (06/04/2016)
- Microsoft (2.525/3.083) 558
  - Agente Instalado - Pendencia de Rede 108
  - Pendente (Host) 61
  - Pendente (Host) Cadastro Manual 6
  - Pendente (Host) Usuário e Senha 14
  - Pendente (Host) Validando Duplicidade 319
- Linux (366/837) 471
  - Agente Instalado - Pendencia de Rede 04
  - Pendente (Host) 301
  - Pendente (Host) Cadastro Manual 64
  - Pendente (Host) Usuário e Senha 102

Objetivos alcançados na última semana

- Equipe de controle de ativos esta utilizando a ferramenta.

Riscos/Problemas/Observações

6. Projeto: Ura Internalização

Projeto: Ura Internalização
Data Inicio: 11-4-2015
Data Conclusão: 02-09-2016
Progresso: 20%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Monitoração pró ativa de hardware e elimina a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

Últimas Realizações

- A equipe do José Carlos vai ser responsável pelo suporte deste ambiente.

Próximas Ações

- José Carlo e Rivaldo vão definir agenda de treinamentos.

Riscos/Problemas/Observações

- Obs: Projeto esteve parado até definição de nova estratégia. O **cronograma vai ser atualizado** quando tivermos datas de treinamento.

6. Projeto: Qualidade em Gravação

Projeto: Qualidade em Gravação
Data Inicio: 24-02-2016
Data Conclusão: ~~23-05-2016~~ 08-08-2016
Progresso: 68%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Este projeto tem como escopo, executar um plano de ação para eliminar multas (de gravação) nos clientes Contax.

Últimas Realizações

- Novas demandas e oportunidade de melhoria do projeto foram adicionadas. A data estimada de conclusão passou para Agosto.
- Em fase de homologação a APP PAINEL de produção e CSE.
- Em fase final na interpretação dos **contratos** (SLAs de recuperações de gravação).

Próximas Ações

- O Tprocess foi selecionado como canal único de chamados para recuperação.
- O Bradesco escolhido para ser o piloto do processo de recuperação de gravações, na nova metodologia.

Riscos/Problemas/Observações

Obs: A abrangência e aderência na nova metodologia no novo "modus operando" de recuperação de gravação, poderá ser um desafio para algumas áreas.

6. Projeto: T2R – Transição de Serviços

Projeto: T2R – Transição de Serviços
Data Inicio: 22-03-2016
Data Conclusão: 22-07-2016
Progresso: 15%
PM: Luis Marçal



Descritivo: Integração entre os processos de gerenciamento de Demandas, Projetos e Mudanças, para controle sobre o desenvolvimento e a implantação de Serviços novos ou alterados.

Últimas Realizações

- ✓ Definir Ritos diferentes para Mudanças
- ✓ Definir critérios para qualificação de solicitações
- ✓ Desenhar fluxo detalhado das solicitações.

Próximas Ações

- Levantamento de controles por atividade da T2R.
- Início de documentação e padronização dos controles.
- Desenho de fluxograma detalhado por processos.
- Definir os pontos de interface entre os processos de Gestão de Demandas e de Gestão de Projetos e o processo de Gestão de Mudanças.

Riscos/Problemas/Observações

- Necessidades de alteração na ferramenta eGMUD.

7. Alinhamento







