Workbook

Gerenciamento de Stakeholders



Um caminho prático para a gestão eficaz de stakeholders

Luciano Salamacha

Luciano Salamacha

1

Quando o assunto é gestão de stakeholders conhecimento teórico apenas não basta

É necessário se conectar com quem vive as dores do mundo corporativo

Com quem tem possibilita acesso ao conhecimento de maneira simples e voltada à prática

Luciano Salamacha

Conhece

Formado em Direito, com MBA em Gestão Empresarial, pós-graduação em Gestão Industrial, mestrado em Engenharia de Produção e doutorado em Administração.

Com artigos científicos reconhecidos internacionalmente, é integrante do grupo de pesquisa junto ao CNPQ “Promoção da Inovação Tecnológica nas Organizações”.

Pesquisa

Pesquisador de respeito sobre o mundo corporativo, Luciano consegue traduzir conceitos complexos para uma linguagem simples e prática, baseada em mais de 18 anos atuando como consultor de empresas.

Por isso, é chamado para auxiliar empresas dos mais variados portes a corrigir sua estrutura estratégia.

Vivencia

Integra e preside o Conselho de Administração de várias empresas, participando ativamente na elaboração de estudos influentes nas decisões organizacionais de vários ramos de atuação como varejo, indústria e prestação de serviços;

Como consultor em gestão, atua diretamente na preparação de profissionais de alta gerencia e diretoria, oferecendo orientações individuais aos gestores, mapeando melhorias em processos-chave da organização e ministrando treinamento específicos para essas equipes.

Inova

É um dos fundadores do canal de vídeos corporativos no youtube denominado Bosstech, sucesso na internet pelo seu conteúdo inovador.

Quem é o culpado

2

Quem é o principal *stakeholder* de um projeto?

O que fazer para que a Alta Gestão (Diretoria e Conselho de Administração) valorize e apoie efetivamente o trabalho do gerente de projetos?

Um gerente de projetos efetivamente dá valor ao próprio trabalho ao liderar um projeto na organização?

Qual a responsabilidade de um gerente de projetos em despertar e manter o

Respeito

Quando um gerente de projetos não recebe a devida respeitabilidade em uma organização, somente uma pessoa deve ser responsabilizada: o próprio gerente de projetos.

A natureza humana nos leva a sempre buscar culpados sobre os problemas que enfrentamos no dia-a-dia. Afinal, é muito mais simples e tranquilo identificar o autor de algum problema que refletir e assumir que também somos parte ão apenas do problema, mas também de sua causas.

Como diz um grande filósofo contemporâneo, Hommer Simpson:

"A culpa é toda minha!!!

Logo, eu a jogo em quem eu quiser e na hora que eu quiser... e me livro dela!"



Atitude

A grande questão é: o que um gerente de projetos faz para que não seja devidamente respeitado em uma organização?

Efetivamente, um dos erros é o gerente de projetos acreditar que seu papel é apenas exercer a coordenação dos trabalhos uma vez que o projeto já é desejado na empresa.

Que ele não precisa vender o projeto novamente em vários momentos dentro da empresa.

A questão é que o *sponsor* espera justamente que o gerente de projeto torne sua vida mais tranquila na medida em que não necessita estimular as pessoas a dar apoio.

Note que não se trata do *sponsor* desprestigiar o projeto ou até mesmo ser contra ele, ma sim, unicamente, o fato é que ele deseja que o gerente de projeto aja de maneira autônoma, assumindo a responsabilidade pela coordenação e execução do projeto do começo ao fim.



Vender

Para conseguir vender o projeto é necessário que o gerente de projetos entenda o jogo de interesses envolvido em seu trabalho. Mais, é necessário que ele entenda a distância que existe entre o mundo de quem é responsável pela execução do projeto e daqueles que, ao contrário, não dominam e nem desejam conhecer profundamente a metodologia de GP, mas tão somente desejam o produto ou resultado final.

Para que se compreenda como o processo é muitas vezes entendido pelas pessoas que não são afetas à metodologia de projetos é que utilizo o ciclo da motivação. Esse ciclo é composto por encantamento - rotina - desespero - enterro é mais comum do que se pode imaginar e esta diretamente ligado ao comportamento do gerente de projetos na empresa.

Encantar

O encantamento marca a concepção e o início do projeto, momento em que tudo parece ser fácil e atingível. Otimismo é a palavra-chave. Depois vem a rotina, substituindo a novidade do início. Nesta hora, vários profissionais tendem a perder o envolvimento com o projeto e cabe ao gerente não apenas identificar, mas também agir para que isso gere o menor impacto possível.

Na sequencia, vem a fase em que os resultados começam a não aparecer e/ou acontecem fora do cronograma. É a fase do desespero. Finalmente, chega o momento em que a qualidade e esmero são colocados em segundo plano e o objetivo passa a ser acabar com o projeto de uma vez (enterro).

Desafio

Como um gerente de projetos pode conseguir atenção da diretoria, presidência e Conselho de Administração?

Principalmente, quando você percebe que os participantes da reunião estão se ocupando com outras atividades em vez de prestar atenção em sua explanação sobre o projeto?

Em que idioma falar?

3

Como unir diretores e conselheiros de administração em um único diálogo?

Sua linguagem está correta? Os códigos que você utiliza são efetivamente entendidos pela outra parte?

Como conquistar o respeito dos outros e, principalmente, como aprender a respeitar os outros?

O gerente de projetos é um burocrata e alheio à necessidade de

Diferenças

Em algumas organizações, parece que existe dois mundos completamente diferentes: o mundo do gerente de projetos (foco no método) e o mundo da alta gestão da empresa (foco nos resultados).

Esse é um erro de interpretação relativamente comum hoje em dia e que precisa ser corrigido. Porém, até que isso aconteça, será neste cenário que o gerente de projetos terá que atuar. É nele que deve encontrar mecanismos para desenvolver as atividades que lhe cabem.

Para piorar, por mais que o gerente de projetos se esforce em apresentar dados que estão focados em gerar resultados para a empresa, a alta gestão parece não perceber esse valor.



Idiomas

A saída é recuar e concentra-se em aprender o idioma da outra parte. Isso é um sinal de respeito!

É entender que há um desperdício considerável de energia cada vez que se emite uma mensagem em um idioma que a outra parte não domina.

Ainda que seja extremamente correta, uma linguagem não entendida continua sendo uma mensagem sem significado.

Descubra o que realmente significa RESPEITO e melhore seu desempenho!

Será que você nunca cometeu o erro de esquecer para quem estava falando e começou a usar terminologia específica ou técnica ao tentar demonstrar suas ideias?

Estratégias

É preciso usar a estratégia correta para conseguir a atenção e fazer com que outras questões se tornem menos importantes aos olhos de quem o ouve falar sobre o projeto.

Por exemplo: como você deve agir quando as pessoas literalmente não estão prestando atenção ao que você esta falando ou apresentando?

A resposta é: use a técnica da **dissonância cognitiva**. Ela vai levar as pessoas que estão participando da reunião a querer entender onde e porque estão errando no diagnóstico.

Outra boa saída é estimular o grupo a **tomar decisões erradas**, ou seja, que irão leva-los a uma situação aparentemente correta, mas que na realidade produzirá efeitos catastróficos.



Dúvidas

Busque elementos que despertem dúvida nos participantes, que os deixe intrigados com situações aparentemente sem nexo, para que você tenha a oportunidade de prestar esclarecimentos.

Lembre-se que, às vezes, é mais importante a oportunidade de prestar esclarecimentos e responder dúvidas que querer se antecipar explicando tudo de uma única vez.

A interação constrói relacionamentos, comprometimentos e colabora para o processo cognitivo dos participantes.

Desafio

Um gerente de projetos ficou responsável por implantar um novo software de gestão na empresa mas já gastou duas vezes mais tempo que o previsto e ainda não concluiu o projeto.

Sua conclusão é que os verdadeiros interessados não estão preocupados com o projeto. E fica o questionamento: Por que os reais interessados pelos resultados do projeto não se envolvem e participam do projeto?

O projeto sem importância

4

Qual o comportamento de uma pessoa quando ela não conhece por completo uma situação ou um projeto?

Por que gerentes de projetos se estressam quando os outros não agem como ele espera?

Os projetos são impactados pela dedução que os *stakeholders* tem a respeito do escopo do projeto?

Um gerente de projetos deve ser o responsável por gerar as informações

Esforço

Para um gerente de projetos, é extremamente desmotivador perceber que é praticamente o único que esta se esforçando para que o projeto alcance os resultados programados.

Além de ser uma sensação de solidão e falta de companheirismo dos colega, essa situação ainda gera um paradoxo na mente do gerente de projetos:

Por que as pessoas que mais serão beneficiadas com os resultados do projeto não estão se preocupando e participando? Será que realmente desejam os resultados ou, na verdade, estão contrárias de maneira velada.



Conspiração

É inevitável que passe pela mente do gerente a teoria da conspiração do universo contra ele que diz: “tudo aquilo que ele fizer não receberá apoio”. Para piorar ainda mais a situação, esse gerente de projetos percebe que para outras situações de menor relevância na empresa, muitos se envolvem e participam ativamente.

Novamente, é importante que o gerente de projetos comece a analisar o quanto não é o responsável pelo que esta acontecendo. É importante que o gerente de projetos analise qual o verdadeiro interesse de cada stakeholder envolvido no projeto.

Responsabilidade

Mas um novo erro é comum que se cometa: querer que as pessoas ajam de uma determinada maneira que ele, gerente de projetos, previu e desejava.

Embora o gerente de projetos reconheça que cada pessoa tem direito a ter sua forma de pensar e agir, ele não consegue entender os motivos que levam uma pessoa a não colaborar da maneira adequada para o sucesso de um projeto em que será um dos maiores beneficiados.



Comportamento

Alguns motivos podem auxiliar a compreender o comportamento alheio:

- a pessoa acredita que a responsabilidade por fazer acontecer o projeto é do gerente e que, por consequência, está isento de responsabilidades. Por isso se sente à vontade para negligenciar sua responsabilidade.
- a pessoa não compreende direito as cronologia das ações que o projeto prevê. Para ela, a ordem pode ser alterada sem prejuízo algum ao projeto. Por isso, nem sempre comparecer no momento necessário para realizar uma atividade.
- a pessoa acredita que suas atividades diárias e rotineiras são mais relevantes que a participação no projeto. Ou seja, ela tem certeza que deve ajudar quando puder para que o projeto atinja êxito uma vez que na matriz de responsabilidades de seu cargo não está efetivamente esclarecido que contribuir para o projeto tão importante quanto suas demais tarefas.

Desafio

O que fazer quando um colega da empresa que foi destacado para participar de um projeto se demonstra participante e colaborativo nas reuniões, mas que nunca faz suas entregas e/ou, as entrega de maneira parcial ou insuficiente?

Que parte do cérebro usar?

5

Pode-se reverter a atitude de pessoas que se sentem ameaçadas com o projeto e, por conseqüência, fazem de tudo para que as coisas saiam errado?

Quando uma pessoa é tratada pelo gerente de projetos como um recurso qualquer em vez de ser tratada com profissionalismo, quem é o grande culpado?

A equipe está envolvida por uma mesma causa no projeto ou somente por conta da cobrança?


Como lidar com colegas que boicotam o projeto entregando suas

Reptiliano

Nos últimos anos a neurociência tem avançado em velocidade surpreendente. E toda essa evolução pode auxiliar um gerente de projetos e desempenhar melhor suas funções.


Para começar, vamos entender de maneira sucinta e em linguagem simples a teoria do neurocientista Paul MacLean conhecida como Tese do Cérebro Triuno.

O autor constatou que convivemos em cérebro três diferentes estruturas. Na base central do que chamamos comumente de cérebro há o sistema reptiliano (*old brain*), ligado à medulo espinhal. Por ser a parte mais primitiva de nosso sistema encefálico, pode ser sintetizado como um cérebro que nos indica os instintos de sobrevivência, reprodução e competitividade no “bando” que participamos

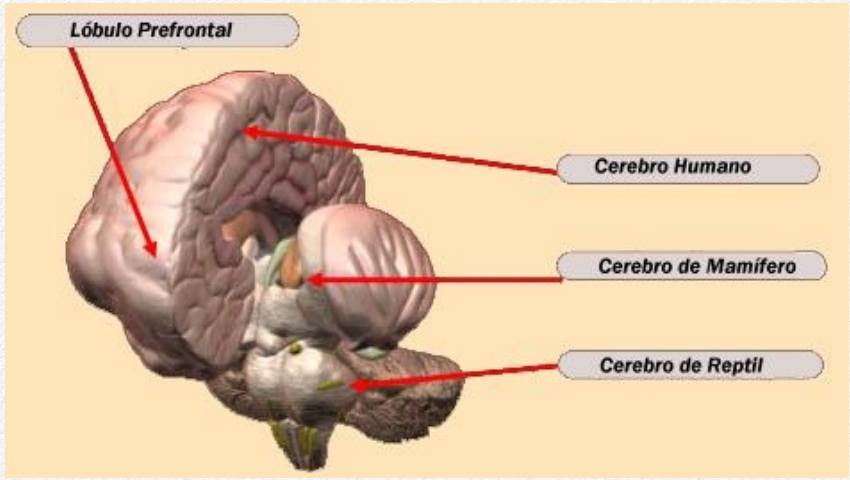

Límbico

Sobre o sistema reptiliano há o sistema límbico, também conhecido como *middle brain*, com um conjunto importantíssimo de funções, mas que aqui sintetizamos em uma única e principal: emoções. É nele que gostamos ou não, confiamos ou não, detestamos 0u não de alguém e, principalmente, nossa autoestima.

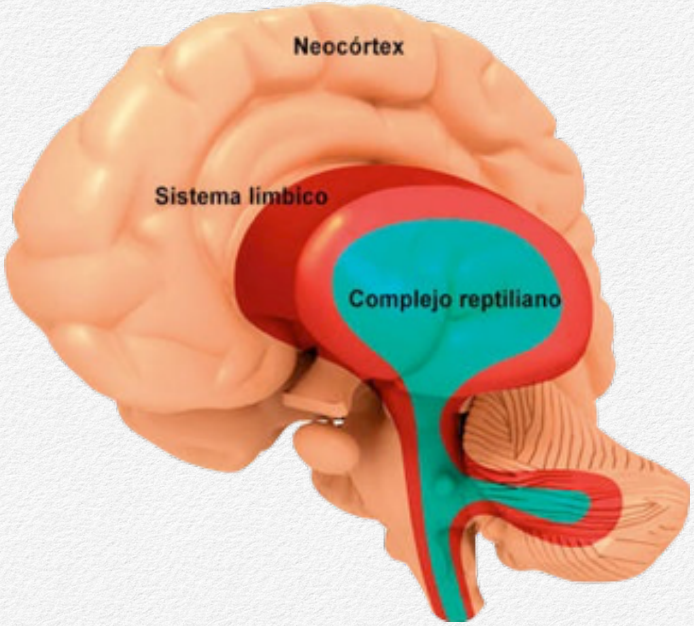

Córtex

Finalmente, sobre o sistema límbico há o neocórtex ou *new brain*, parte do nosso cérebro sintetizada neste momento como sendo a gestora da nossa racionalidade.

Observe que os dois primeiros são totalmente desprovidos de tal racionalidade enquanto ao néocortex cabe esta competência. Embora estejamos simplificando ao máximo esta teoria, sabe-se hoje que nosso sistema encefálico é provido de plasticidade e que os utilizamos de maneira conjunto o tempo todo.

Entretanto, ao conhecer um pouco mais desta teoria já se poder perceber qual a predominância em cada ato praticado pelos stakeholders de um projeto.

Predominância

Um gerente de projetos que consegue identificar a predominância cerebral que determina as atitudes circunstanciais de um stakeholder pode identificar se não esta sendo o real foco causador do problema, seja por despertar no outro uma sensação de ameaça (sistema reptiliano) ou de menosprezo (límbico) ou, até mesmo, de inutilidade do projeto (neocórtex).

Chame-se isso de neuroliderança aplicada à gestão dos stakeholders de um projeto.

Desafio

Você assume dois projetos com equipes diferentes. A primeira é uma situação em que a equipe é excelente mas a alta gestão quer que você melhore ainda mais esse desempenho.

Já a segunda equipe vem apresentado sucessivos problemas de performance e sua missão é colocar o projeto nos eixos.

Como agir em cada um desses projetos?

Ruptivas ou progressivas?

6

Como conduzir equipes diferentes em função do grau de comprometimento e adesão a um projeto?

Estratégias progressivas são recomendadas para equipe que vem apresentando problemas de desempenho?

É coerente que os profissionais que mais colaboram com o projeto sejam sobrecarregados com as tarefas mais complexas?

Um gerente de projetos pode agir com firmeza diante de uma equipe que

Desempenho

Cada equipe tem características próprias que devem ser devidamente respeitadas pelo gerente de projetos para que se obtenha o melhor desempenho.

Entretanto, mesmo diante da diversidade de comportamentos existentes dentro de uma mesma equipe, a situação em que ela se encontra pode ser um poderoso indicador de como o gerente de projetos deve se comportar.



Alternativas

Essa classificação pode ser obtida mediante a análise do histórico de desempenho que a equipe vem apresentando.

a) Equipes de alto desempenho: enquadra-se neste grupo aquela equipe que já vem apresentando excelentes resultados ou que é formada inicialmente por profissionais que são reconhecidos pela competência e comprometimento nas atividades que desempenham.

b) Equipes de baixo de desempenho (problemáticas): é a típica equipe onde há conflitos de interesses entre seus integrantes e/ou onde a gestão anterior não foi suficientemente competente para direcionar todos na busca inteligente dos resultados.

Progressivas

O detalhe relevante é que a alta gestão quer que, tanto a primeira quanto a segunda, apresentem melhores resultados nos projetos que estão conduzindo. E cabe ao gerente de projetos fazer isso acontecer. Mas, como agir?

É para isso que apresento o conceito de estratégias ruptivas e estratégias progressivas. Cada uma delas apresenta seus riscos e seus benefícios. É papel do gerente de projetos conhece-las e saber aplica-las com inteligência.

Estratégias progressivas: aplicáveis notadamente quando se esta diante de equipes de excelente performance onde o gerente de projetos deve tomar muito cuidado ao implantar seu estilo de gestão para não comprometer o bom desempenho existente. As principais características das estratégias progressivas são:

- implantar processos de mudanças ou aperfeiçoamento no *modus operandi* da equipe de maneira gradual ao estilo kaizen (processo de melhoria contínua onde o hoje deve ser melhor que ontem e o amanhã melhor que hoje).
- cuidar para que cada melhoria incrementada seja estabilizada na equipe zelando para que não se de três passos hoje, mas que volte atrás em dois deles amanhã. Cada passo deve ser firme e irreversível.
- observar que algumas mudanças poderão necessitar de mais tempo por parte da equipe para ser absorvidas que o tempo que a alta gestão está disposta a esperar.

Ruptivas

Estratégias ruptivas: ao contrário das progressivas, exige que o gerente de projetos implante um conjunto de medidas emergenciais para que os integrantes da equipe mudem rapidamente de estágio de comportamento. As principais características são:

- implantação rápida e radical de um novo ordenamento sobre o comportamento social da equipe.
- estabelecimento da diferença entre o antes e o depois - conceito da “latinha” - para que fique evidente a descontaminação com o passado.
- o gerente de projetos deve tomar cuidado porque sua credibilidade será colocada em questionamento várias vezes pela equipe e, portanto, deverá tomar muito cuidado com a repercutividade de suas ações dentro da empresa.

Desafio

Em um projeto, duas pessoas destacadas para colaborar apresentam comportamento completamente diferente. A primeira é altamente problemática e foi colocada no projeto pelo seu superior para se livrar dela.

Já a segunda pessoa está comprometida com o projeto mas esta percebendo que a primeira não faz nada porque ela (a segunda) acaba tendo que resolver. O que fazer?

Para quem dar atenção?

7

É possível gerenciar pessoas a partir da compreensão da predominância cerebral de suas atitudes?

Quando temos stakeholders diferentes, qual a tendência do gerente de projeto: acompanhar mais de perto aqueles que cumprem todas as suas responsabilidades ou aqueles que nem sempre cumprem com suas obrigações?

Um gestor de projetos se preocupa efetivamente em analisar qual o tempo dedicado para cada stakeholder?

É coerente que os profissionais que mais colaboram com o projeto

Stakeholders

Os níveis e perfis dos stakeholders são conhecidos pelos gerentes de projetos como o descrito por Finocchio (2013):

- a esfera de controle: composta por aqueles que efetivamente estão subordinados ao gerente de projetos;
- a esfera de influência composta por aqueles que exercem influência mas sobre os quais o gerente de projetos não tem comando;
- pessoas e/ou organizações que não sofrem influência do gerente de projeto mas que com ele poderão ter interações no decorrer do tempo.



Primários

Outro autor relevante na área é Rowley (1997) que classifica-os como primários (ex. clientes e concorrência) e secundários (ex. comunidade e instituições financeiras), além de utilizar critérios como legitimidade e urgência.

Há ainda os estudos de Mitchel (2005) que classifica os stakeholders por um ângulo empresarial da seguinte maneira: adormecido, arbitrário, reivindicador, dominante, perigoso, dependente e definitivo.

Importância

O PMBOK em sua quinta edição criou uma nova área do conhecimento com a Gestão de Stakeholders segmentada em identificar, planejar o gerenciamento, Gerenciar o envolvimento e controlar esse envolvimento.

Com a inclusão desta nova área do conhecimento se confirma a relevância do gerenciamento de stakehol-

ders para o sucesso de um projeto. De outro lado, ainda observa a escassez de metodologia prática que efetivamente permita aos gerentes de projetos condições de obter maiores e melhores resultados como frutos de uma correta gestão.

O que se observa é que os modelos de enquadramento são informativos e estáticos, distantes portanto do dinamismo que marca o dia-a-dia corporativo.



Prática

Por isso, algumas dicas práticas em relação a atenção do gerente de projetos é:

- dedique mais do seu tempo para acompanhar, dar feedback e orientação para aqueles integrantes da equipe que apresentam o melhor desempenho;
- pela identificação da predominância cerebral nas atitudes dos stakeholders, transforme objeções e restrições de algumas pessoas em desafios e metas estimulantes;
- compreenda que pessoas não gostam de ser chamadas de derrotadas ou incompetentes. No máximo, algumas pessoas acabam se acostumando com a alcunha que não são competentes.
- é possível transformar o desânimo de um stakeholder em relação ao projeto e que, cabe ao gerente de projetos, identificar qual o gatilho mental que vai despertar esse comportamento nas pessoas não comprometidas.

Desafio

Você percebe que a alta gestão (diretoria e/ou conselho de administração) não apoia/patrocina os projetos na empresa como deveria porque, no fundo, não conhece o mínimo necessário seja a metodologia de gerenciamento de projeto, sobre a função do gerente de projetos ou do escritório de projetos.

O que fazer para reverter essa situação?

Usando a andragogia

8

Qual o processo pedagógico que o gerente de projetos de utilizar para sensibilizar a alta gestão para que conheça mais sobre gerenciamento de projetos?

Qual a relevância de um gerente de projetos conhecer técnicas de negociação para conduzir um projeto?

O que mais provoca discordância e perda de foco nas reuniões sobre projetos: interesses ou posições?

Como as pessoas se tornam dispostas a aprender sobre algo que

Domínio

É inevitável que, mais cedo ou mais tarde, um gerente de projetos acabe se deparando com superiores que não dominam plenamente todas as técnicas de gerenciamento de projetos. Inclusive essa condição de desconhecimento é assumida publicamente pela alta gestão “ eu não conheço mas contratei quem conhece”.

A grande questão é que esse desconhecimento faz com que a alta gestão também não tenha a devida noção de sua relevância como sponsor no projeto. Por isso, cabe ao gerente de projetos não apenas despertar o interesse de seus superiores para que desejem conhecer mais, como também cabe a responsabilidade de ensinar tudo isso a eles.



Pedagogia

Para isso, é importante entender um pouco a evolução que a pedagogia vem sofrendo nos últimos anos. Antigamente, bom professor era aquele que sabia muito sobre um assunto. Você deve estar lembrando agora de professores que teve e que lhe despertavam admiração por conhecimento que detinham. Entretanto, quanto mais esses professores tentavam explicar o que sabiam, mais confundiam seus alunos.

Depois, houve um novo movimento onde bom professor era aquele que não apenas detinha o conhecimento mas também que sabia ensinar. Isso seria maravilhoso se não houvesse um problema: se o método adotado pelo professor não fosse compatível com o processo de aprendizagem predominante do aluno, o problema de não absorção do conhecimento continuava. O efeito mais comum era que metade de uma turma adorava aquele professor enquanto a outra metade odiava.



Andragogia

Finalmente, a pedagogia evoluiu e hoje o bom professor é aquele profissional que sabe como os outros aprendem. Isso mesmo, ele utiliza técnicas diferentes porque cada pessoa tem um jeito de aprender diferente.

Esse é o desafio do gerente de projetos de hoje: descobrir como os outros aprendem. E é isso que a andragogia propõe, que o aprendizado de adultos aconteça focado na resolução de problemas e não na formulação de conceitos.


Pelo método andragógico, os indivíduos chegam ao aprendizado pelo debate e análise do que realmente precisam saber. Portanto, uma aprendizagem voltada para a aplicação prática na ambiente corporativo, diferente do processo pedagógico onde o que se busca é a apresentação de conceitos e métodos para que a pessoa os conheça e domine.

A grande questão é que poucos gerentes de projetos entendem que seu papel dentro das organizações, notadamente quando o assunto é gerenciamento de stakeholders, é o de um professor que tem por missão envolver as pessoas em torno de um projeto.

Vivência

Pelo processo andragógico uma vivência é proporcionada para que na sequencia ocorra uma análise à luz dos conceitos de uma determinada teoria (gerenciamento de projetos) para que conhecimento seja estabelecido no aprendiz que, por sua vez, passará a aplica-lo dali em diante.

Esse ciclo pode ser sintetizado com a seguinte sequencia

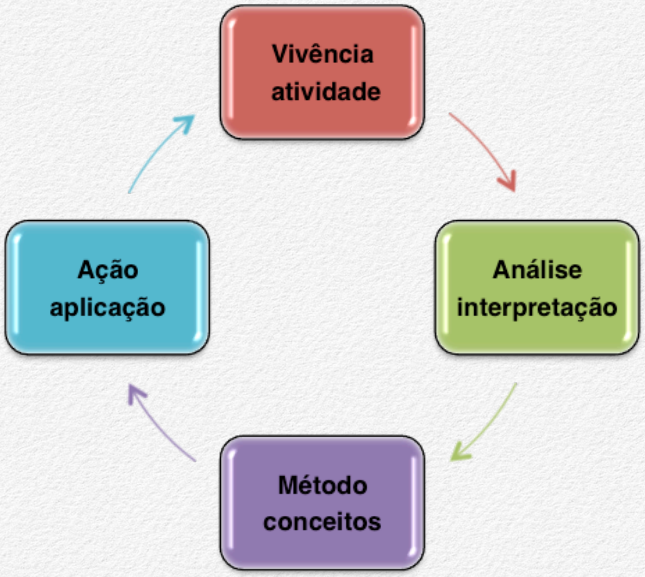
Vivência
atividade
Análise
interpretação
Método
conceitos
Ação
aplicação

Método Ultravision

9

***Intravision*: conhecendo melhor o principal stakeholder de um projeto**

***Intervision*: aprendendo a se relacionar com pessoas dentro de uma equipe**

***Supervision*: assumindo as responsabilidade de direcionar uma equipe ao alcance de resultados**

***Ultravision*: assumindo a gestão de múltiplos projetos de maneira fácil e eficaz**

Revolucionando a gestão de

Resultados

O Método *Ultravision* foi criado especialmente para o desenvolvimento profissional de gestores de stakeholders que desejam efetivamente fazer o melhor em suas carreiras.

Baseado em processos de gatilhos mentais e fundamentado em pesquisas sobre o comportamento humano e neurociência, o *Ultravision* é estruturado de maneira progressiva, focando o desenvolvimento individual do gerente de projetos nos vários estágios de sua carreira.

Você vai conhecer muito mais sobre esse método em momento único e exclusivo:

Hangout dia 24/06/15 às 20:00 - garanta sua inscrição

Enquanto isso, acompanhe as dicas de Luciano Salamacha

da seguinte maneira:

www.facebook.com/lucianosalamacha

https://br.linkedin.com/in/salamacha

www.salamacha.com.br

Acompanhe os vídeos da Bosstech Corporation no youtube
