contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Contact Center

Estabilidade Operacional

17.Dezembro.2015





contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Índice

1. Projetos Estruturantes e Especiais
2. Indicadores
3. Alinhamento – Riscos de TI&T
4. Alinhamento

1. Projetos Estruturantes e Especiais

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT




Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos
Projetos Estruturantes	32%	169 dias	Qua 14/10/15	Seg 06/06/16	
Proj Aspect 7.3 (infra)	31%	89 dias	Qua 14/10/15	Seg 15/02/16	Luiz Washington
Proj Gravacao (NICE)	13%	106 dias	Qua 14/10/15	Qua 09/03/16	Thiago Sousa
Proj Monitoração	57%	95 dias	Qua 14/10/15	Ter 23/02/16	
Proj Monitoração (Dell - Open Manager)	62%	95 dias	Qua 14/10/15	Ter 23/02/16	Julio Cesar
Proj Monitoração (Zabbix)	49%	69 dias	Seg 19/10/15	Qui 21/01/16	Thiago Sousa
Proj Ura Internalização	20%	165 dias	Ter 20/10/15	Seg 06/06/16	Luis Marçal
Proj Redundância links MPLS	12%	65 dias	Ter 01/12/15	Seg 29/02/16	Luis Marçal
Proj Backups Ambiente de Produção	44%	122 dias	Qua 14/10/15	Qui 31/03/16	Rafael Alves
Projetos Especiais	23%	49 dias	Ter 17/11/15	Sex 22/01/16	
Proj Perfeitura do RJ	30%	49 dias	Ter 17/11/15	Sex 22/01/16	Celio, Stuart, Thi
Proj OCS Inventory	11%	31 dias	Sex 04/12/15	Sex 15/01/16	Thiago Sousa




2. Indicadores: Incidentes e Problemas

Volume de Incidentes Alto Impacto

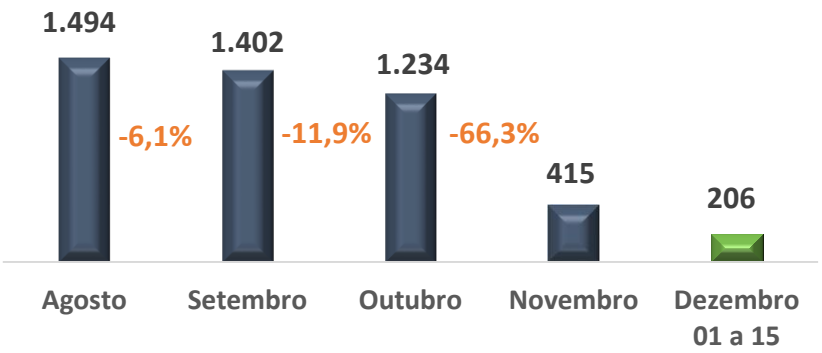


Média diária de Incidentes Alto Impacto

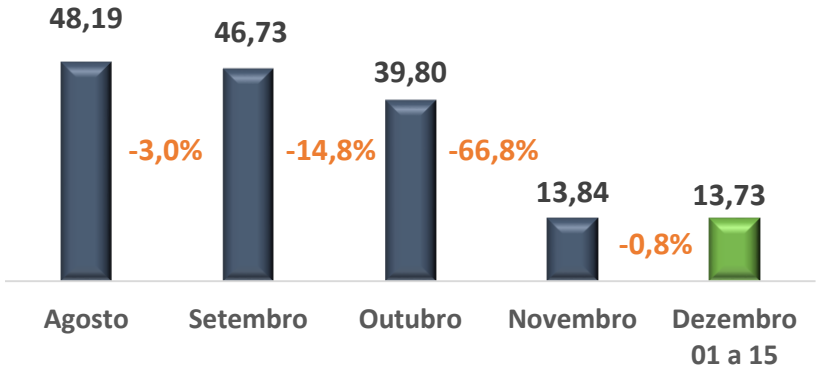

Redução Consolidada Ago / Nov -72,22%

Redução *Projetada* Ago / Dez -71,49%

Gestão de Problemas

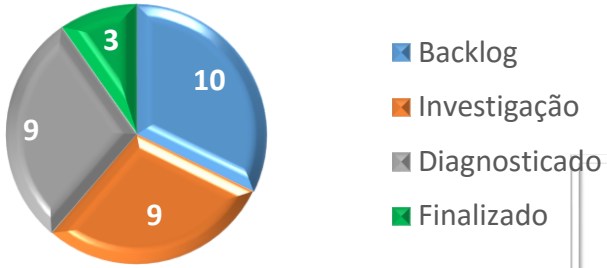

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess!

3. Alinhamento – Risco de TI&T



4. Alinhamento

